



ONISZCZUK e ONISZCZUK LTDA

Av Jose Antunes Fabrício, 1730 – CEP 85140 000 – Candói – PR
CNPJ 05 318 820/0001 40 IE 90269283-51

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida – PR
Ao Sr Prefeito Municipal
FRANK ARIEL SCHIAVINI

PROTOCOLO Nº

36.358/19

Em

08.04.19

h:

16:06

FUNCIONÁRIO

Pedido de Reajuste Financeiro

ONISZCZUK E ONISZCZUK LTDA, com sede na BR Av José Antunes Fabrício, 1730, centro Candói PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.318.820/0001-40, contratada pelo município de Município de Coronel Vivida - PR, para Execução de 26.460m² de PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADA RURAL NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE LINHA TORTELLI, Rod Paulino Stédile Até a Linha Tortelli, conforme contrato nº 067/2018 originário da tomada de preços 01/2018 que neste ato vem representado pelo responsável técnico Eng. AIESO BRUSTOLIM abaixo assinado, vem por meio deste apresentar PEDIDO DE REAJUSTE ANUAL DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, pelas inclusas razões que a seguir expõe, certo de que vossas senhorias levarão em consideração as fundamentadas justificativas a seguir expostas.

Inicialmente, quer a contratada, em autenticas demonstrações de respeito por este Órgão publico e de idoneidade e lisura de comportamento por parte desta contratante, aduzir que o presente pedido refere-se a elevações consideráveis do preço do objeto contratual em decorrência dos reajustes dos insumos, salários e prazos decorridos entre a data da licitação e a data atual. O histórico comercial desta contratada só abona suas atitudes, sempre pautadas nos dispositivos legais vigentes e nos espirito de colaboração e integração que devem embasar todas as relações comerciais.

A licitação TP 01/2018, o contrato numero 067/2018 foi assinado dia 06/04/2018, a ordem de serviço foi recebida dia 09/04/2018 e alvará de Construção 038/2018 de 12 de abril de 2018.

O prazo de execução da obra estão em dia porem paralisados devido ao termo de paralização de obras emitido pelo Município dia 02/05/2018 através da ordem judicial exarada no Agravo de

Materiais de Construção, Serviços, Locação de Equipamentos Obras e Engenharia

www.dalrio.com.br

Engenheiro
Em 12/04/2019
Prefeito



ONISZCZUK e ONISZCZUK LTDA

Av Jose Antunes Fabrício, 1730 – CEP 85140 000 – Candói – PR

CNPJ 05 318 820/0001 40 IE 90269283-51

instrumento n 012996.82-2018.8.16.0000 – tribunal de justiça do Paraná. Que se não tivéssemos parado a obra poderia estar concluída. Nossos fatos de justificativas foram acatados pelo Juiz de Direito que concedeu a Liberação da Obra, como também tal pedido está previsto na Lei Art. 65 Paragrafo II.

Recebemos a notificação Extra Judicial para reinício as atividades no dia 20/03/2019. A empresa já retomou a obra em 08/04/2019, pedimos por meio deste o PEDIDO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, prorrogados por motivos justificados já expostos.

Assenta-se, pois, que o contrato ora em questão está em plena vigência, possibilitando o presente pleito, á luz da legislação vigente.

Através deste documento vimos pleitear o reajuste do contrato, conforme previsto na Lei 8666/93, estabelecido pela planilha de referência de preços DER E SINAPI, utilizada para orçar a obra.

O valor da obra foi orçado com referência em valores tirados de planilhas do Sinapi – dez- 2017 e DER –set-2017, atualizando para referencias de 2019, teremos um reajuste de

R\$ 44.742,10 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos)

Descontando o valor com reajuste recebido na primeira parcela de

R\$ 6.559,65 (seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Saldo a ser reajustado =

R\$ 38.182,45 (trinta e oito mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Portanto, o reajuste total pleiteado nesta data é de R\$ 38.182,45 (trinta e oito mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) é uma condição prevista pela lei de licitações independentemente da previsão ou clausula contratual.

Salientamos que a obra iniciou-se imediatamente após ordem de serviço recebida por nossa empresa, sendo executados os serviços verificado pela primeira medição.

**Materiais de Construção, Serviços, Locação de
Equipamentos Obras e Engenharia**
www.dalrio.com.br



ONISZCZUK e ONISZCZUK LTDA

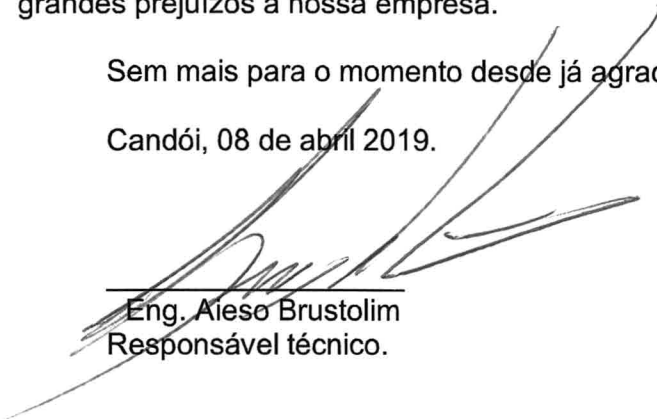
Av Jose Antunes Fabrício, 1730 – CEP 85140 000 – Candói – PR

CNPJ 05 318 820/0001 40 IE 90269283-51

Em face do exposto, demonstrada cabalmente e fundamentada justificativa e que, o principal objetivo deste pedido é evitar maiores prejuízos a nossa empresa e a este órgão vem requerer o reajuste no valor de R\$ 38.182,45 (trinta e oito mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrados acima, com o que demonstrará o conhecimento e cumprimento, dos princípios básicos da administração e fará justiça, sendo que do contrário seremos obrigados a paralisar os serviços uma vez que a continuidade dos mesmos nos preços iniciais implicará grandes prejuízos a nossa empresa.

Sem mais para o momento desde já agradecemos.

Candói, 08 de abril 2019.



Eng. Aleso Brustolim
Responsável técnico.

Sem mais para o momento e certos de contar com vossa habitual colaboração desde já agradecemos.

**Materiais de Construção, Serviços, Locação de
Equipamentos Obras e Engenharia**
www.dalrio.com.br



Iana

De: Iana <iana@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2019 14:22
Para: Douglas; ENGENHARIA; EUCLIDES; FLAVIA (flavia@coronelvivida.pr.gov.br); JAIRO; JEAN TORTELLI; Leandro
Assunto: PEDIDO DE REAJUSTE FINANCEIRO - ONISZCZUK E ONISZCZUK LTDA - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 - CALÇAMENTO LINHA TORTELLI
Anexos: 28. PEDIDO ONISZCZUK - REAJUSTE DE VALORES.pdf

BOA TARDE!!!!

Envio em anexo o pedido de reajuste financeiro feito pela empresa contratada ONISZCZUK E ONISZCZUK, a qual retomou a execução do calçamento da Linha Tortelli.

Favor analisar e emitir parecer quanto ao pedido.

Obrigada.

Att, Iana Schmid
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8304
iana@coronelvivida.pr.gov.br



Destinatário

Douglas

ENGENHARIA

EUCLIDES

FLAVIA (flavia@coronelvivida.pr.gov.br)

JAIRO

JEAN TORTELLI

Leandro

Ler

Lida: 16/04/2019 07:14

Lida: 17/04/2019 11:41

Lida: 16/04/2019 13:39





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 097/2019– DEP

Coronel Vivida, 08 de Agosto de 2019.

De: **MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente: RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO AO CONTRATO 067/2018, de 06 de Abril de 2018 - PROTOCOLO 36.358/2019 – REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADA RURAL NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI;


Vimos através deste informar, que foram analisadas as solicitações da empresa ONISZCZUK E ONISZCZUK LTDA, constantes no requerimento protocolado supracitado sendo que:

- O valor da obra em conferencia as planilha de referência vigentes na data do protocolo, SINAPI janeiro/2019, e DER junho/2018, houve elevação nos preços que compõem o orçamento da obra, conforme segue planilhas demonstrativas em anexo;
- Sendo assim chegamos a seguinte conclusão:
 - Valor da obra no ato da licitação R\$ 966.107,52;
 - Valor da obra pós licitação 963.737,03, desconto de aproximadamente 0,25%;
 - Restos a pagar com desconto proposto na licitação até a data pedido de reequilíbrio R\$ 835.083,19;
 - Restos a pagar com atualização dos valores de acordo com planilhas bases supracitadas, validas na data do protocolo já com desconto proposto na licitação R\$ 871.016,57;
 - Diferença de valores dos restos a pagar atualizados e valor atual conforme licitação $R\$ 871.016,57 - R\$ 835.083,19 = R\$ 35.933,38$;

Salientamos que a verificação da possibilidade de reequilíbrio financeiro deve-se dar através do departamento Jurídico;

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente


Douglas Cristian Strapazon
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo
Divisão de Estudos e Projetos

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20172164976

BDI já incluso no orçamento: 35,47%

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

DATA BASE: DER-SET/2017 SINAPI-DEZ-2017

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Pavimentação Poliédrica

Nº do contrato: 219/2017-* / 0

0% (hora)

0% (mês)

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
1	SERVIÇOS INICIAIS				3.509,44		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,00X2,00M)	M2	8,00	438,68	3.509,44		74209/1 SINAPI
2	MOVIMENTO DE TERRA				81.496,80		
2.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	26.460,00	2,97	78.586,20		500000
2.2	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C MOTONIVELADORA	M	8.820,00	0,33	2.910,60		401140
3	PREPARAÇÃO DE CANCHA				77.772,56		
3.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-5KM)	T	5.953,50	3,73	22.206,56		972000
3.2	COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	2,10	55.566,00		532600
4	PAVIMENTAÇÃO				659.515,50		
4.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO	M2	26.460,00	20,74	548.780,40		521450
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-22KM)	T	7.938,00	13,95	110.735,10		972000
5	MEIO FIO				92.646,60		
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M	8.820,00	9,43	83.172,60		535200
5.3	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-22KM)	T	679,14	13,95	9.474,00		972000
6	REJUNTE				28.784,51		
6.1	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	0,92	24.343,20		532650
6.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-5KM)	T	1.190,70	3,73	4.441,31		972000
7	CONTENÇÃO LATERAL				7.902,72		
7.1	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	4.410,00	1,42	6.262,20		575100
7.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA (15cm cada lateral)	M2	1.764,00	0,93	1.640,52		800350
8	COMPACTAÇÃO				13.230,00		
8.1	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	0,50	13.230,00		532700



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20172164976

BDI já incluso no orçamento: 35,47%

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

DATA BASE: DER-SET/2017 SINAPI-DEZ-2017

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Pavimentação Polidétrica

Nº do contrato: 219/2017-*/ 0

0% (hora)

0% (mês)

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
9	SINALIZAÇÃO				966.107,52		
					1.249,39		
9.1	SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UND	2,00	495,31	990,62		821300
9.2	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	m²	0,60	431,28	258,77		820000
	PLANILHAS UTILIZADAS						
	DER - OUTUBRO/2016						
	SINAPI - MARÇO/2017						

TOTAL R\$ 966.107,52

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018
DATA



[illegible]

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná ou da empresa executora
Carimbo e Assinatura

ATUALIZAÇÃO DE VALORES - OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA TORTELI

BDI 35,47%
 SINAPI jan/19
 DER jun/18

TABELAS DE REFERÊNCIA PARA OBRAS PÚBLICAS

DER		jun/18		TABELAS DE REFERÊNCIA PARA OBRAS PÚBLICAS					QUANTIDADES		SALDO A PAGAR		VALOR UNITARIO		TOTAL ATUALIZADO		
				QTD TOTAL		A DATA DO PROTOCOLO		ATÉ DATA DO PROTOCOLO		ATUALIZADO		DOS RESTOS PAGAR					
	1	SERVIÇOS INICIAIS															
74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,00X2,00M)		M2	8,00	8,00	0,00	478,81	0,00								
	2	MOVIMENTO DE TERRA															
500000	2.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO		M2	26.460,00	26.460,00	0,00	3,21	0,00								
401140	2.2	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C MOTONIVELADORA		M	8.820,00	8.820,00	0,00	0,35	0,00								
	3	PREPARAÇÃO DE CANCHA															
972000	3.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-5KM)		T	5.953,50	288,58	5.664,92	3,93	22.263,14								
532600	3.2	COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO		M2	26.460,00	1.282,58	25.177,42	1,96	49.347,74								
	4	PAVIMENTAÇÃO															
521450	4.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO		M2	26.460,00	1.282,58	25.177,42	21,72	546.853,56								
972000	4.2	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-22KM)		T	7.938,00	384,77	7.553,23	14,85	112.165,47								
	5	MEIO FIO															
535200	5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO		M	8.820,00	557,40	8.262,60	10,00	82.626,00								
972000	5.3	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-22KM)		T	679,14	42,92	636,22	14,85	9.447,87								
	6	REJUNTE															
532650	6.1	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO		M2	26.460,00	1.282,58	25.177,42	0,92	23.163,23								
972000	3.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-5KM)		T	1.190,70	57,72	1.132,98	3,93	4.452,61								
	7	CONTENÇÃO LATERAL															
575100	7.1	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO		M2	4.410,00	278,70	4.131,30	1,54	6.362,20								
800350	7.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO		M2	1.764,00		1.764,00	0,99	1.746,36								
	8	COMPACTAÇÃO															
532700	8.1	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO		M2	26.460,00	1.282,58	25.177,42	0,53	13.344,03								
	9	SINALIZAÇÃO															
821300	9.1	SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M		UND	2,00		2,00	561,96	1.123,92								
820000	9.2	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA		m²	0,60		0,60	438,11	262,87								
TOTAL ATUALIZADO										873.159,00							
DESCONTO NA LICITAÇÃO = 0,00245365029349942																	
TOTAL COM DESCONTO PROPOSTO										871.016,57							

DESCONTO NA LICITAÇÃO = 0,00245365029349942



Nº do contrato: 219/2017- / 0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Programa: Pavimentação Poliédrica

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 2

Data da Medição: 2-mai-18

Período: 30-abr-18 2-mai-18

Data de Início do Empreendimento: 09/04/18

#VALOR!	Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$ 963.737,03		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	43.921,00	R\$ 43.921,00	R\$ -	R\$ 43.921,00	R\$ 128.653,84
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS				3.500,64					1,00	3.500,64				3.500,64
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,00X2,00M)	M2	8,00	437,58	3.500,64				8,00	1,00	3.500,64				3.500,64
2	MOVIMENTO DE TERRA				81.232,20					1,00	81.232,20				81.232,20
2.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	26.460,00	2,96	78.321,60				26.460,00	1,00	78.321,60				78.321,60
2.2	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C MOTONIVELADORA	M	8.820,00	0,33	2.910,80				8.820,00	1,00	2.910,80				2.910,80
3	PREPARAÇÃO DE CANCHA				77.448,42					0,05		3.754,11		3.754,11	3.754,11
3.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	5.953,50	3,72	22.147,02	288,58		288,58	288,58	0,05		1.073,52		1.073,52	1.073,52
3.2	COLCHÃO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	2,09	55.301,40	1.282,58		1.282,58	1.282,58	0,05		2.680,59		2.680,59	2.680,59
4	PAVIMENTAÇÃO				657.954,36					0,05		31.892,58		31.892,58	31.892,58
4.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO	M2	26.460,00	20,69	547.457,40	1.282,58		1.282,58	1.282,58	0,05		26.536,58		26.536,58	26.536,58
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	7.938,00	13,92	110.496,96	384,77		384,77	384,77	0,05		5.356,00		5.356,00	5.356,00
5	MEIO FIO				92.449,83					0,06		5.842,58		5.842,58	5.842,58
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA	M	8.820,00	9,41	82.996,20	557,40		557,40	557,40	0,06		5.245,13		5.245,13	5.245,13
5.3	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	679,14	13,92	9.453,63	42,92		42,92	42,92	0,06		597,45		597,45	597,45
6	REJUNTE				28.772,60					0,05		1.394,69		1.394,69	1.394,69
6.1	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	0,92	24.343,20	1.282,58		1.282,58	1.282,58	0,05		1.179,97		1.179,97	1.179,97
6.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	1.190,70	3,72	4.429,40	57,72		57,72	57,72	0,05		214,72		214,72	214,72
7	CONTENÇÃO LATERAL				7.902,72					0,05		395,75		395,75	395,75
7.1	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	4.410,00	1,42	6.262,20	278,70		278,70	278,70	0,06		395,75		395,75	395,75
7.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA (15cm cada	M2	1.764,00	0,93	1.640,52										
8	COMPACTAÇÃO				13.230,00					0,05		641,29		641,29	641,29
8.1	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	0,50	13.230,00	1.282,58		1.282,58	1.282,58	0,05		641,29		641,29	641,29
9	SINALIZAÇÃO				1.246,26										
9.1	SUPORTE METÁL GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UND	2,00	494,07	988,14										
9.2	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	m²	0,60	430,20	258,12										
	PLANILHAS UTILIZADAS														
	DER - OUTUBRO/2016														
	SINAPI - MARÇO/2017														

Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.



Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e a Assinatura

Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 219/2017-*/0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTE Programa: Pavimentação Poliédrica

Medição Nº: 2

[illegible]

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 2 de maio de 2018

ESTATÍSTICA:
Executado: 37,29% da 3ª etapa.
Prazo decorrido: 23 dias.
Prazo equivalente de obra: 72 dias.
Dias abonados: _____ dias.
Adiantado em: 49 dias.



Nº do contrato: 219/2017-º / 0
Tomador: Município de Coronel Vívda - Paraná
Programa: Pavimentação Polidétrica
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 3
Data da Medição: 29-abr-19
Período: 2-mai-18 29-abr-19
Data de Início do Empreendimento: 09/04/18

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$	963.737,03	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	53.409,59	R\$ 53.409,59	R\$ -	R\$ 53.409,59	R\$ 182.063,42
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR				
1	SERVIÇOS INICIAIS				3.500,64					1,00	3.500,64				3.500,64
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,00X2,00M)	M2	8,00	437,58	3.500,64				8,00	1,00	3.500,64				3.500,64
2	MOVIMENTO DE TERRA				81.232,20					1,00	81.232,20				81.232,20
2.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	26.460,00	2,96	78.321,80				26.460,00	1,00	78.321,80				78.321,80
2.2	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C MOTONIVELADORA	M	8.820,00	0,33	2.910,60				8.820,00	1,00	2.910,60				2.910,60
3	PREPARAÇÃO DE CANCHA				77.448,42					0,11	3.754,10	4.710,78		4.710,78	8.464,88
3.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	5.953,50	3,72	22.147,02	362,12		362,12	650,70	0,11	1.073,51	1.347,09		1.347,09	2.420,60
3.2	COLCHÃO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	2,09	55.301,40	1.609,42		1.609,42	2.892,00	0,11	2.680,59	3.363,69		3.363,69	6.044,28
4	PAVIMENTAÇÃO				657.954,36					0,11	31.892,58	40.019,89		40.019,89	71.912,47
4.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO	M2	26.460,00	20,69	547.457,40	1.609,42		1.609,42	2.892,00	0,11	26.536,58	33.298,90		33.298,90	59.835,48
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	7.938,00	13,92	110.496,96	482,83		482,83	867,60	0,11	5.356,00	6.720,99		6.720,99	12.076,99
5	MEIO FIO				92.449,83					0,13	5.842,58	6.016,60		6.016,60	11.859,18
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA	M	8.820,00	9,41	82.996,20	574,00		574,00	1.131,40	0,13	5.245,13	5.401,34		5.401,34	10.646,47
5.3	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	679,14	13,92	9.453,63	44,20		44,20	87,12	0,13	597,45	615,26		615,26	1.212,71
6	REJUNTE				28.772,60					0,11	1.394,69	1.750,07		1.750,07	3.144,76
6.1	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	0,92	24.343,20	1.609,42		1.609,42	2.892,00	0,11	1.179,97	1.480,67		1.480,67	2.660,64
6.1	TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO)	T	1.190,70	3,72	4.429,40	72,42		72,42	130,14	0,11	214,72	269,40		269,40	484,12
7	CONTENÇÃO LATERAL				7.902,72					0,10	395,75	407,54		407,54	803,29
7.1	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	4.410,00	1,42	6.262,20	287,00		287,00	565,70	0,13	395,75	407,54		407,54	803,29
7.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA (15cm cada	M2	1.764,00	0,93	1.640,52										
8	COMPACTAÇÃO				13.230,00					0,09	641,29	504,71		504,71	1.146,00
8.1	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	26.460,00	0,50	13.230,00	1.009,42		1.009,42	2.292,00	0,09	641,29	504,71		504,71	1.146,00
9	SINALIZAÇÃO				1.246,26										
9.1	SUPORTE METAL GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UND	2,00	494,07	988,14										
9.2	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	m²	0,60	430,20	258,12										
	PLANILHAS UTILIZADAS														
	DER - OUTUBRO/2016 SINAPI - MARÇO/2017														

Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vívda - Paraná
Carimbo e a Assinatura

Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura



RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 219/2017-*/0

Tomador: Município de Coronel Vívda - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTE Programa: Pavimentação Poliédrca

Medição Nº: 3

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FÍSICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO	EVOL.ACUM. (%)		EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
								PREV.	EXEC.	
1	SERVIÇOS INICIAIS	963.737,03	963.737,03				3.500,64	100,00	100,00	CONCLUÍDO
2	MOVIMENTO DE TERRA	81.232,20	81.232,20				81.232,20	66,00	100,00	CONCLUÍDO
3	PREPARAÇÃO DE CANCHA	77.448,42	8.464,88				8.464,88	66,00	10,93	ATRASADO
4	PAVIMENTAÇÃO	657.954,36	71.912,47				71.912,47	66,00	10,93	ATRASADO
5	MEIO FIO	92.449,83	11.859,18				11.859,18	66,00	12,83	ATRASADO
6	REJUNTE	28.772,60	3.144,76				3.144,76	66,00	10,93	ATRASADO
7	CONTENÇÃO LATERAL	7.902,72	803,29				803,29	66,00	10,16	ATRASADO
8	COMPACTAÇÃO	13.230,00	1.146,00				1.146,00	66,00	8,66	ATRASADO
9	SINALIZAÇÃO	1.246,26								
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)			182.063,42				182.063,42	66,04	18,89	ATRASADO
TOTAIS NO PERÍODO (R\$)			53.409,59				53.409,59		5,54	
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)			128.653,83				128.653,83	5,47	13,35	

Responsável Técnico de(o) Município de Coronel Vívda - Paraná
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 29 de abril de 2019
Data

ESTATÍSTICA:

Executado: 38,52% da 4ª etapa.
Prazo decorrido: 385 dias.
Prazo equivalente de obra: 103 dias.
Dias abonados: dias.
ATRASADO EM: -282 dias.





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER JURÍDICO

De: Pricila Gregolin Gugik

Para: Frank Ariel Schiavini Prefeito Municipal

**Análise do Requerimento da Empresa Oniszczyk e Oniszczyk Ltda.
Tomada de Preços nº 01/2018 - Protocolo nº 36.358/2019, de 08/04/2019**

Mediante solicitação verbal do Setor de Licitações, esta procuradora passa a emitir parecer jurídico nos autos da Tomada de Preços nº 01/2018 onde a empresa Oniszczyk e Oniszczyk Ltda. -EPP por meio de requerimento não autuado e juntado aos autos o procedimento licitatório, pleiteia o reajuste financeiro ante ter havido a paralisação das obras em decorrência de ordem judicial.

Em que pese o requerimento datar de abril do corrente ano, destaca-se que o mesmo apenas chegou ao jurídico em 13/08/2019.

Ocorre que a cláusula quarta do Contrato nº 67/2018 veda o reajuste (que é utilizado para recompor a desvalorização da moeda, o qual pode ser pautado em dois critérios: aplicação de índices previamente estabelecidos ou pela análise da variação dos custos na planilha de preços - porém só pode ser concedido após 1 (um) ano a contar da data da proposta).

Ademais, observa-se que o contrato em questão foi assinado em 06 de abril de 2018 (fls. 496/505), tendo sido dada a ordem de serviços em 09 de abril de 2018 (fl. 506), tendo paralisada a obra em 02 de maio de 2018 (fl. 534) e retomada em 21 de março de 2019 (fls. 547), tendo a contratada se mantido inerte acerca de qualquer pretensão de reajuste de valores.


Veja-se que a Divisão de Estudos e Projetos pelo Ofício nº 097/2019-DEP analisou o pleito da empresa.

Diante do exposto, esta procuradora opina que, por expressa vedação contratual, bem como pelo fato de que a empresa contratada se manteve silente quando do aditamento no contrato, não cabe o reajuste pretendido.

Ainda, orienta-se a autuação e numeração imediata do requerimento, Ofício nº 097/2019-DEP e do parecer ora emitido aos autos.

É o parecer.

Coronel Vivida, 28 de agosto de 2019.


Pricila G. Gugik
OAB/Pr nº 51.356
