



Protocolo 2.063/2024

De: F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

Para: GP-CG - Chefia de Gabinete

Data: 24/07/2024 às 14:13:25

Setores (CC):

SA-SRAP

Setores envolvidos:

SA-DLC, SA-SRAP, SF, SOVU, GP, GP-PJ, GP-CG, CompEngenharia

Requerimento

Entrada*:

Site

Boa tarde

Solicitação de pagamento referente ao contrato 126/2022

Anexos:

Solicitacao_Pagamento_1_.pdf



Pato Branco, 24 de junho de 2024

A
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CONTRATO nº 126/2022

A Empresa F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ: 05.461.328/0001-29,
vem pelo presente requerer pagamentos em atraso do contrato 126/2022.

Certo de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido.

Atenciosamente,

FERNANDO
ZANCANARO:00683940980

Assinado eletronicamente por FERNANDO ZANCANARO 00683940980
RG: 24787814200115. CN=AC Simguard Munique, OU=FERNANDO
ZANCANARO, O=00683940980
FERNANDO:00683940980
Data: 2024.07.24 11:32:29-0300
Fonte PDF: Inspecionador Versão: 2023.2.0

F Zancanaro Terraplenagem Ltda.

Protocolo 1- 2.063/2024

De: Elton Z. - GP-CG

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 24/07/2024 às 15:45:21



Segue para análise.

—
Elton Luiz Zapchau
Chefe de Gabinete

Protocolo 2- 2.063/2024



De: PAULO C. - SF

Para: CompEngenharia - Compras Engenharia - A/C Douglas S.

Data: 24/07/2024 às 15:50:38

para verificação da pendencia

—
Paulo Ricardo de Souza Centenaro
SECRETÁRIO DE FAZENDA



De: Jean M. - CompEngenharia

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 05/08/2024 às 16:42:44

Olá prezado, boa tarde

Conforme solicitado pela empresa, enviamos o requerimento de pagamento dos valores pendentes do contrato.

O valor total devido é de: R\$ 802.704,53.

Para a finalização do contrato é necessário aprovar:

supressão de R\$ 176.263,56

aumento de metafísica de: R\$17.138,50

O valor final da obra passa a ser de: R\$ 2.300.184,44 , conforme reprogramação do orçamento em anexo.

Anexo seguem:

-Ofício de solicitação de pagamento da Divisão de Estudos e Projetos

-Relatório fotográfico

-Diário de obras

-Orçamento reprogramado

-E-mail do paranacidade solicitando a formalização do termo de reconhecimento de dívida

-Solicitação da medição no portal dos município

Atenciosamente,

Jean Felipe Miecowski
Divisão de Estudos e Projetos

Anexos:

1_DIARIO_DE_OBRA.pdf

2_DIARIO_DE_OBRA.pdf

3_DIARIO_CONTRATO_126_MES_06_08_2023_ASSINADO.pdf

4_DIARIO_CONTRATO_126_MES_09_2023.pdf

5_DIARIO_CONTRATO_126_MES_10_2023.pdf

6_DIARIO_CONTRATO_126_MES_11_2023.pdf

Medicao_Portal_dos_Municipios.pdf

_OFICIO.pdf

_ORCAMENTO_REPROGRAMADO_ASS.pdf

_RELATORIO_FOTOGRAFICO_2_.pdf



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 01/10/2022 | Pág. 1 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 1 | Prazo Restante: | 179 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 0 | | |
| | Operador | 0 | | |
| | Servente | 0 | | |

| | | | |
|----------|--------------|--|--|
| Serviços | Planejamento | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 02/10/2022 | Pág. | 2 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 2 | Prazo Restante: | 178 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 0 | | |
| | Operador | 0 | | |
| | Servente | 0 | | |
| Serviços | Planejamento | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|


| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 03/10/2022 | Pág. | 3 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 3 | Prazo Restante: | 177 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | Execução de reperfilagem e correção de desníveis do pavimento na Rua Brigadeiro Rocha Loures | | | |
| | Execução da capa na Rua das Américas | | | |

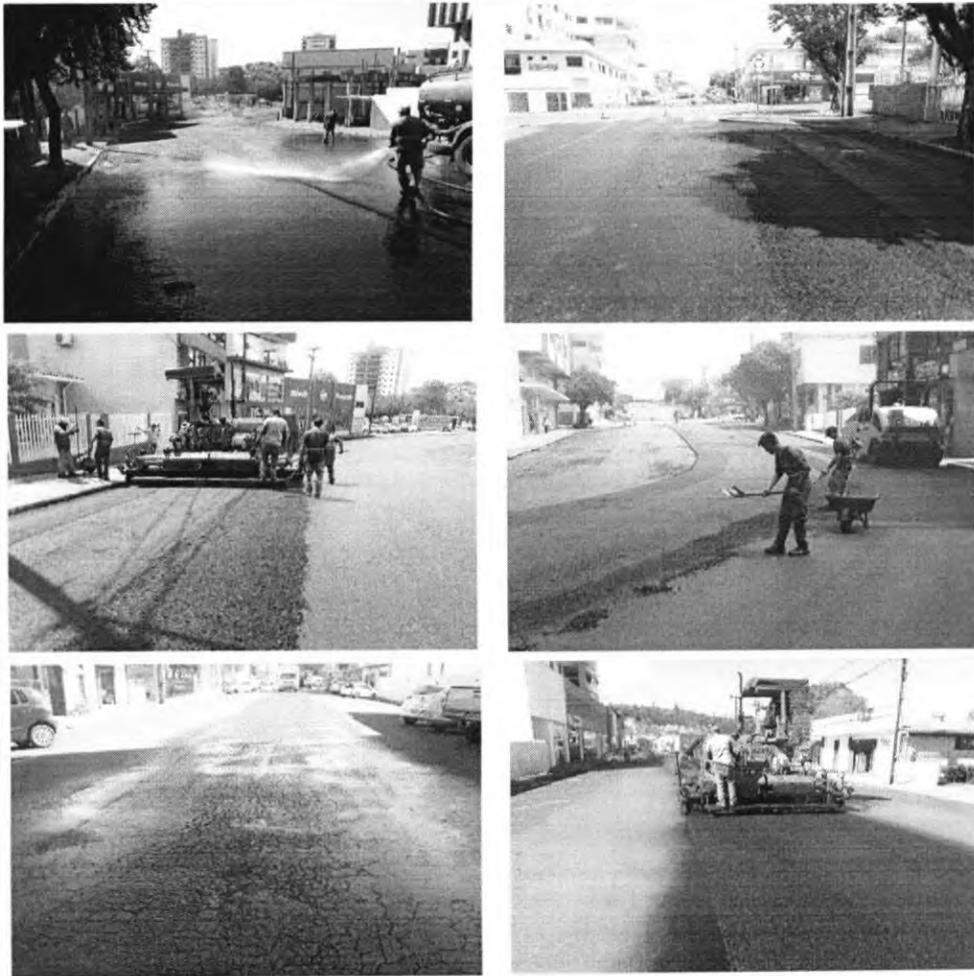

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 04/10/2022 | Pág. | 4 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 4 | Prazo Restante: | 176 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Lavagem e limpeza superficial da Rua Brigadeiro Rocha Loures; | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2022.11.23 10:43:38 -03'00' | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 05/10/2022 | Pág. 5 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 5 | Prazo Restante: | 175 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Lavagem e limpeza superficial da Rua Brigadeiro Rocha Loures; | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2022.11.23 10:44:10 -03'00' | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 31/10/2022 | Pág. | 31 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 31 | Prazo Restante: | 149 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 5 | | | |
| Servente | 7 | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Lavagem e limpeza superficial da Rua Candido Inacio de Lima | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2022.11.21 10:43:39 -03'00' | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 03/11/2022 | Pág. | 34 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 34 | Prazo Restante: | 146 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 5 | | | |
| Servente | 7 | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Pavimentação em CBUQ Rua Candido Inacio de Lima | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2022.11.21 10:43:17 -03'00' | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 04/11/2022 | Pág. | 35 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 35 | Prazo Restante: | 145 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 5 | | | |
| Servente | 7 | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Pavimentação em CBUQ Rua Candido Inacio de Lima | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:163830299915 <small>Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:163830299915 Data: 2022.11.21 10:42:54 -03'00'</small> | Data |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 07/11/2022 | Pág. 38 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 38 | Prazo Restante: | 142 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|-------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| Serviços | Sinalização | 7 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | <small>Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2022.11.23 10:42:32 -03'00'</small> | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 08/11/2022 | Pág. 39 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 39 | Prazo Restante: | 141 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 5 | | | |
| Servente | 7 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|--|--|
| Serviços | Sinalização | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | <small>Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2022.11.23 10:42:08 -03'00'</small> | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 03/10/2022 | Pág. | 3 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 3 | Prazo Restante: | 177 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | Execução de reperfilagem e correção de desníveis do pavimento na Rua Brigadeiro Rocha Loures | | | |
| | Execução da capa na Rua das Américas | | | |

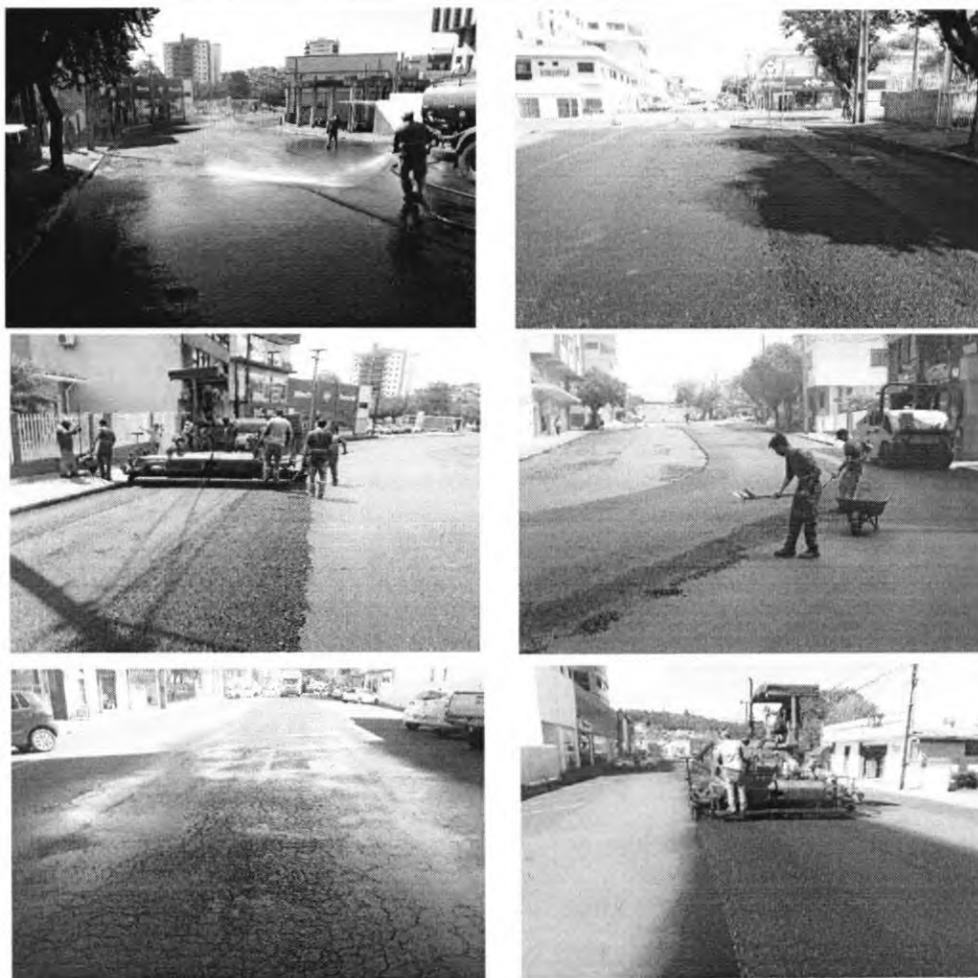

| | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:638302 99915 Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2023.03.30 16:22:11-0300 | Data |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 04/10/2022 | Pág. | 4 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 4 | Prazo Restante: | 176 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Serviços | Lavagem e limpeza superficial da Rua Brigadeiro Rocha Loures; | | |
| | | | |



| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:63830299 915 | Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2023.03.30 16:22:32-03007 | Data |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 05/10/2022 | Pág. | 5 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 5 | Prazo Restante: | 175 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | | 1 | |
| Encarregado | | 1 | | |
| Operador | | 5 | | |
| Servente | | 7 | | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Lavagem e limpeza superficial da Rua Brigadeiro Rocha Loures; | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIEGOANSKI 08136345868 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 63830299 915 Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 Data: 2023.03.30 18:22:54-03'00" | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 31/10/2022 | Pág. | 31 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 31 | Prazo Restante: | 149 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Lavagem e limpeza superficial da Rua Candido Inacio de Lima | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08196345988 - Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 - Coronel Vivida - PR | Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 Data: 2023.03.30 16:23:15-0300 | Data |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 03/11/2022 | Pág. | 34 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 34 | Prazo Restante: | 146 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 5 | | | |
| Servente | 7 | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Pavimentação em CBUQ Rua Candido Inacio de Lima | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 915 | Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 Data: 2023.03.30 16:23:36-0300 | Data |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 04/11/2022 | Pág. | 35 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 35 | Prazo Restante: | 145 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Pavimentação em CBUQ Rua Candido Inacio de Lima | | | |
| | | | | |



| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345989 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 638302 99915 | Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI: 63830299815 Data: 2023.03.30 16:23:55-0300 | Data |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 05/11/2022 | Pág. | 36 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 36 | Prazo Restante: | 144 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam.: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Execução de reforço, pintura e selo com pó sobre remendos. | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Visto Fiscalização:

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08126345988
Coronel Vivida - PR

Visto Contratada:

RODRIGO
SILIPRANDI:638302999
15
Assinado digitalmente por
RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915
Data: 2023.03.30 16:24:16-0300

Data

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 21/11/2022 | Pág. 52 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 52 | Prazo Restante: | 128 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|--|--|
| Serviços | Limpeza e corte de árvores na Rua Desembargador Motta | | |
| | | | |



| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR</small> | Visto Contratada: | <small>RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 99915</small> | <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 Data: 2023.03.30 16:24:38-03'00"</small> | Data |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 22/11/2022 | Pág. | 53 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 53 | Prazo Restante: | 127 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Serviços | Limpeza e corte de árvores nas Ruas Marta Berger e Honorato Nepomuceno | | |
| | | | |
| | | | |




| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345688 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:638302 99915 | Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2023.03.30 16:24:58 -03'00' | Data |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 30/11/2022 | Pág. | 61 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 30/11/2022 | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 61 | Prazo Restante: | 119 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | Capa em CBUQ Rua Marta Berger e Honorato Nepomuceno | | | |
| | | | | |
| | | | | |

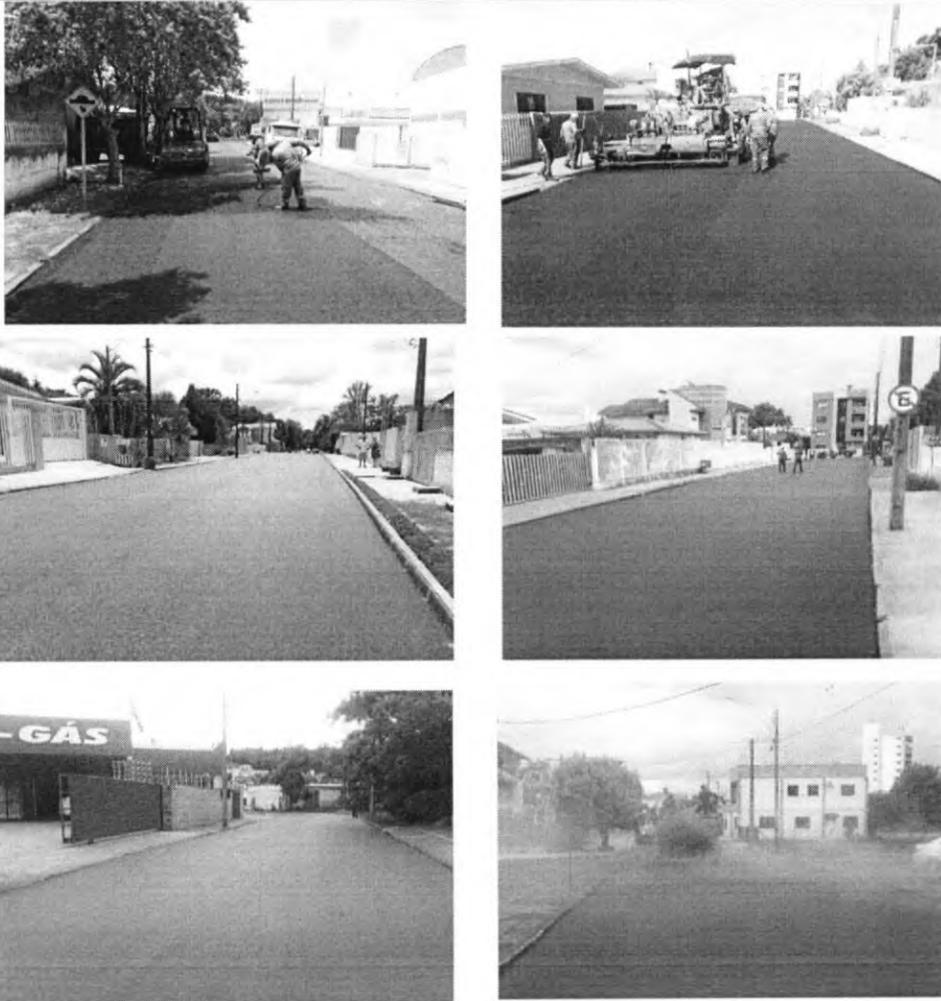


| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MEGANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:63830299 915 | Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2023.10.30 16:25:20-03:00' | Data |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 05/12/2022 | Pág. | 66 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 66 | Prazo Restante: | 114 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | Execução de faixas elevadas | | | |
| | | | | |
| | | | | |

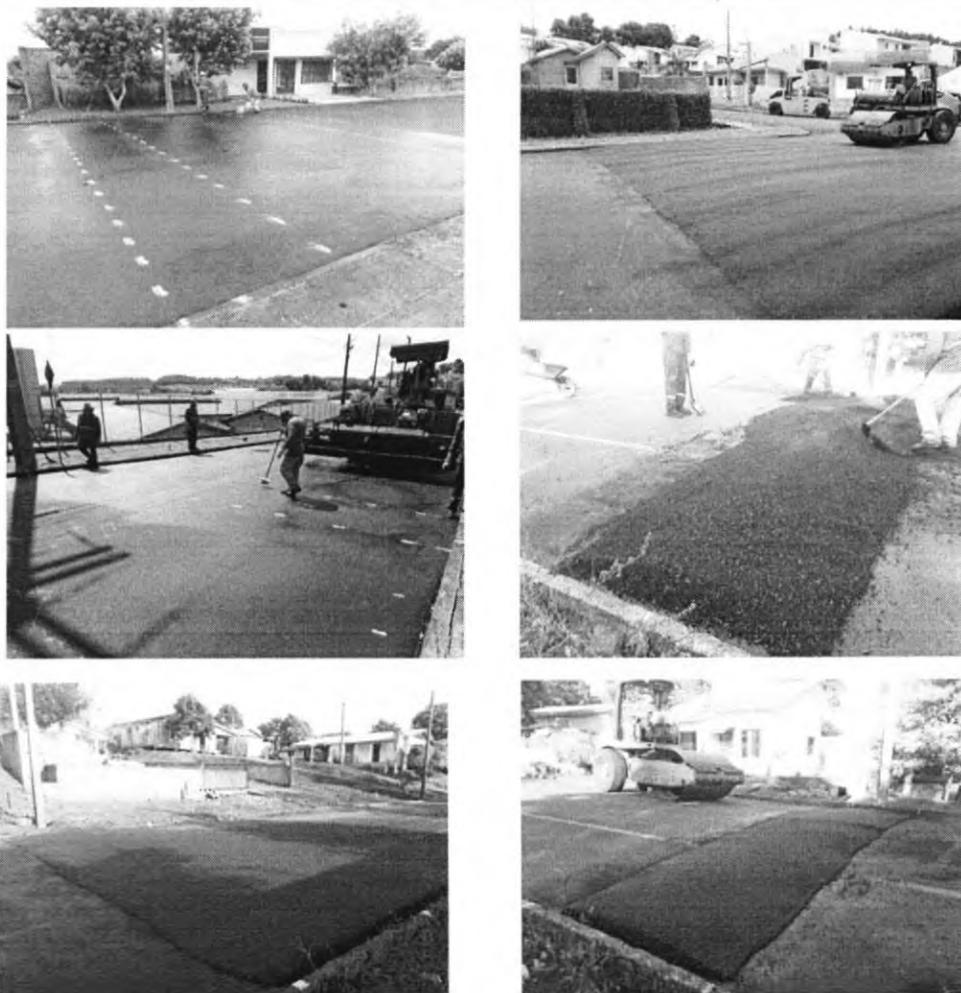

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MECQANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 Data: 2023.03.30 15:25:42 -03'00' | Data |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 06/12/2022 | Pág. | 67 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 06/12/2022 | terça-feira | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 67 | Prazo Restante: | 113 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------|--|--|--|
| Serviços | Execução de faixas elevadas | | | |
| | | | | |



| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345868 Coronel Vivida - PR</small> | Visto Contratada: | <small>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</small> | <small>Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Data: 2023.03.30 11:48:58 -03'00'</small> | Data |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 29/06/2023 | Pág. | 272 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 272 | Prazo Restante: | 82 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |



| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|


Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 10/07/2023 | Pág. | 283 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 283 | Prazo Restante: | 71 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | | | | |
| | | | | |

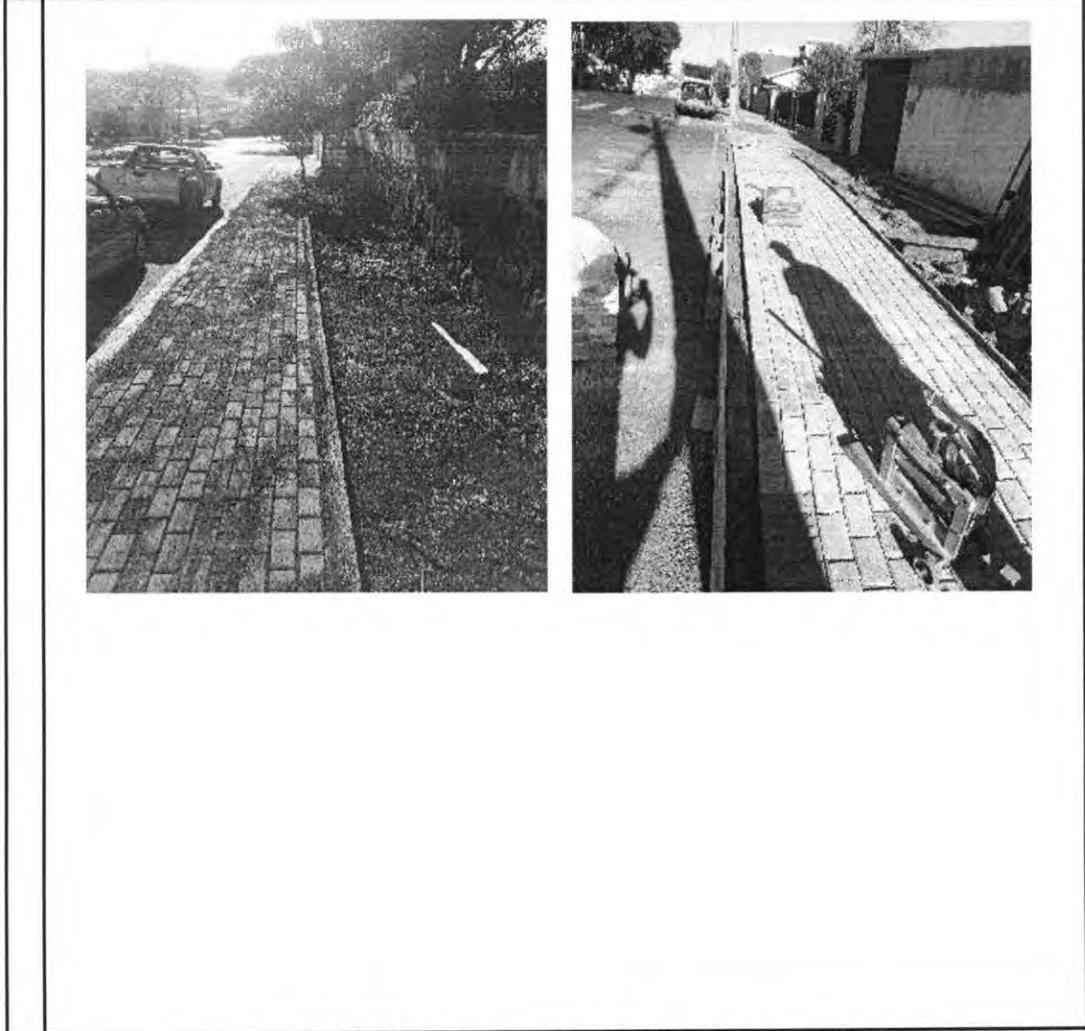

Visto Fiscalização: JEAN FELIPE MIECOANSKI 0819345588 Coronel Vivida - PR

Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915


Data

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 21/07/2023 | Pág. | 294 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 294 | Prazo Restante: | 60 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |

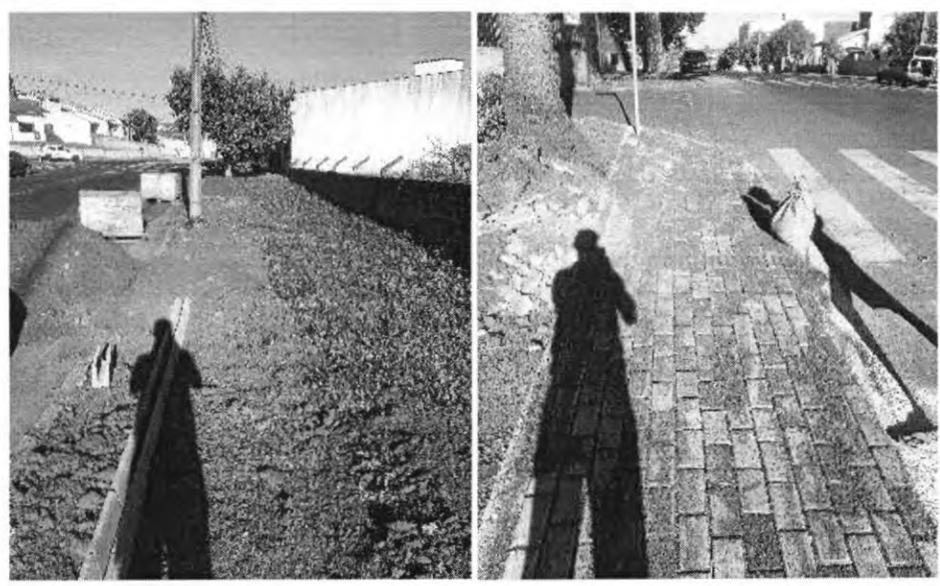

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 6383029 9915 | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 31/07/2023 | Pág. | 304 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 304 | Prazo Restante: | 50 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|--|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 6383029 9915 | Data | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|--|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 04/08/2023 | Pág. | 308 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 308 | Prazo Restante: | 46 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |



| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 07/08/2023 | Pág. | 311 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 311 | Prazo Restante: | 43 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |




| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 09/08/2023 | Pág. | 313 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 313 | Prazo Restante: | 41 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | | | X |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | | | | |

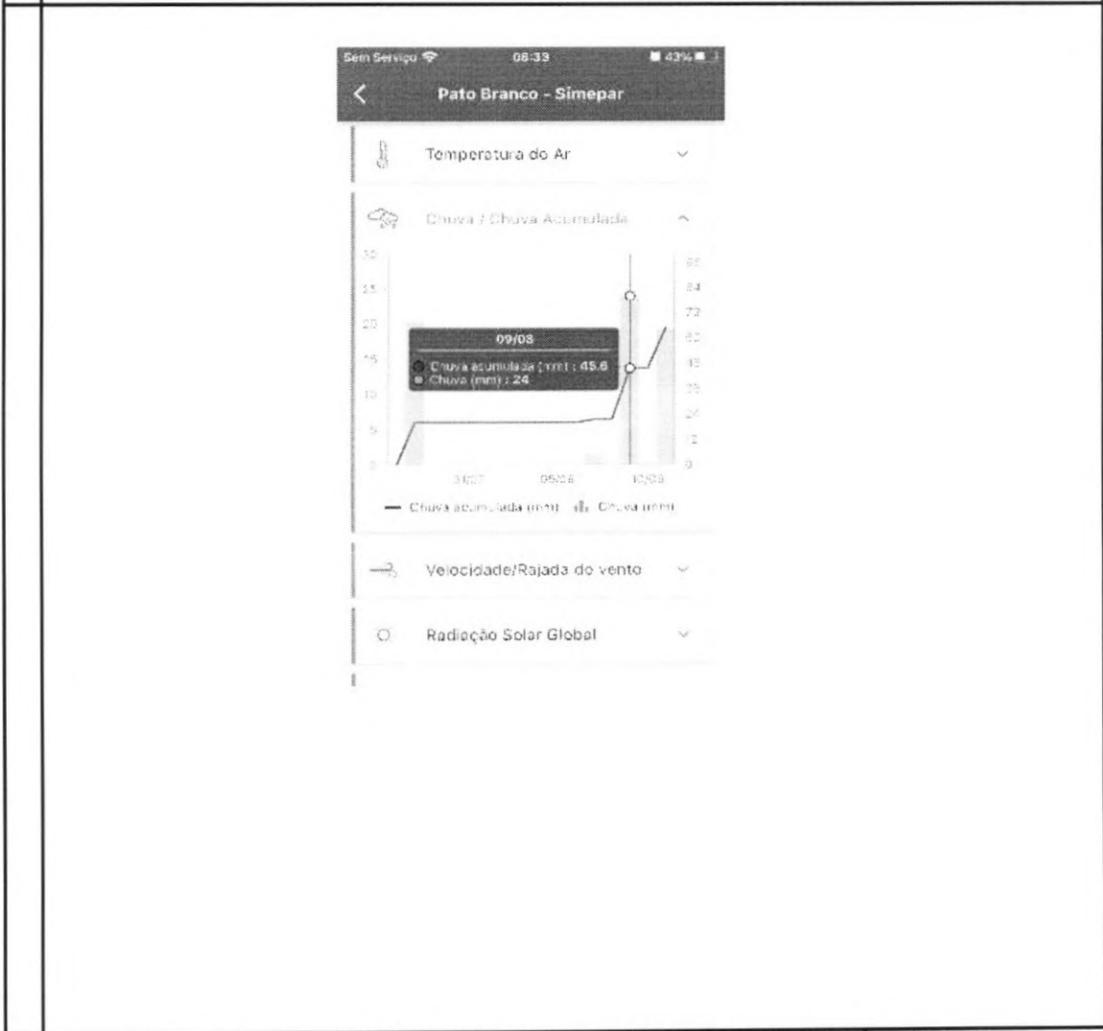

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIEGOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI.6383029 9915 | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|




Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 11/08/2023 | Pág. | 315 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 315 | Prazo Restante: | 39 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | | | X |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | | | | |

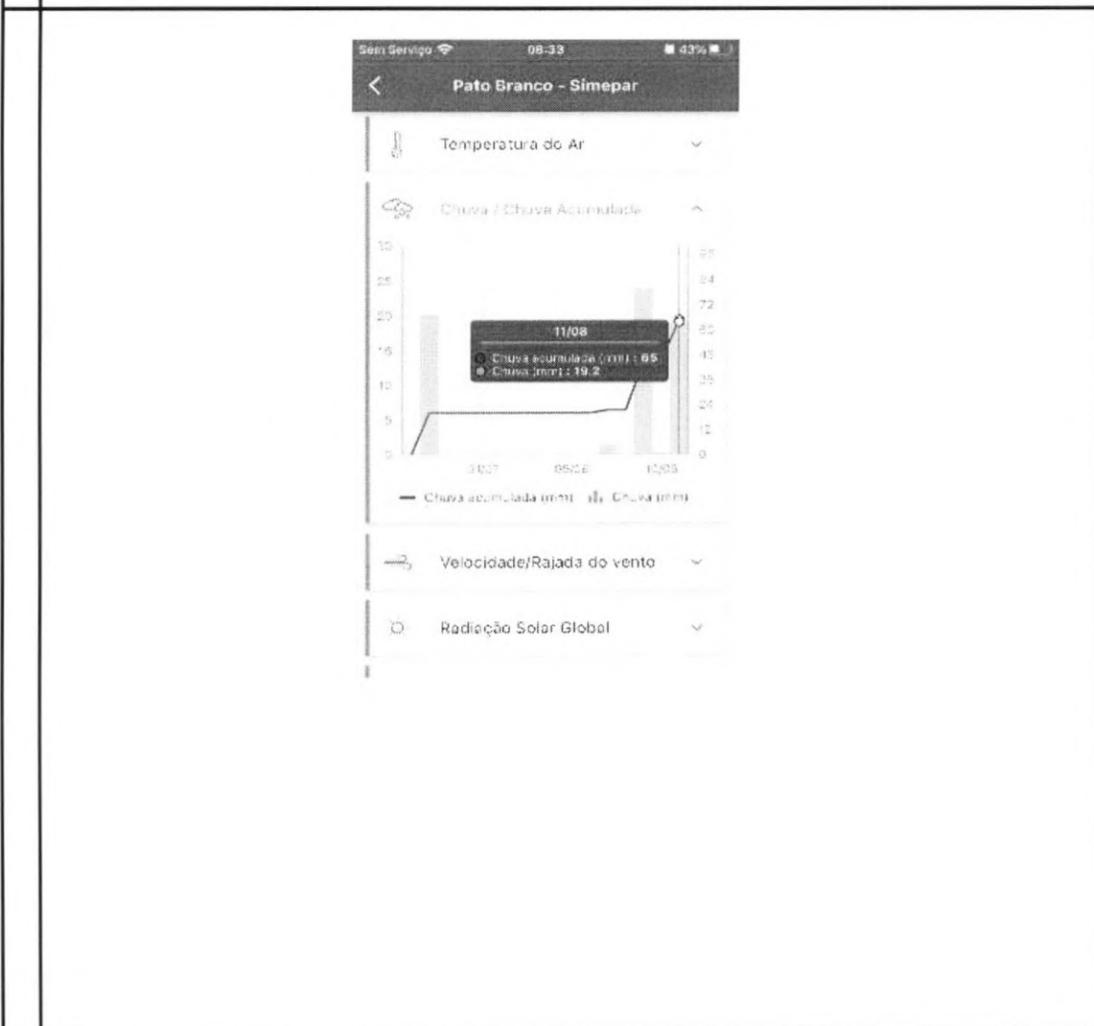

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 12/08/2023 | Pág. | 316 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 316 | Prazo Restante: | 38 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 354 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |

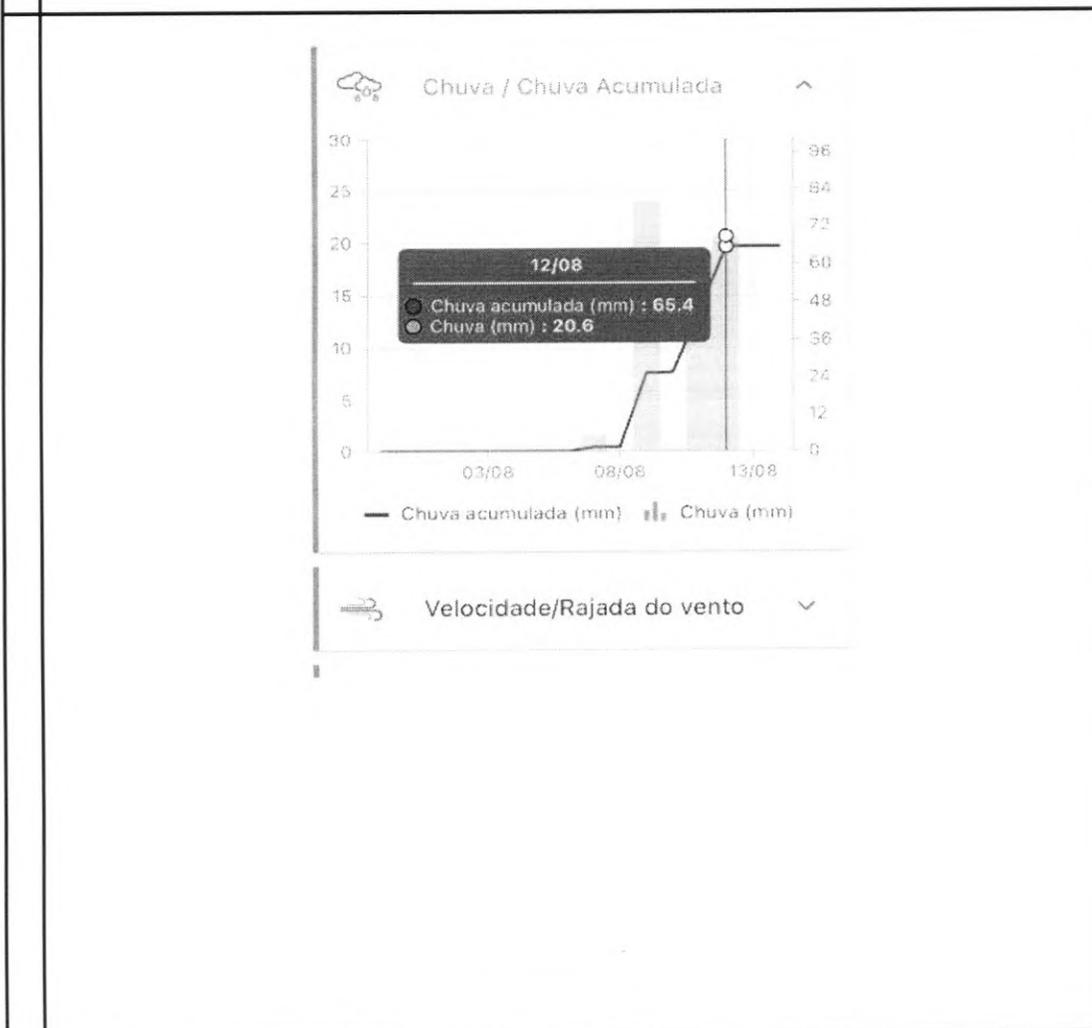

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 16/08/2023 | Pág. | 320 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 320 | Prazo Restante: | 34 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | REMOÇÃO PAVIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE - RUA 15 DE NOVEMBRO | | | |



| | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------------------|------|
| Visito Fiscalização: | | Visito Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Data |
|----------------------|--|---------------------------------------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 17/08/2023 | Pág. | 321 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 321 | Prazo Restante: | 33 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | REMOÇÃO PAVIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE - RUA 15 DE NOVENBRO | | | |
| | EXECUÇÃO MEIO-FIO - RUA 15 DE NOVENBRO | | | |



| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 18/08/2023 | Pág. | 322 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | | X | |
| Prazo Decorrido: | 322 | Prazo Restante: | 32 | Tarde | | X | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | | X | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | EXECUÇÃO DE BASE - RUA 15 DE NOVEMBRO | | | |
| | EXECUÇÃO MEIO-FIO - RUA 15 DE NOVEMBRO | | | |



| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 19/08/2023 | Pág. | 323 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 323 | Prazo Restante: | 31 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

Serviços
 LIMPEZA DOS PASSEIOS
 EXECUÇÃO CALÇADAS
 EXECUÇÃO DE BASE - RUA 15 DE NOVEMBRO
 EXECUÇÃO MEIO-FIO - RUA 15 DE NOVEMBRO
 LAVAGEM E LIMPEZA SUPERFICIAL - RUA 15 DE NOVEMBRO



| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345968 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 21/08/2023 | Pág. | 325 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 325 | Prazo Restante: | 29 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam.: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | |
|----------|----------------------|--|--|
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Visto Fiscalização: |  <small>RODRIGO SILIPRANDI - 6383029/9915</small> | Visto Contratada: |  <small>F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA - 08.088.000/0001-08</small> | Data | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 24/08/2023 | Pág. | 328 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 328 | Prazo Restante: | 26 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 354 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

Serviços
 LIMPEZA DOS PASSEIOS
 EXECUÇÃO CALÇADAS



Visto Fiscalização: JEAN FELIPE MIECOANSKI, 08136345988, Coronel Vivida - PR
 Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI: 6383029915
 Data

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 31/08/2023 | Pág. | 335 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 335 | Prazo Restante: | 79 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |




| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345968 Coronel Vivida - PR</small> | Visto Contratada: | <small>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</small> | Data |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 06/09/2023 | Pág. | 341 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 341 | Prazo Restante: | 73 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |

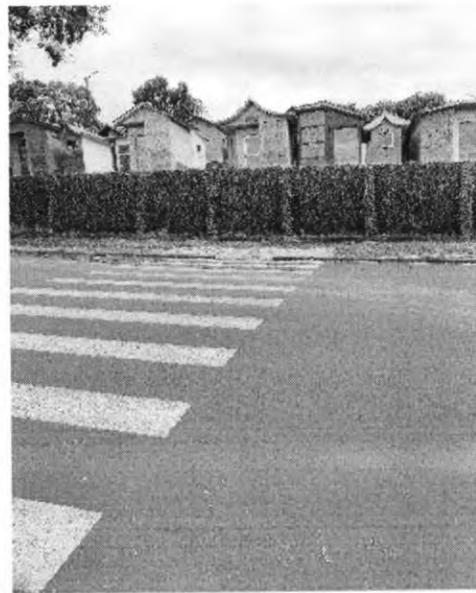

Visto Fiscalização:

JEAN FELIPE
MECCANDRI
08136345988
Coronel Vivida - PR

Visto Contratada: RODRIGO
SILIPRANDI: 6383029
9915

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 08/09/2023 | Pág. | 343 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 343 | Prazo Restante: | 71 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | | | | |
| | | | | |

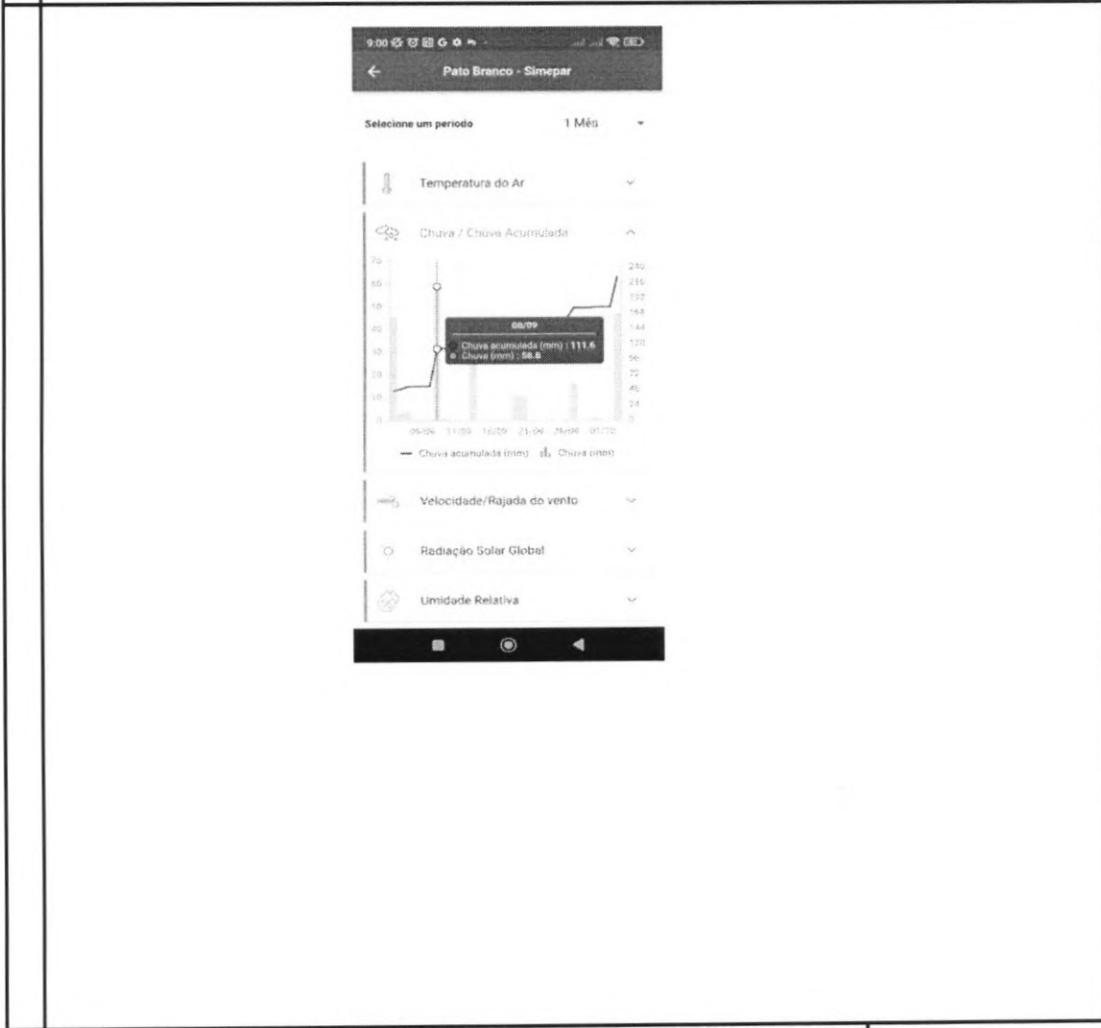

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|--|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANDRI 08126345688 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|--|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 15/09/2023 | Pág. | 350 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 350 | Prazo Restante: | 64 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MEECANGR: 08130345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915 | Data |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 21/09/2023 | Pág. | 356 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 356 | Prazo Restante: | 58 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | |
|----------|----------------------|--|--|
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MEOCANSKI 08126345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 6383029 9915 | Data |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 25/09/2023 | Pág. | 360 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 360 | Prazo Restante: | 54 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |



Visto Fiscalização:

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915

Assinatura eletrônica de Rodrigo Siliprandi
RODRIGO SILIPRANDI:6383029 9915


Data

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------|---------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 27/09/2023 | Pág. | 362 |
| Resp. Técnico | | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | quarta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 362 | Prazo Restante: | 52 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | | | X |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| Serviços | Servente | 7 | | |
| | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |

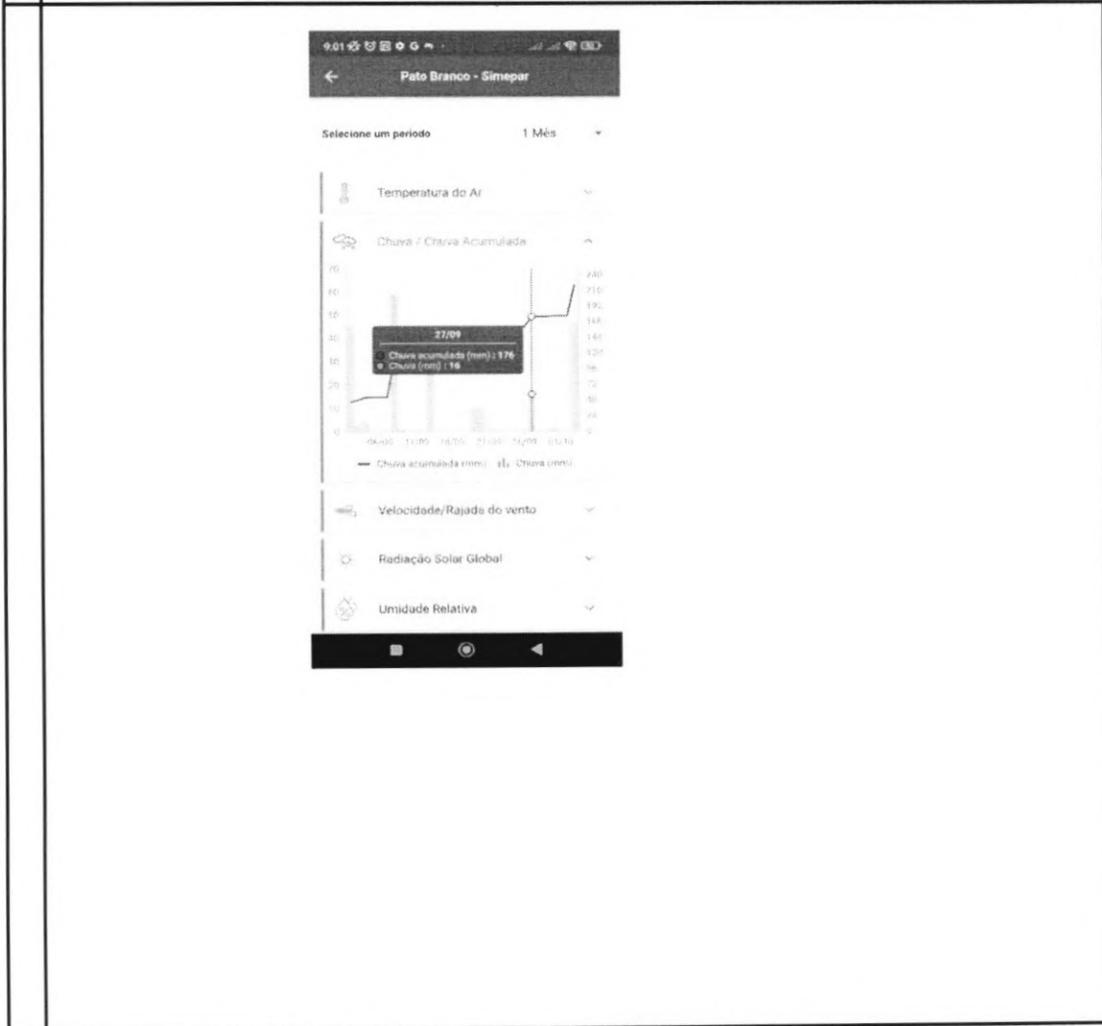

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 6383029 9915 | Data |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem LTDA | | | | Data: | 29/09/2023 | Pág. | 364 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | Contrato N° 126/2022 Pavimentação Asfáltica | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Coronel Vivida - PR | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 364 | Prazo Restante: | 50 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 414 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 5 | | |
| | Servente | 7 | | |
| Serviços | LIMPEZA DOS PASSEIOS | | | |
| | EXECUÇÃO CALÇADAS | | | |



| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|--|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI: 6383029 9915 | Data | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 001

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 02/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITERA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-28455/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | PR-148981/D | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | |
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | | OUTRO: | | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) | | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA | |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 2ª-feira | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. | LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. | EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NOME: | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988 | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 002

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 03/10/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | | x |
| TARDE | | | | | x |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------------|
| 1. IMPRODUTIVO |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Aprovado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. CN: Rodrigo Siliprandi, CN=C, OU=Coronel Vivida - PR, O=Coronel Vivida - PR, C=BR. Data: 2023.10.03 11:26:17 -03'00'. Hash: 08136345988. Versão: 2.0.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 003

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 04/10/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | |
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | x | |
| TARDE | | | | x | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOME: | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO |
| FUNÇÃO: | ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | |
| ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 004

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 05/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | x | | |
| TARDE | | | x | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915. DN: C=BR, O=CPF-BRASIL, OU=AC BR/UFPI Maranhá, CN=RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915. Razão: motivo de não assinatura não disponível. Assinatura em conformidade com a Lei nº 10.670, de 2003. Data: 2023.10.05 09:11:10Z. Tipo PDF Reader: Versão: 102.0.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 005

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 06/10/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 DN: C=BR, O=CP-PRIME, OU=AC SOLUTI Multissol, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: <small>08126345988 Coronel Vivida - PR</small> |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 006

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 09/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 28-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. | LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. | EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI 0299915 <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI em 09/10/2023 às 10:05:15. Nº do Documento: 0299915. Nº do Processo: 0299915. Nº do Contrato: 126/2022. Nº do RDO: 006. Localidade: Coronel Vivida - PR. Data: 09/10/2023. Hora: 10:05:15. Tipo: PDF. Versão: 2023.0.</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 007

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|-----------|----------------------|------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 10/10/2023 - ter | |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS= 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. DN: C=BR, O=CP-PRIME, OU=AC SOLUTI, CN=Rodrigo Siliprandi, email=rod@zncanaro.com.br, ou=CORONEL VIVIDA, ou=Coronépolis</small> <small>Localidade: Coronel Vivida - PR, Data: 2023.10.10 17:00:23, Versão: 2.0.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 009

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 12/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | x | |
| TARDE | | | | x | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI 63830299915 NO CARR. OLSF-0004 (OU-AC) SOL/LTI-Mobilis v6 OLSF071818300110 - CAUF-Previdenci - OU-Certificad PF AL CHAVES RODRIGO SILIPRANDI 63830299915 Assinatura emitida em 26/10/2023 às 14:05:00 Assinatura emitida em 26/10/2023 às 14:05:00 Data: 2023.10.26 14:05:00 Função: RDO - 2023.2.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI ENCARREGADO Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI | JEAN FELIPE MIECOANSKI |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO |
| | ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 010

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 13/10/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 014

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 19/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 5ª-feira | | | | |
|--------------------|----------|--|--|---|--|
| MANHÃ | | | | | |
| TARDE | | | | x | |
| NOITE | | | | x | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| NOME: | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: | ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | | | |
| | | | |
| RODRIGO SILIPRANDI | JEAN FELIPE MIECOANSKI | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 015

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 20/10/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 6ª-feira | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--------------------------|
| 1. IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 016

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 23/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | x | | | |
| TARDE | | x | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. | LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. | EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 6383 0299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI 638309915. NG: 5485, CN: CN=Rodrigo Siliprandi, OU=AC SOLUTUM, OU=AC SOLUTUM, O=AC SOLUTUM, C=BR. Assinatura criada em 23/10/2023 10:08:15. Localização: sua localização de assinatura não é conhecida. Para obter mais informações consulte o site: https://www.br.gov.br/assinaturas. Para obter mais informações consulte o site: https://www.br.gov.br/assinaturas.</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 018

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 25/10/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 CN=C=Rodrigo Siliprandi, O=Coronel Vivida - PR, OU=Coronel Vivida - PR, C=BR DN=63830299915 Date: 2023.10.25 09:21:17 -0300 First OF: Rodrigo Siliprandi: 2023.10</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 019

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 26/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. DN: cn=RODRIGO SILIPRANDI, ou=RODRIGO SILIPRANDI, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ou=CORONEL VIVIDA, ou=PR, ou=BR</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 020

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 27/10/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI Responsável Técnico Nº 0299915 | JEAN FELIPE MIECOANSKI Responsável pela Fiscalização Nº 08136345988 Coronel Vivida - PR |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 30/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITERA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | x | | |
| TARDE | | | x | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| NOME: | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 024

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----|--------------|---|----------------------|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 02/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | | A9999999 | | Nº ART / RRT: | | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | | 21/09/2023 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------------|
| 1. IMPRODUTIVO |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI 63830299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI 63830299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVERÃO SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 026

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 06/11/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 027

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 07/11/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. | LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. | EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMIPRAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 028

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|-----------|----------------------|------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 08/11/2023 - qua | |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCCORRÊNCIAS |
|--------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: ENC RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronei Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RODRIGO SILIPRANDI ENCARGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS (OU SEMANAIS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 029

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 09/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 4 SERVENTES | |
| | | VIBROACABADORA | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA | |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| MANHÃ | | | | | X |
| TARDE | | | | | X |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------------|
| 1. IMPRODUTIVO |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI: 63830 299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI: 63830 299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 030

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 10/11/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | |
| TARDE | | X | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RG: 04881400115, CPF: 04881400115, CNPJ: 04881400115, Município de Coronel Vivida - PR Assinatura em nome de sua assinatura digital Localidade: Coronel Vivida - PR Data: 2024.02.26 11:37:38-0700 Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RG: 04881400115, CPF: 04881400115, CNPJ: 04881400115, Município de Coronel Vivida - PR Assinatura em nome de sua assinatura digital Localidade: Coronel Vivida - PR Data: 2024.02.26 11:37:38-0700 Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 031

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 13/11/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI</p> <p>08136345988</p> <p>Coronel Vivida - PR</p> <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI</p> <p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVERÃO SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 033

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 15/11/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | ROLO DE PATAS | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) | | |
| | ROLO DE PNEUS | ROMPEDOR | | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | ROLO LISO | VIBRADOR | | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|---|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | | | X |
| TARDE | | | | | | X |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Responsável Técnico <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 CN=C=BR, OU=CPF Brasil, OU=AC SOLUTIA Município v.b. C=BR DN=63830299915, OU=Assinatura, C=BR, CN=Rodrigo Siliprandi:63830299915 Razão motivo da sua assinatura não Localizada, sua validade de assinatura não Data: 2024.02.26 11:27:58-0300 Versão PDF Header Versão: 2022.2.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Responsável Técnico | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Responsável Técnico <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 CN=C=BR, OU=CPF Brasil, OU=AC SOLUTIA Município v.b. C=BR DN=63830299915, OU=Assinatura, C=BR, CN=Rodrigo Siliprandi:63830299915 Razão motivo da sua assinatura não Localizada, sua validade de assinatura não Data: 2024.02.26 11:49:22-0300 Versão PDF Header Versão: 2022.2.0</small> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 034

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 16/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | x | |
| TARDE | | | | x | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS NOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 036

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 20/11/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | x | | | |
| TARDE | | | x | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------|
| 1. LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988</p> <p>Coronel Vivida - PR</p> <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI</p> <p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> |
| | <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 037

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 21/11/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | x | | | | |
| TARDE | x | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. | LIMPEZA DOS PASSEIOS |
| 2. | EXECUÇÃO CALÇADAS |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p><small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI (638302999) 15. CN: C=BR, OU=UFPA, OU=AC SQUITI, OU=UFPA, OU=RODRIGO SILIPRANDI, OU=638302999, OU=Assinatura Digital, CN=Rodrigo Siliprandi</small></p> | <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR</p> <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830 299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p><small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI (638302999) 15. CN: C=BR, OU=UFPA, OU=AC SQUITI, OU=UFPA, OU=RODRIGO SILIPRANDI, OU=638302999, OU=Assinatura Digital, CN=Rodrigo Siliprandi</small></p> | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 040

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 24/11/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 042

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 28/11/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | |
| STATUS DA OBRA: | x OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM x NÃO | | RETRABALHO: | SIM | | NÃO | | | |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO | |
| ASSINATURAS | | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915 299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 043

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 29/11/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADOS(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | x | | | |
| TARDE | | x | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 044

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----|------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 56 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 30/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 126/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 26/09/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720225209350 | | | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720223265105 | | | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 25/03/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 21/09/2023 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 0 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 8 PESSOAS | | | | |
|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 4 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | |
| TARDE | | X | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NOME: | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: | ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | | | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | |
| | | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.

DOCUMENTAÇÃO MUNICIPAL

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PROJETO

Plano Diretor Municipal

Busca de Prioridades

Operação de Crédito

Análise de Prioridade

Plano de Trabalho

Processo Licitatório

Registro de Preço

Entrega de Contrato

Envio de Medição

Solicitação de Aditivo

Rescisão de Contrato

Projetos Cadastrados

Monitoramento de Projeto Concluído

TÉCNICO MUNICIPAL

AGENDA 2030 - ODS

AJUDA



Listar Técnicos Municipais

Manuais para Técnicos Municipais

Manuais Públicos

Sobre Assinatura Eletrônica

JEAN

JEANFELIPE
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA

Meu Perfil

Contato



OUTROS SERVIÇOS

PARANAINTERATIVO

Gerador de Placa

GurlA

Ortofotos

Sair

MEDIÇÃO

O processo de Medição consiste na verificação das quantidades e qualidade dos serviços executados em cada etapa do contrato. É realizada pela fiscalização designada formalmente pela contratante, tendo como base os serviços efetivamente executados e os padrões estabelecidos no contrato (quantidades e especificações).

STATUS

O status está determinado pelo estágio menos avançado da documentação da medição associada ao lote.

1) **Deferimento Não Iniciado** - Medição para a qual não foi encaminhado ao PARANACIDADE nenhum documento dos itens da documentação solicitada;



Informações gravadas com sucesso

MUNICÍPIO

Coronel Vivida | ~~ERFBO~~

PRIORIDADE

Nº 75 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

CONVÊNIO

Nº 1114/2022

PROJETO

**Nº 56 | Lote Nº 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
Convênio: 1114/2022**

PROGRAMA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

EMPRESA

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA



II) **Envio da documentação preliminar** - Medição para a qual foi enviado ao menos um documento dos itens da documentação solicitada;

III) **Análise da Comissão Remota** - Medição em processo de análise e validação do PARANACIDADE, não é permitido o envio de documentos neste status;

IV) **Solicitado Vistoria in Loco pela Comissão Remota** - Medição que necessita de vistoria in loco. Neste status, o supervisor do PARANACIDADE elaborará o relatório fotográfico de vistoria;

V) **Recusado pela Comissão Remota** - Medição que necessita correções das informações enviadas. Neste status, o supervisor do PARANACIDADE deve definir as correções necessárias;

VI) **Correção dos Documentos Preliminares** - Medição que necessita de correções do Município;

VII) **Aprovado pela Comissão Remota** - Medição com a documentação preliminar aprovada. Neste status, o supervisor do PARANACIDADE deve definir os documentos restantes necessários;

VIII) **Análise Pendente - Aguardando documentação complementar do município** - Medição aguardando o envio da documentação complementar do Município;

IX) **Análise Favorável** - Medição com documentação técnica aprovada;

INSTRUÇÕES

Nº CONTINUTO 126/2022

VL CONT. R\$ 2.459.309,50

VL ORIC. R\$ 2.386.474,36

DT. ASS. 26/09/2022

VIGÊNCIA 21/09/2023
360 (dias)

PZ. EXEC. 15/04/2023
201 (dias)

Nº MEDIÇÃO 3
(Medição Final)

STATUS Envio da Documentação Preliminar

PARANAINTERATIVO

Veja o projeto no PARANAINTERATIVO

CONSULTAR

DOCUMENTAÇÃO ENVIADA

ANÁLISE

Planilha de Medição em Excel do Município

Planilha de medição

Exibir histórico de observações

RECEBIDO

Última Alteração:
25/06/2024 16:17:32

Relatório Fotográfico

relatório fotográfico

Exibir histórico de observações

RECEBIDO

Última Alteração:
29/05/2024 17:05:26

Relatório Ensaios

Relatório de ensaios

RECEBIDO

Última Alteração:
08/03/2024 11:18:00

Análise Ensaios

Análise dos ensaios

RECEBIDO

Protocolo 2.063/2024 | Anexo: Medicao_Portal_dos_Municipios.pdf (3/5) 99/131
Última Alteração:



Clique no botão **Editar** para acessar o formulário de envio de documentos e apresentar as informações solicitadas.

Clique no botão **Voltar** para acessar outras medições do Lote.

DOCUMENTAÇÃO ENVIADA

ANÁLISE

08/04/2024 17:02:12

Diário de Obra (Clausula 6ª do Contrato) - Cópia em PDF

Diário de obra

Exibir histórico de observações

RECEBIDO

Última Alteração:

08/03/2024 11:19:32

Fotos - Mínimo 8 em formato JPG

fotos

NÃO ANALISADO

Última Alteração:

30/07/2024 12:01:45

OBSERVAÇÕES

24/06/2024 18:25:29 - Genezi Guedes dos Santos

Falta foto da Placa

Anteriores

Vídeos

Vídeos da obra

RECEBIDO

Última Alteração:

08/03/2024 11:29:22


DOCUMENTAÇÃO NÃO ENVIADA

Nenhuma documentação a ser enviada

MODELOS

Clique no botão "Acessar" para consultar os modelos disponibilizados.

Acessar



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Clique em Acessar e cadastre o relatório fotográfico através do sistema e gere o documento em PDF.

[ACESSAR](#)

MENSAGEM

PARANACIDADE - 11/07/2024 13:59:27 - Genezi Guedes dos Santos

No aguardo da documentação do aditivo para encerrarmos a obra

[Anteriores](#)

[Voltar](#)

[Editar](#)

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar

Ahú - 80540-280 - Curitiba - Paraná

Telefone: (41) 3350-3300

[PARANACIDADE](#)

[PARANAINTERATIVO](#)

[Governo do Paraná](#)

[Termos de uso](#)

[GurIA](#)





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 125/2024– DEP

Coronel Vivida PR, 29 de julho de 2024.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES PENDENTES DO CONTRATO 126/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2022, DA OBRA DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 20.947,74 m², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, SAM 56.

Vimos através deste solicitar o pagamento dos valores pendentes à empresa executora: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.461.328/0001-29, referente ao contrato 126/2022, concorrência pública 14/2022, Convênio nº 1114/2022 - SEDU.

O contrato foi assinado em 26/09/2022, tendo 180 dias como prazo de execução e 360 dias de prazo de vigência. Ao longo da obra foram feitas duas medições atingindo o percentual de 62,75%.

Durante a execução da rua XV de Novembro percebeu-se que seriam necessários serviços de recuperação da base da pavimentação, serviços que não estavam previstos no projeto e orçamento da obra. Dessa forma, foi solicitado aditivo de meta física e financeira ao contrato, para que pudessem ser executados esses serviços, sendo assinado o aditivo 01 em 21/07/2023. Durante a tramitação da solicitação desse aditivo ocorreu o vencimento do prazo de execução em 15/04/2024. Dessa forma, a medição do saldo existente do contrato e dos itens do aditivo ficariam para ser efetivados na medição final da obra, dentro apenas do prazo de vigência.

Com a proximidade do fim do prazo de vigência, e a obra ainda em andamento, foi solicitado o aditivo 02, que prorrogou a vigência até 19/11/2023. Conforme consta no relatório fotográfico em anexo, e no próprio diário de obras, os serviços foram majoritariamente executados dentro do prazo de vigência. Houveram apenas dois dias de trabalho sem cobertura contratual, nos quais não houve produção efetiva, apenas limpeza e finalização de calçada (retrabalhos e acabamentos). Porém, atestamos, para os devidos fins, que todos os serviços foram executados de acordo com as exigências contratuais, ficando apenas a medição para ser efetivada após o prazo de vigência.

Dessa forma, cabe o pagamento dos itens executados pela empresa e não medidos, conforme segue:

- I) R\$ 888.994,45 (saldo do contrato original)
- II) R\$ 72.835,14 (valor do aditivo 01)
- III) -R\$ 176.263,56 (valor de supressão a ser aprovado)
- IV) R\$ 17.138,50 (valor de aditivo a ser aprovado)

Valor total devido: R\$ 802.704, 53



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Para a finalização do contrato, também cabe considerar as alterações de quantidade de itens do contrato realizadas para maior atendimento do objetivo da obra, indicados como supressão e aditivos a serem aprovados nos itens III e IV acima. Os principais serviços alterados estão dentro dos itens de Meio-Fio e Sarjeta (arrancamento e reassentamento de meio-fio e execução de meio-fio novo), e Serviços de Urbanização (serviços relacionados a execução de calçadas). Também houve alteração do serviço de execução de tachão refletivo bidirecional, na rua das Américas, o que se mostrou necessário para cumprir melhor a função da sinalização de trânsito no local.

Foi solicitada a medição final, porém, para a efetivação do pagamento, a fiscalização do paranacidade solicitou a elaboração do termo de reconhecimento de dívida, conforme e-mail anexado. Dessa forma, para evitar enriquecimento ilícito do município, reconhecemos o valor pendente de pagamento que totaliza R\$ 802.704,53 (oitocentos e dois mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), e atestamos que os serviços foram executados de acordo com as exigências contratuais.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de supressão e aumento de meta física-financeira, e do pagamento do valor devido, para que o contrato seja concluído.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,

JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.08.05 15:48:26-03'00"

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos

Readequação com redução de valor

| Município: | | CORONEL VIVIDA | | | | | | | SAM | | 56 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Projeto: | | Recape asfáltico em CBUQ | | | | | | | LOTE nº | | 1 | |
| Local da Obra: | | Vias urbanas na Sede do Município | | | | | | | | | | |
| Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | QUANT LICITADA | UNIT | Quant. Aditivo I | Quant. Aditivo II | (R\$) - LICITADA | (R\$) - Aditivo I | (R\$) - Aditivo II | (R\$) - TOTAIS | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 29.854,75 |
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Simples | m3 | 3,92 | 170,49 | 3,92 | 3,92 | 668,32 | 668,32 | 668,32 | | |
| | | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | | 57,18 | 441,13 | 441,13 | | 25.223,81 | 25.223,81 | | |
| 74209/1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTAL ETES. | un | 1,00 | 3.962,62 | 1,00 | 1,00 | 3.962,62 | 3.962,62 | 3.962,62 | | |
| 2 | | | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | 5.913,76 |
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 52,70 | 14,07 | 420,31 | 420,31 | 741,49 | 5.913,76 | 5.913,76 | | |
| 3 | | | BASE / SUB-BASE | | | | | | | | | 98.668,94 |
| 531300 | DER | Rachão s/britagem | m3 | | 138,86 | 294,09 | 294,09 | | 40.837,34 | 40.837,34 | | |
| 531300 | DER | Brita Graduada | m3 | | 219,02 | 220,57 | 220,57 | | 48.309,24 | 48.309,24 | | |
| | | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 52,70 | 180,69 | 52,70 | 52,70 | 9.522,36 | 9.522,36 | 9.522,36 | | |
| 4 | | | REVESTIMENTO | | | | | | | | | 1.844.214,25 |
| PAV-085 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 21.110,60 | 0,62 | 19.477,11 | 19.477,11 | 13.088,57 | 12.075,81 | 12.075,81 | | |
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | m2 | | 0,55 | 1.470,63 | 1.470,63 | | 808,85 | 808,85 | | |
| 589420A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | ton | | 5.602,63 | 0,74 | 0,74 | | 4.145,95 | 4.145,95 | | |
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 21.110,60 | 0,37 | 19.477,11 | 19.477,11 | 7.810,92 | 7.206,53 | 7.206,53 | | |
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 10,56 | 5.527,35 | 9,74 | 9,74 | 58.368,82 | 53.836,39 | 53.836,39 | | |
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | ton | 58,63 | 402,37 | | | | 23.590,95 | | | |
| 589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 2,93 | 7.683,58 | | | | 22.512,89 | | | |
| 570000D | DER | CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 2.621,65 | 297,69 | 2.621,65 | 2.533,78 | 780.438,99 | 780.438,99 | 754.280,97 | | |
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 149,43 | 7.683,58 | 149,43 | 131,69 | 1.148.157,36 | 1.148.157,36 | 1.011.859,75 | | |
| 5 | | | MEIO-FIO E SARJETA | | | | | | | | | 31.783,90 |
| PAV-077 | PM curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | m | 254,06 | 46,05 | 46,81 | 229,05 | 11.699,46 | 2.155,60 | 10.547,75 | | |
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | m | 235,13 | 46,25 | 446,36 | 459,16 | 10.874,76 | 20.644,15 | 21.236,15 | | |
| 6 | | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | 142.649,37 |
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | m | 1.094,50 | 19,04 | 1.094,50 | 716,20 | 20.839,28 | 20.839,28 | 13.636,45 | | |
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 1.272,93 | 2,83 | 1.272,93 | 1.187,16 | 3.602,39 | 3.602,39 | 3.359,66 | | |
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas (esp=5cm) | m3 | 63,64 | 194,37 | 63,64 | 59,21 | 12.369,71 | 12.369,71 | 11.508,65 | | |
| 534906K | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | m2 | 999,56 | 80,03 | 999,56 | 1.077,91 | 79.994,79 | 79.994,79 | 86.265,14 | | |
| 534906L | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil Alerta e Direcional) | m2 | 70,62 | 87,95 | 70,62 | 70,62 | 6.211,03 | 6.211,03 | 6.211,03 | | |
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 263,33 | 13,51 | 263,33 | 100,00 | 3.557,59 | 3.557,59 | 1.351,00 | | |
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | un | 43,00 | 549,12 | 43,00 | 37,00 | 23.612,16 | 23.612,16 | 20.317,44 | | |
| 7 | | | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | 123.821,01 |
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | un | 530,00 | 47,10 | 530,00 | 570,00 | 24.963,00 | 24.963,00 | 26.847,00 | | |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/linta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1.705,21 | 36,51 | 1.705,21 | 1.705,21 | 62.257,22 | 62.257,22 | 62.257,22 | | |
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 14,92 | 733,84 | 14,92 | 14,92 | 10.948,89 | 10.948,89 | 10.948,89 | | |
| 821300 | DER | Supporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 47,00 | 505,70 | 47,00 | 47,00 | 23.767,90 | 23.767,90 | 23.767,90 | | |
| 11 | | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | 23.278,46 |
| (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | | 144,89 | 3,00 | 3,00 | | 434,67 | 434,67 | | |
| | | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | | 147,73 | 3,00 | 3,00 | | 443,19 | 443,19 | | |
| 74022/27 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 33,00 | 97,40 | 32,00 | 32,00 | 3.214,20 | 3.116,80 | 3.116,80 | | |



| Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | QUANT LICITADA | UNIT | Quant. Aditivo I | Quant. Aditivo II | (R\$) - LICITADA | (R\$) - Aditivo I | (R\$) - Aditivo II | (R\$) - TOTAIS |
| 7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 33,00 | 175,45 | 32,00 | 32,00 | 5.789,85 | 5.614,40 | 5.614,40 | |
| 74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 33,00 | 102,64 | 32,00 | 32,00 | 3.387,12 | 3.284,48 | 3.284,48 | |
| 7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 33,00 | 136,80 | 32,00 | 32,00 | 4.514,40 | 4.377,60 | 4.377,60 | |
| 3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1,00 | 6.007,32 | 1,00 | 1,00 | 6.007,32 | 6.007,32 | 6.007,32 | |
| PREÇO GLOBAL | | | | | | | | 2.386.474,36 | 2.459.309,50 | | 2.300.184,44 |

08/07/2024



Jean Felipe Miecowski
 Inscrição em: 11.51.35-03/00
 CPF: 081.363.45988

JEAN FELIPE
 MIECOANSKI:
 08136345988
 Eu sou o autor deste
 documento
 Coronel Vivida - PR
 2024.07.08
 11:51:35-03'00"

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Valor Licitado | R\$ 2.386.474,36 |
| Aditivo I - PT 936/2023 | R\$ 72.835,14 |
| Novo Valor do Contrato | R\$ 2.459.309,50 |
| Valor Supressão | R\$ 176.263,56 |
| % supressão 25% | 7,39% |
| Acrescimo | R\$ 17.138,50 |
| % acrescimo | 0,72% |
| Novo Valor do Contrato | R\$ 2.300.184,44 |





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERVIÇOS EXECUTADOS E COM PENDÊNCIA DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA

PROJETO/LOTE 563 LOTE Nº 1

PROGRAMA PROGRAMA TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL

CONTRATADA LANCAMENTO DE TERRA EM RUA

CONTRATO Nº 0002/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2023

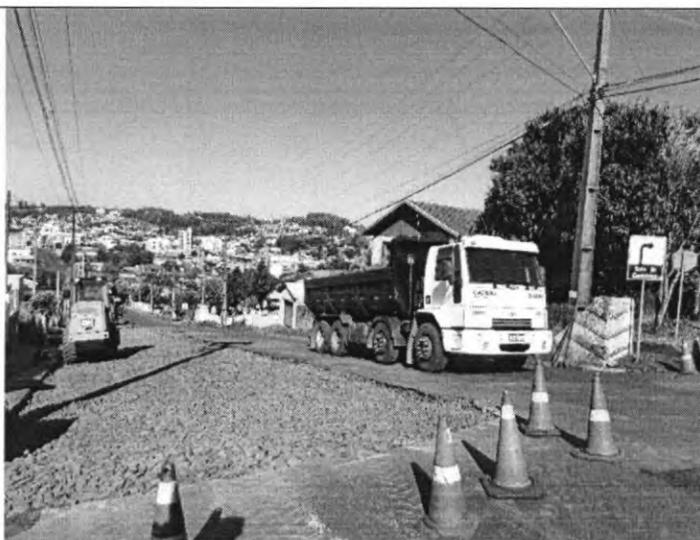


Foto 01 – obra na rua XV de novembro – data: 16/08/2023



Foto 02 – obra na rua XV de novembro – data: 16/08/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Foto 03 – obra na rua XV de novembro – data: 21/08/2023



Foto 04 – obra na rua XV de novembro – data: 21/08/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Foto 05 – obra na rua XV de novembro – data: 22/08/2023



Foto 06 – obra na rua XV de novembro – data: 22/08/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Foto 07 – Obra na rua Cândido Inácio de Lima – data 15/09/2023



Foto 08 – Obra na rua Cândido Inácio de Lima – data 15/09/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

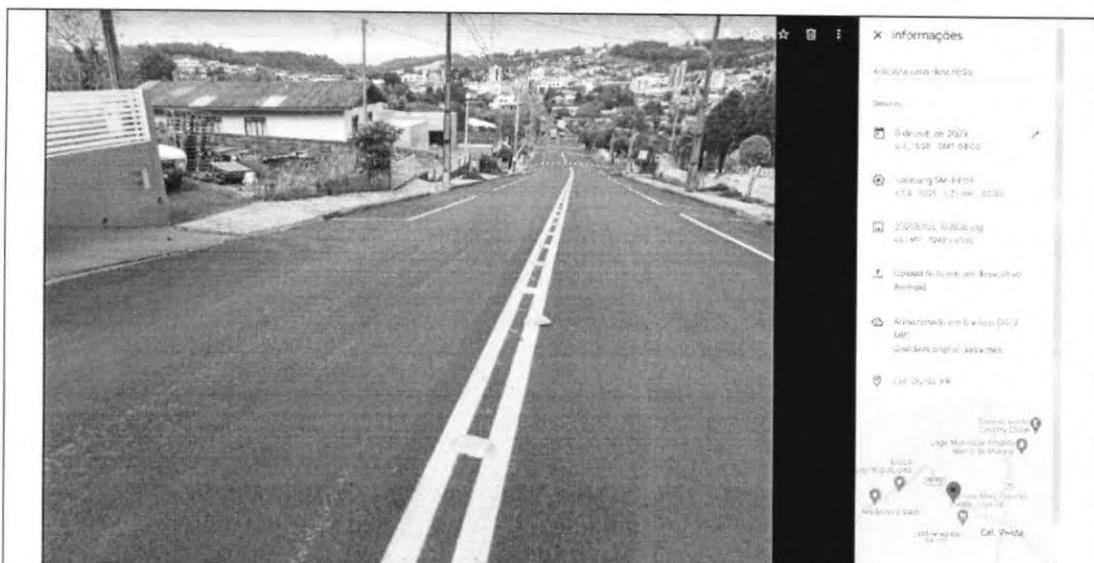


Foto 09 – Obra na rua XV de novembro – data 05/10/2023



Foto 10 – Obra na rua XV de novembro – data outubro/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Foto 11 – Obra (rampa de acessibilidade) na rua Cândido Inácio de Lima – data outubro/2023



Foto 12 – Obra (rampa de acessibilidade) na rua Cândido Inácio de Lima – data outubro/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Coronel Vivida, 05 de agosto de 2024



Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - CREA 148.981D/PR
RPP: 1.129.123/PR

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR
2024.08.05 16:38:23-03'00"

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos

Protocolo 4- 2.063/2024

De: Elton Z. - GP-CG

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 06/08/2024 às 13:35:51



Segue.

—
Elton Luiz Zapchau
Chefe de Gabinete

Protocolo 5- 2.063/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2024 às 10:38:39

Setores envolvidos:

SA-SRAP, SF, GP-PJ, GP-CG, CompEngenharia

Requerimento

Prezados,

Trata-se de pedido tardio de aditivo contratual de supressão e acréscimo da meta física, bem como de reconhecimento de dívida no valor de R\$ 802.704,53.

Pois bem.

É sabido que pedidos de aditivos devem ser realizados a tempo e modo adequado, o que não ocorreu no presente caso.

Contudo, é de conhecimento desta Procuradoria Jurídica que o Parancidade recomenda a elaboração de aditivos apenas ao final do prazo de vigência contratual, mesmo que os serviços já tenham sido executados.

Deste modo, tendo em vista que a Divisão de Estudos e Projetos afirma que os serviços foram executados, efetivamente, dentro do prazo de execução da obra, não se opõe à formalização dos aditivos solicitados no presente momento, mesmo que de forma excepcional.

Da mesma forma, após a formalização dos aditivos de supressão e acréscimo, este órgão não se opõe ao reconhecimento de dívida, vez que atestado que houve a efetiva execução dos serviços e o ente público não pode se enriquecer sem causa.

Por fim, não se verifica elementos para a apuração de eventual responsabilidade dos servidores do município, visto que a orientação partiu do Parancidade.

Atenciosamente.

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313

Assinado por 2 pessoas: DANIEL PROENÇA LARSSON e FERNANDO ZANCANARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/45E3-7A16-37D0-C49E> e informe o código 45E3-7A16-37D0-C49E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45E3-7A16-37D0-C49E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 07/08/2024 10:40:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ FERNANDO ZANCANARO (CPF 006.XXX.XXX-88) em 15/08/2024 17:42:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/45E3-7A16-37D0-C49E>

Protocolo 6- 2.063/2024

De: Jean M. - CompEngenharia

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 12/08/2024 às 12:01:28



Olá, bom dia

Segue solicitação de aditivo e de formalização de termo de reconhecimento de dívida.

—
Jean Felipe Miecoanski
Divisão de Estudos e Projetos

Protocolo 7- 2.063/2024



De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP - Gabinete do Prefeito

Data: 12/08/2024 às 13:41:32

Segue para análise e autorização.

—
Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Protocolo 8- 2.063/2024



De: Elton Z. - GP-CG

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 13/08/2024 às 09:50:35

DESPACHO

Assunto: Formalização de Aditivos e Reconhecimento de Dívida

Encaminho-vos essa solicitação de aditivos, tendo em vista que esse departamento é incompetente para decidir.

—
Elton Luiz Zapchau
Chefe de Gabinete

Protocolo 9- 2.063/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP - Gabinete do Prefeito

Data: 13/08/2024 às 10:34:51

Segue para análise.

—
Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos



Protocolo 10- 2.063/2024



De: Anderson B. - GP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 13/08/2024 às 10:56:55

autorizo conforme parece juridico

—
Anderson Manique Barreto
Prefeito



Protocolo (Nota interna 14/08/2024 08:32) 2.063/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2024 às 08:32:10

Segue aditivo de alteração da meta física e financeira para assinatura.

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

22_Aditivo_n_03_ao_Contrato_n_126_2022_F_Zancanaro_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|
| Anderson Manique Barreto | 14/08/2024 08:59:53 | 1Doc | ANDERSON MANIQUE BARRETO CPF 967.XXX.XXX-91 |
| Fernando Zancanaro | 14/08/2024 11:26:13 | ICP-Brasil | FERNANDO ZANCANARO CPF 006.XXX.XXX-88 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A478-573A-4551-6F15**



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 03

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Terceiro termo aditivo ao contrato nº 126/2022 decorrente da Concorrência Pública nº 14/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, situado na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, Estado do Paraná-PR, CNPJ 76.995.455/0001-56, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 5.228.761-8, inscrito no CPF sob n.º 967.311.099-91.

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.461.328/0001-29, localizada na BR 158, km 513, 2800, Bairro São Francisco, na cidade de Pato Branco (85.501.970), Estado do Paraná, representada por seu representante legal, Sr. **Fernando Zancanaro**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 7.115.542-0 SESP PR, inscrito no CPF sob n.º 006.839.409-88.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 126/2022 que tem como objeto o **RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 20.947,74 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. TRECHO: • RUA CÂNDIDO INÁCIO DE LIMA ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DAS ORQUÍDEAS; • RUA XV DE NOVEMBRO ENTRE AS RUAS ZEFFERINO POLETTO E PRESIDENTE KENNEDY; • RUA DAS AMÉRICAS ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA MARECHAL DEODORO; • RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES ENTRE AS RUAS ROMÁRIO MARTINS E DA LIBERDADE; • RUA MARTA BERGER ENTRE AS RUAS HONORATO NEPOMUCENO E CORONEL CONSTANTINO FABRÍCIO; • RUA HONORATO NEPOMUCENO ENTRE AS RUAS DUQUE DE CAXIAS E ÂNGELO PERUZZO**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 14/2022 - Concorrência Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira (acréscimo e supressão), objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Décima Segunda do Contrato nº 126/2022 de 26 de setembro de 2022, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da contratada através do Protocolo 1doc 2.063/2024, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos através do mesmo Protocolo 1doc nº 2.063/2024 e anexos, parecer jurídico e autorização superior.

Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA META FÍSICA E FINANCEIRA:

Parágrafo primeiro: Fica suprimido o valor de R\$ 176.263,56 (cento e setenta e seis mil e duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Parágrafo segundo: Fica acrescido o valor de R\$ 17.138,50 (dezesete mil e cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Parágrafo terceiro: Considerando a supressão e o acréscimo, o valor da diferença é de - R\$ 159.125,06 (cento e cinquenta e nove mil e cento e vinte e cinco reais e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 2.300.184,44 (dois milhões e trezentos mil e cento e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 126/2022 de 26 de setembro de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 14 de agosto de 2024.

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

.....
Fernando Zancanaro
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A478-573A-4551-6F15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ANDERSON MANIQUE BARRETO** (CPF 967.XXX.XXX-91) em 14/08/2024 08:59:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **FERNANDO ZANCANARO** (CPF 006.XXX.XXX-88) em 14/08/2024 11:26:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/A478-573A-4551-6F15>

Protocolo 11- 2.063/2024



De: Jean M. - CompEngenharia

Para: Representante: Fernando Zancanaro

Data: 15/08/2024 às 14:55:26

Olá, boa tarde a todos

Gostaria de solicitar a assinatura no termo de reconhecimento de dívida, documento solicitado pelo paranacidade, para permitir o pagamento e finalização do contrato.

Jean Felipe Miecoanski
Divisão de Estudos e Projetos

Anexos:

TERMO_DE_RECONHECIMENTO_DE_DIVIDA_AGO_24.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| Fernando Zancanaro | 15/08/2024 17:53:25 | ICP-Brasil | FERNANDO ZANCANARO CPF 006.XXX.XXX-88 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D388-5AB0-D124-7719**



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Atestamos, para os devidos fins, que os serviços abaixo descritos foram todos executados de acordo com as exigências contratuais, ainda que parte dos mesmos tenham sido prestados sem a devida cobertura do contrato, por conta da expiração do prazo de vigência do mesmo, conforme dados a seguir:

1) DADOS DO CONTRATO

- **Licitação:** Concorrência 014/2022;
- **Objeto:** Recape asfáltico em CBUQ, 20.947,74 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos
- **Empresa:** F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
- **Contrato:** 126/2022, assinado em 26/09/2022;
- **Prazos:** * execução 15/04/2023
* vigência 19/11/2023

2) SERVIÇOS MEDIDOS ATÉ 24/04/2023

| Medição | Data | Valor | % valor orig. contratual |
|-------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 23/11/2022 | 1.145.532,50 | 48,00% |
| 2 | 09/03/2023 | 351.947,41 | 14,75% |
| TOTAL PAGO | | R\$ 1.497.479,91 | 62,75% |

3) SERVIÇOS PRESTADOS APÓS 24/04/2023

| Discriminação | Situação | Valor | % valor orig. contratual |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saldo do contrato original | Pendente de pagamento | 888.994,45 | 37,25% |
| Aumento de Valor aprovado | Pendente de pagamento | 72.835,14 | 3,05% |
| Saldo do Contrato com aditivo I (aprovado e não medido) | Pendente de Pagamento | 961.829,59 | 40,30% |
| Supressão a aprovar | Pendente de Pagamento | 176.263,56 | 7,39% |
| Aumento de Valor a aprovar | Pendente de Pagamento | 17.138,50 | 0,72% |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ 802.704,53 | 33,63% |

Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Dentro dos serviços elencados na tabela 3 acima, parte foi executada fora do prazo de vigência, conforme consta no diário de obras. Houveram dois dias de trabalho sem cobertura contratual, nos quais não houve produção efetiva, apenas limpeza e finalização de calçada (retrabalhos e acabamentos), porém atestamos que foram executados de acordo com as exigências contratuais.

Assim, para evitar enriquecimento ilícito do Município de Coronel Vivida, reconhecemos o valor pendente de pagamento que totaliza R\$ 802.704,53 (oitocentos e dois mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme a tabela 3, a qual será paga à empresa contratada mediante indenização.

E por ser verdade, firmamos o presente.

Coronel Vivida, 15 de agosto de 2024.

Mauro Busanello
Gestor do Contrato

Anderson Manique Barreto
Prefeito do Município

Ciente,

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D388-5AB0-D124-7719

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDO ZANCANARO (CPF 006.XXX.XXX-88) em 15/08/2024 17:53:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvvida.1doc.com.br/verificacao/D388-5AB0-D124-7719>



Protocolo (Nota interna 19/08/2024 09:15) 2.063/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/08/2024 às 09:15:56

Anexo aos autos as publicações do termo aditivo nº 03.

—
Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

24_CORREIO_16_08_2024.pdf

25_AMP_16_08_2024.pdf

| | SANTA ROSA LTDA | | |
|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 86/2024 | EDUARDO GUERRA DO CARMO | 23.647.237/0001-64 | 71.391,05 |
| 87/2024 | M.L. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | 44.651.148/0001-61 | 34.869,00 |
| 88/2024 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME | 11.234.029/0001-54 | 32.551,40 |

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Sandra Pelentil
Código Identificador:1556FBC4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 126/2022 – Concorrência Pública nº 14/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este tem por objeto a ALTERAÇÃO (ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO) da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica suprimido o valor de R\$ 176.263,56. Fica acrescido o valor de R\$ 17.138,50. O valor da diferença é de - R\$ 159.125,06. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 14 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:4732B0CF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 100/2023 – Concorrência Pública nº 07/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Prorroga-se o prazo de execução em mais 60 dias, de 19.08.2024 a 17.10.2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 13 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:E6AD1CF4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 04 ao Contrato nº 51/2023 – Concorrência Pública nº 02/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41. Prorroga-se o prazo de vigência em mais 90 dias, desta forma, de 02.09.2024 a 30.11.2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 13 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:AFF4123F

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 034/2024 - COMISSÃO SINDICÂNCIA EMPRESAS

PORTARIA Nº 034, de 15 de agosto de 2024.

Institui a Comissão Permanente de Sindicância ou de processo administrativo sancionatório, no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, emanadas pelo art. 24, inciso II, alíneas "b" e "e", da Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida – Pr, e como dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993 e, Considerando, a necessidade de estabelecer critérios para a organização e atribuições da Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo sancionatório, no âmbito da Administração Pública Municipal,

DETERMINA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que tem por objetivo apurar eventuais irregularidades administrativas e as consequentes responsabilidades decorrentes de atos e contratos administrativos, em conformidade com a legislação vigente.

Parágrafo único – À Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório compete desenvolver as atividades de caráter apuratório.

Art. 2º - A participação dos servidores na Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório dar-se-á sem prejuízo do exercício de suas respectivas atribuições funcionais.

Art. 3º - A designação dos integrantes da Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo Sancionatório será por 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, desde que não haja a recondução da totalidade de seus componentes.

Art. 4º - Fica nomeada para a Comissão Permanente composta pelos servidores a seguir relacionados, para as funções na Comissão, o objetivo de apurar os fatos que determinam a abertura do presente procedimento administrativo, com observância aos princípios do contraditório e de ampla defesa, podendo culminar com a rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas em lei e no contrato:

I – Luana Marcolina;

II – Simone Terezinha Sozo;

III – Marilei Feltes do Nascimento;

IV – Evandra dos Santos.

Art. 5º - A Comissão dispõe de 30 (trinta) dias para concluir os trabalhos, prorrogáveis por igual período.

Art. 6º - A Assessoria Jurídica do Município fará o acompanhamento necessário da Comissão.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publique-se e registre-se,

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Simone Terezinha Sozo
Código Identificador:53707E4F

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR CMDCA RESOLUÇÃO 16/2024

**CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORONEL VIVIDA
RESOLUÇÃO Nº 16/2024**
