

Proc. Administrativo 6.427/2024

De: Jean M. - SOVU-DEP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 11/07/2024 às 14:08:01

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 156 - cp 25 - sam 59

Olá prezados, boa tarde

Gostaria de solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de meta-física financeira ao contrato 156/2022, Concorrência Pública 25/2022, conforme segue:

-Valor do aditivo dos serviços R\$ 521.891,18 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos).

Conforme orçamento em anexo.

O aditivo se deve aos serviços necessários de drenagem que foram executados durante a obra, e não estavam previstos no orçamento. Além disso, foi necessário acrescentar rampas para PNE nas calçadas, e uma placa de sinalização que não estavam previstos, mas são importantes para que a obra atinja sua finalidade. Foi necessário também a execução de um trecho de calçada em CBUQ, devido a condição da base existente, que não permitia a execução como estava no orçamento. Também foi necessário acrescentar a quantidade de meio-fio novo, pois em muitos casos não possível reaproveitar os existentes.

Atenciosamente,

—
Jean Felipe Micoanski
Divisão de Estudos e Projetos

Anexos:

_ORCAMENTO_ASS.pdf



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BDI (Já incluso no orçamento)

24,23%

ORÇAMENTO

R\$ 521.891,18

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VISTA ALEGRE

Nº do contrato

156-2022

ART de Orçamento Nº

1720225726371

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (em R\$) | | Fonte |
|----------|---|-------|----------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | |
| 1 | ADITIVO - DRENAGEM | | | | | |
| 1.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 1.497,17 | 13,16 | 19.702,76 | |
| 1.2 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 1.193,36 | 35,48 | 42.340,41 | |
| 1.3 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 1.112,00 | 153,08 | 170.224,96 | |
| 1.4 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 266,00 | 266,78 | 70.963,48 | |
| 1.5 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação | m | 96,00 | 484,69 | 46.530,24 | |
| 1.6 | B.L. Simples com tubo de concreto ø400mm na vertical, caixa superficial em bloco de concreto tipo canaleta, preenchido com concreto, pisos e vedações em concreto, com colocação de grelha metélica, conf projeto | un | 65,00 | 1.614,99 | 104.974,35 | |
| 2 | ADITIVO - MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 2.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | m | 463,42 | 46,98 | 21.771,47 | |
| 2.2 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | und | 75,00 | 549,12 | 41.184,00 | |
| 2.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 62,40 | 0,37 | 23,09 | |
| 2.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 0,03 | 5.527,35 | 165,82 | |
| 2.5 | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 1,50 | 302,90 | 454,35 | |
| 2.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 0,09 | 7.683,58 | 691,52 | |
| 2.7 | CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 3,00 | 302,90 | 908,70 | |
| 2.8 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 0,17 | 7.683,58 | 1.306,21 | |
| 2.9 | Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | und | 1,00 | 649,82 | 649,82 | |
| | | | | TOTAL | 521.891,18 | |

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2024.07.11 11:41:17-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

11-jul-24
Data

BDI 24,23%
(já incluso no orçamento)





Proc. Administrativo 1- 6.427/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 11/07/2024 às 15:33:28

Segue para análise e parecer.

—
Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 2- 6.427/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 12/07/2024 às 11:17:31

Setores envolvidos:

SA-DLC, SOVU-DEP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 156 - cp 25 - sam 59

Trata-se de solicitação de aditivo da meta física do Contrato nº 156/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 25/2022, por meio do qual o setor técnico argumenta que o aditivo se faz necessário devido "(...) aos serviços necessários de drenagem que foram executados durante a obra, e não estavam previstos no orçamento. Além disso, foi necessário acrescentar rampas para PNE nas calçadas, e uma placa de sinalização que não estavam previstos, mas são importantes para que a obra atinja sua finalidade. Foi necessário também a execução de um trecho de calçada em CBUQ, devido a condição da base existente, que não permitia a execução como estava no orçamento. Também foi necessário acrescentar a quantidade de meio-fio novo, pois em muitos casos não possível reaproveitar os existentes."

Pois bem.

Em relação ao aumento da meta física, o art. 65, I, a, da Lei 8.666/93, dispõe que:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;"

No caso em apreço, verifico que existe a necessidade da readequação dos valores constantes no contrato, visto que serão utilizados para complementação do objeto contratual, conforme solicitação do setor técnico.

Em tempo, deve ser observado o teor do art. 65, § 1º, o qual dispõe que "O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos."

Posto isso, esta Procuradoria Jurídica manifesta-se favoravelmente ao aumento da meta física no valor de R\$ 521.891,18.

Este é o parecer.

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313



Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelivida.1doc.com.br/verificacao/1E43-73C3-0795-184D> e informe o código 1E43-73C3-0795-184D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E43-73C3-0795-184D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 12/07/2024 11:17:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvvida.1doc.com.br/verificacao/1E43-73C3-0795-184D>

Proc. Administrativo 3- 6.427/2024



De: Iana S. - SA-DLC

Para: SF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 12/07/2024 às 15:47:01

Segue para indicação orçamentária.

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 4- 6.427/2024



De: Ricardo R. - SF-DC

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 17/07/2024 às 11:48:09

Bom dia, segue para análise.

Att.

—
Ricardo Ruschel

Proc. Administrativo 5- 6.427/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 13:27:34

Setores (CC):

GP

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 156 - cp 25 - sam 59

Segue o parecer jurídico.

Anexos:

Parecer_prazo_expirado_nulidade_nao_pagamento_CP_25_2022.pdf



PARECER JURÍDICO

Trata-se de aditivo da meta física do Contrato nº 156/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 25/2022, no valor de R\$ 521.891,18, referente "(...) aos serviços necessários de drenagem que foram executados durante a obra, e não estavam previstos no orçamento. Além disso, foi necessário acrescentar rampas para PNE nas calçadas, e uma placa de sinalização que não estavam previstos, mas são importantes para que a obra atinja sua finalidade. Foi necessário também a execução de um trecho de calçada em CBUQ, devido a condição da base existente, que não permitia a execução como estava no orçamento. Também foi necessário acrescentar a quantidade de meio-fio novo, pois em muitos casos não possível reaproveitar os existentes."

Após a confecção de parecer jurídico pela possibilidade da realização do aditivo, o Departamento de Contabilidade encaminhou o pedido novamente para análise, sendo que houve o repasse de informações até então desconhecidas por esta Procuradoria Jurídica.

Pois bem.

Após detida análise do pedido, contrato e demais aditivos, verifica-se que o prazo de execução da obra se encerrou na data de 18/12/2023, conforme se retira do Aditivo nº 02, sendo que não houveram mais pedidos nesse sentido. De outro lado, o prazo final da vigência do contrato data de 13/10/2024.

Desse modo, torna-se ilegal a realização de aditivo da meta física após findo o prazo de execução do objeto inicial, pois ocorreu a consumação total do objeto licitado, em que pese o instrumento estar com o prazo de vigência em dia.

Acerca disso, a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Assim sendo, esta Procuradoria Jurídica retifica o parecer jurídico anterior para o fim de opinar pelo indeferimento do pedido formulado, haja vista o término do prazo de execução do objeto, o que torna inviável a formalização de novo aditivo.

Em tempo, necessário se faz consignar que também resta inviabilizada a realização do pagamento dos serviços realizados sem o aditivo contratual, seja pelos meios ordinários, seja por meio de termo de reconhecimento de dívida.

Como inexistente aditivo, tampouco a medição dos serviços que foram executados sem cobertura contratual, não há como empenhar tais valores pelo Departamento de Contabilidade.

Da mesma forma, tem-se que o reconhecimento de dívida pela Administração Pública, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.666/1993, somente pode ser realizado em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso. Isso se dá pelo fato do pedido de aditivo ter sido realizado na data de 11/07/2024, ou seja, quase seis meses após o término do prazo de execução do objeto inicial.

Ademais, para que o ente possa reconhecer uma dívida deve restar presente a boa-fé, o que não se verifica no presente caso, visto que a empresa contratada assumiu o risco de executar a obra sem a cobertura contratual. Ainda, também é de conhecimento desta Procuradoria Jurídica que a exceção vem tornando-se a regra, ou seja, sempre que



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



existe execução de serviço sem instrumento válido, busca-se a realização de reconhecimento de dívida.

Portanto, a contratada, caso entenda necessário, pode buscar a via judicial para a cobrança dos serviços que entende que foram executados e não pagos pela Administração Pública em tempo e modo adequados.

Este é o parecer.

Coronel Vivida-PR, 18 de julho de 2024.

Daniel Proença Larsson
OAB/PR nº 90.028
Procurador Jurídico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5950-38D3-0006-42FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 18/07/2024 13:28:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/5950-38D3-0006-42FD>



Proc. Administrativo (Nota interna 18/07/2024 13:59) 6.427/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 13:59:22

Considerando o contido no parecer jurídico, arquivamos o pedido encerrando o mesmo.

Jean Felipe Micoanski - SOVU-DEP

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos



De: Jean M. - SOVU-DEP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2024 às 15:17:37

Olá prezados, boa tarde

Gostaríamos de solicitar a reanálise do pedido, e o possível pagamento dos valores pendentes à empresa, considerando o ofício, relatório fotográfico, o diário de obras e e-mail do paranacidade em anexo.

Atenciosamente,

—

Jean Felipe Miecowski
Divisão de Estudos e Projetos

Anexos:

06_JUNHO_2023_ASSINADO_2_.pdf
07_JULHO_2023_ASSINADO_1_.pdf
08_AGOSTO_2023_ASSINADO_1_.pdf
09_SETEMBRO_2023_ASSINADO_1_.pdf
09_SETEMBRO_2023_ASSINADO_1__assinado_assinado.pdf
10_OUTRUBRO_2023_1_.pdf
11_NOVEMBRO_2023_VISTA_ALEGRE_ASSINADO.pdf
12_DEZEMBRO_2023_VISTA_ALEGRE_ASSINADO.pdf
DIARIO_DE_OBRAS_BM_02.pdf
DIARIO_DE_OBRAS_VISTA_ALEGRE_06_05_2023_ASSINADO.pdf
Re__Orientacao_aditivos.pdf
_OFICIO_ENG_com_foto.pdf



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|--------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 01/06/2023 | Pág. 160 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 160 | Prazo Restante: | 20 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| Drenagem | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Visto Fiscalização: | | | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | | | Data | |



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 02/06/2023 | Pág. | 161 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 161 | Prazo Restante: | 19 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem

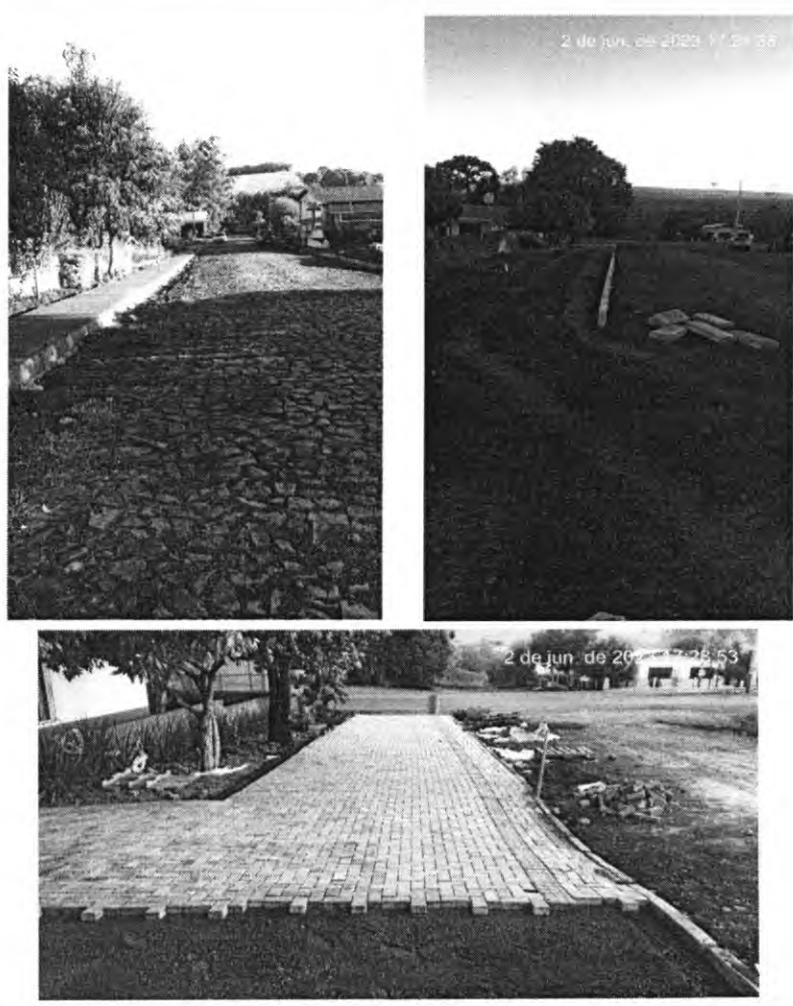

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 03/06/2023 | Pág. 162 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 03/06/2023 | sábado | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 162 | Prazo Restante: | 18 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 04/06/2023 | Pág. 163 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 163 | Prazo Restante: | 17 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|---------|-------------|------------|--------|-----------|--|--------|
| | | Engenheiro | | 1 | | |
| | Encarregado | | 1 | | | |
| | Operador | | 4 | | | |
| | Servente | | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|---------------------|--------------------------------------|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 05/06/2023 | Pág. | 164 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 164 | Prazo Restante: | 16 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: 06/06/2023 | | Pág. 165 | |
| Resp. Técnico | | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | |
| Obra : | | CONTRATO 156/2022 | | Tempo | | Seco | Chuva Operacional |
| Local: | | Município de Coronel Vivida | | Manhã | | X | Chuva Não Operacional |
| Prazo Decorrido: | | 165 | Prazo Restante: | | 15 | Tarde | X |
| Prazo da Obra | | | 180 dias | | | Noite | X |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | |
|----------------|------------------|--|---------------|--|
| | | | | |
| | Engenheiro | | 1 | |
| | Encarregado | | 1 | |
| | Operador | | 4 | |
| | Servente | | 6 | |

Serviços

Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores
Retirada e recolocação de meio-fio
Aterro e regularização para calçadas
Execução de calçadas
Drenagem

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|----------------------------|--|--------------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 07/06/2023 | Pág. 166 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 166 | Prazo Restante: | 14 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

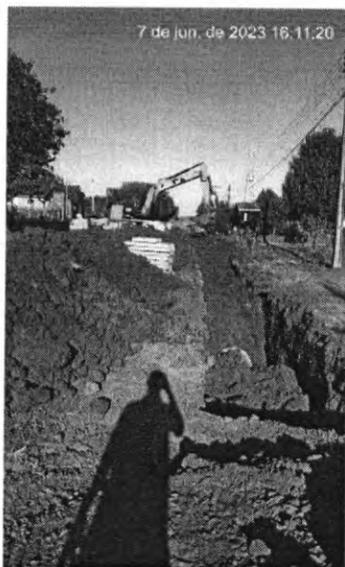

Visto Fiscalização: _____ Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI Data: _____



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 08/06/2023 | Pág. | 167 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 167 | Prazo Restante: | 13 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|----------------------------|--|--------------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 09/06/2023 | Pág. | 168 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 168 | Prazo Restante: | 12 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 10/06/2023 | Pág. 169 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 169 | Prazo Restante: | 11 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |


| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 11/06/2023 | Pág. | 170 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 170 | Prazo Restante: | 10 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <u>RODRIGO SILIPRANDI</u> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 12/06/2023 | Pág. | 171 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 171 | Prazo Restante: | 9 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/06/2023 | Pág. 172 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 172 | Prazo Restante: | 8 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|-------------|------------|---|--------|-----------|--|--------|
| | Engenheiro | | 1 | | | |
| Encarregado | | 1 | | | | |
| Operador | | 4 | | | | |
| Servente | | 6 | | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|---------------------|---|-------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/06/2023 | Pág. 173 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | X | |
| Prazo Decorrido: | 173 | Prazo Restante: | 7 | Tarde | | X | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | | X | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|
| Serviços | Limpeza das Ruas | | | |
| | | | | |



Visto Fiscalização:

Visto Contratada: *RODRIGO SILIPRANDI*

Data

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 15/06/2023 | Pág. 174 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Sillprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | X | |
| Prazo Decorrido: | 174 | Prazo Restante: | 6 | Tarde | | X | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | | X | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|------------------|--|--|
| Serviços | Limpeza das Ruas | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 16/06/2023 | Pág. 175 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 175 | Prazo Restante: | 5 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | |
|----------|------------------|--|
| Serviços | Limpeza das Ruas | |
| | | |
| | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 17/06/2023 | Pág. | 176 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 176 | Prazo Restante: | 4 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|---------|-------------|------------|--------|-----------|--|--------|
| | | Engenheiro | | 1 | | |
| | Encarregado | | 1 | | | |
| | Operador | | 4 | | | |
| | Servente | | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-----------------------|------|-------------------|-----------------------|--|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 18/06/2023 domingo | | Pág. | 177 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | | | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional | |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | | Manhã | | | X | |
| Prazo Decorrido: | 177 | Prazo Restante: | 3 | | Tarde | | | X | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | | | X | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|---------|-------------|------------|--------|-----------|--|--------|
| | | Engenheiro | 1 | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | |
| | Operador | 4 | | | | |
| | Servente | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 19/06/2023 | Pág. | 178 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 178 | Prazo Restante: | 2 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|------|---------|-------------|------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 20/06/2023 | Pág. | 179 |
| Resp. Técnico | | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | | Manhã | X | Chuva Não Operacional |
| Prazo Decorrido: | 179 | Prazo Restante: | 1 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-----------|-------------|-----------|--|
| | Quant. | | Quant. | |
| | 1 | Engenheiro | | |
| | 1 | Encarregado | | |
| | 4 | Operador | | |
| | 6 | Servente | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e reposição de meio-fio | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | |
| | Execução de calçadas | | |
| Drenagem | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/06/2023 | Pág. 180 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 180 | Prazo Restante: | 0 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 22/06/2023 | Pág. | 181 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 181 | Prazo Restante: | 119 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | |
| | Execução de calçadas | | | |
| | Drenagem | | | |



| | | |
|---------------------|---|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|---------------------|---|-------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 23/06/2023 | Pág. | 182 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 182 | Prazo Restante: | 118 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| | Drenagem | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|----------------------------|---|--------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 24/06/2023 | Pág. 183 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 183 | Prazo Restante: | 117 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|-------------|------------|---|--------|-----------|--|--------|
| | Engenheiro | | 1 | | | |
| Encarregado | | 1 | | | | |
| Operador | | 4 | | | | |
| Servente | | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|---------------------|--------------------------------------|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/06/2023 | Pág. | 184 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 184 | Prazo Restante: | 116 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 26/06/2023 | Pág. | 185 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 185 | Prazo Restante: | 115 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem



Visto Fiscalização: _____ **Visto Contratada:** *RODRIGO SILIPRANDI* **Data:** _____

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 27/06/2023 | Pág. | 186 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 186 | Prazo Restante: | 114 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 28/06/2023 | Pág. | 187 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 187 | Prazo Restante: | 113 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 29/06/2023 | Pág. | 188 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 188 | Prazo Restante: | 112 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores Retirada e recolocação de meio-fio Aterro e regularização para calçadas Execução de calçadas Drenagem | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/06/2023 | Pág. | 189 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 189 | Prazo Restante: | 111 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------------|---|--|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | ASSINADO de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2023.09.04 16:10:36 -03'00' | Data |
|---------------------|---|--|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 01/07/2023 | Pág. | 190 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 190 | Prazo Restante: | 110 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|---|-------------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 02/07/2023 | Pág. | 191 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 191 | Prazo Restante: | 109 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 03/07/2023 | Pág. | 192 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 192 | Prazo Restante: | 108 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 04/07/2023 | Pág. | 193 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 193 | Prazo Restante: | 107 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 05/07/2023 | Pág. 194 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 194 | Prazo Restante: | 106 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 06/07/2023 | Pág. 195 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 195 | Prazo Restante: | 105 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|---------------------|---|-------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 07/07/2023 | Pág. | 196 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 196 | Prazo Restante: | 104 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 08/07/2023 | Pág. | 197 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 197 | Prazo Restante: | 103 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 09/07/2023 | Pág. | 198 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 198 | Prazo Restante: | 102 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 10/07/2023 | Pág. | 199 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 199 | Prazo Restante: | 101 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 11/07/2023 | Pág. | 200 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 200 | Prazo Restante: | 100 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 12/07/2023 | Pág. | 201 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 201 | Prazo Restante: | 99 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/07/2023 | Pág. 202 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 202 | Prazo Restante: | 98 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/07/2023 | Pág. | 203 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 203 | Prazo Restante: | 97 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 15/07/2023 | Pág. | 204 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 204 | Prazo Restante: | 96 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 16/07/2023 | Pág. 205 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 205 | Prazo Restante: | 95 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|-------------|------------|---|--------|-----------|--|--------|
| | Engenheiro | | 1 | | | |
| Encarregado | | 1 | | | | |
| Operador | | 4 | | | | |
| Servente | | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 17/07/2023 | Pág. | 206 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 206 | Prazo Restante: | 94 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 18/07/2023 | Pág. | 207 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 207 | Prazo Restante: | 93 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

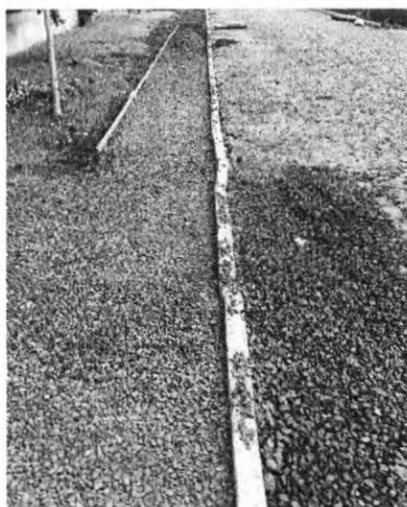

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 19/07/2023 | Pág. 208 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 208 | Prazo Restante: | 92 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/07/2023 | Pág. | 210 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 210 | Prazo Restante: | 90 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 22/07/2023 | Pág. 211 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 211 | Prazo Restante: | 89 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|---------|-------------|------------|--------|-----------|--|--------|
| | | Engenheiro | | 1 | | |
| | Encarregado | | 1 | | | |
| | Operador | | 4 | | | |
| | Servente | | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|---------------------|---|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 23/07/2023 | Pág. | 212 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 212 | Prazo Restante: | 88 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|---------------------|---|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 24/07/2023 | Pág. 213 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 213 | Prazo Restante: | 87 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|---------------------|---|------|




DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/07/2023 | Pág. | 214 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 214 | Prazo Restante: | 86 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

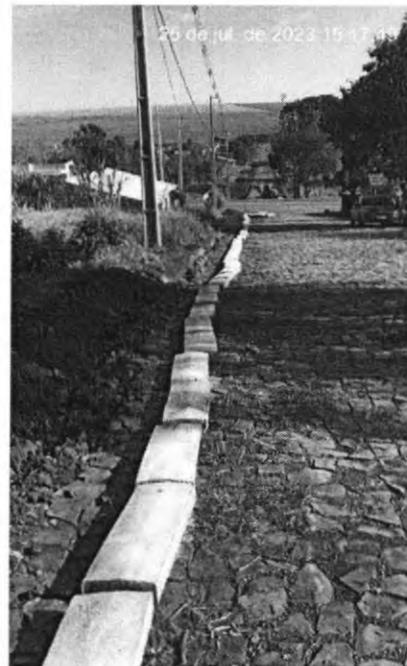

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|---------------------|--------------------------------------|-------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 26/07/2023 | Pág. | 215 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 26/07/2023 | | 215 |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 215 | Prazo Restante: | 85 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



Visto Fiscalização:

Visto Contratada: *RODRIGO SILIPRANDI*

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 28/07/2023 | Pág. | 217 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 28/07/2023 | sexta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 217 | Prazo Restante: | 83 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 | dias | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data: |
|----------------------------|--|--------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: 29/07/2023 | Pág. 218 | | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | sábado | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 218 | Prazo Restante: | 82 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | | Quant. | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|----------------------------|---|--------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/07/2023 | Pág. | 219 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 219 | Prazo Restante: | 81 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|--------------------------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 31/07/2023 | Pág. | 220 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 220 | Prazo Restante: | 80 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem

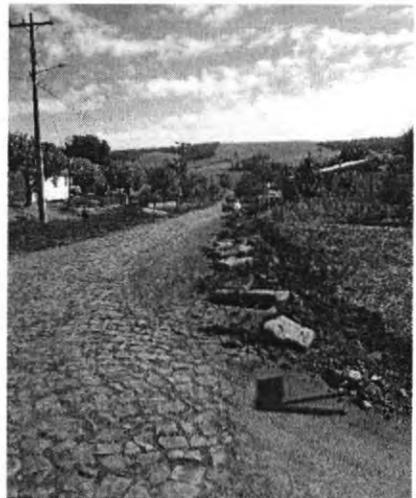

| | | | |
|---------------------|--|--|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2023.09.04 16:14:27 -03'00' | Data |
|---------------------|--|--|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA


| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 01/08/2023 | Pág. 221 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 221 | Prazo Restante: | 79 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| Serviços | Descrição | Quant. |
|----------|---|--------|
| | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | |
| | Aterro e regularização para calçadas | |
| | Execução de calçadas | |
| Drenagem | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|--|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada:  | Data: |
|---------------------|--|-------|

DocuSigned by:

D13D5C21EB26497...



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 02/08/2023 | Pág. | 222 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 02/08/2023 | | |
| | | | | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 222 | Prazo Restante: | 78 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------|------------------|---------------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | |
| | Execução de calçadas | | | |
| Drenagem | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 03/08/2023 | Pág. | 223 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 223 | Prazo Restante: | 77 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 04/08/2023 | Pág. | 224 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 04/08/2023 | | 224 |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva | Chuva |
| | | | | | | Operacional | Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 224 | Prazo Restante: | 76 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 05/08/2023 | Pág. | 225 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 225 | Prazo Restante: | 75 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Visto Fiscalização: | | | | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data | |



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 06/08/2023 | Pág. | 226 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 226 | Prazo Restante: | 74 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | |
|----------|--|--|
| Serviços | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



**Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras**


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 07/08/2023 | Pág. | 227 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 07/08/2023 | | 227 |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | X | |
| Prazo Decorrido: | 227 | Prazo Restante: | 73 | Tarde | | X | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | X | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

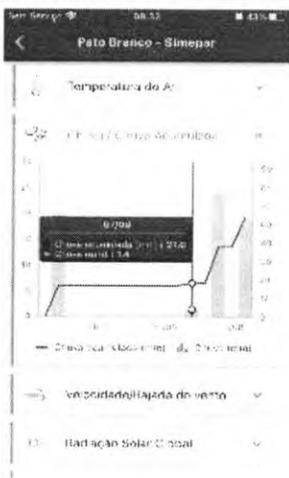

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 08/08/2023 | Pág. | 228 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 228 | Prazo Restante: | 72 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 09/08/2023 | Pág. | 229 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Silliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 229 | Prazo Restante: | 71 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

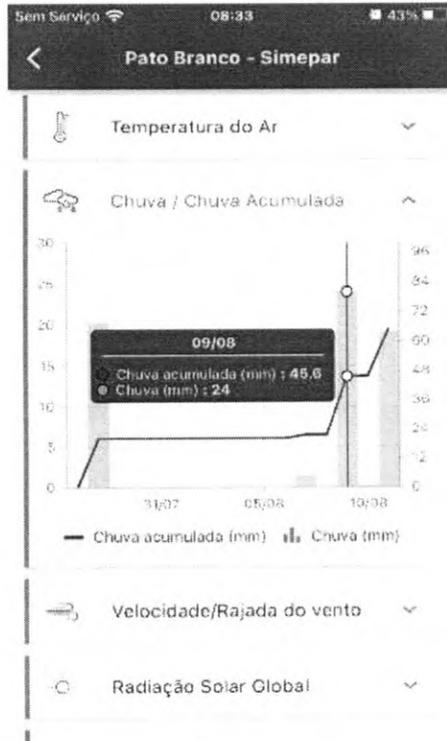

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILLIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|--|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 10/08/2023 | Pág. | 230 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 230 | Prazo Restante: | 70 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

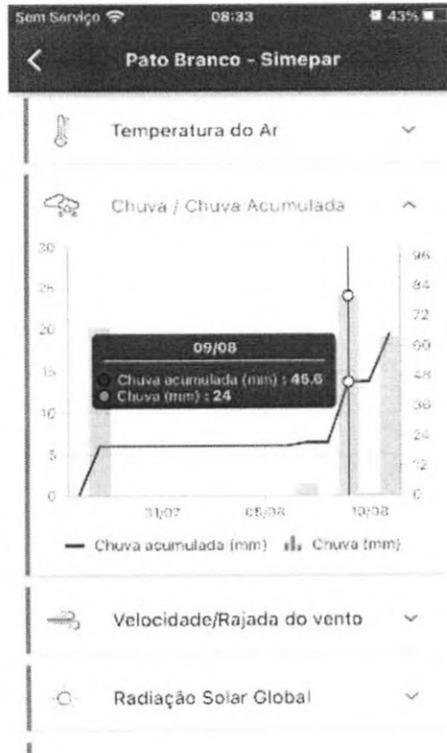

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 11/08/2023 | Pág. | 231 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 11/08/2023 | | 231 |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 231 | Prazo Restante: | 69 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e reposição de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem

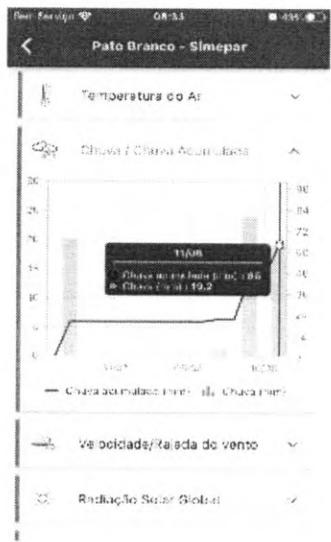

Visto Fiscalização: _____ **Visto Contratada:** RODRIGO SILIPRANDI **Data:** _____



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 12/08/2023 | Pág. | 232 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 232 | Prazo Restante: | 68 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/08/2023 | Pág. | 233 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 233 | Prazo Restante: | 67 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DocuSigned by:

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|----------------------------|---|--------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/08/2023 | Pág. | 234 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 234 | Prazo Restante: | 66 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 15/08/2023 | Pág. | | 235 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional | |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | | |
| Prazo Decorrido: | 235 | Prazo Restante: | 65 | Tarde | X | | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | | |
| Equipam. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | | |
| | Drenagem | | | | | | | |

DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 16/08/2023 | Pág. | 236 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 16/08/2023 | quarta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 236 | Prazo Restante: | 64 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores Retirada e recolocação de meio-fio Aterro e regularização para calçadas Execução de calçadas Drenagem | | | | | | |

DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 17/08/2023 | Pág. | 237 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 17/08/2023 | | 237 |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 237 | Prazo Restante: | 63 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 18/08/2023 | Pág. | 238 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 238 | Prazo Restante: | 62 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|----------------------------|---|--------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA


| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 19/08/2023 | Pág. | 239 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 239 | Prazo Restante: | 61 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: |  RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 20/08/2023 | Pág. | 240 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 240 | Prazo Restante: | 60 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/08/2023 | Pág. | 241 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 241 | Prazo Restante: | 59 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------|------------------|---------------|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | |
| | Retirada e reposição de meio-fio | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | |
| | Execução de calçadas | | | |
| | Drenagem | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
| | RODRIGO SILIPRANDI | |



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 22/08/2023 | Pág. | 242 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 242 | Prazo Restante: | 58 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 23/08/2023 | Pág. | 243 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 243 | Prazo Restante: | 57 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 24/08/2023 | Pág. | 244 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 244 | Prazo Restante: | 56 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Assinado by: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/08/2023 | Pág. | 245 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 245 | Prazo Restante: | 55 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| Drenagem | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | <i>RODRIGO SILIPRANDI</i> | Data |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 26/08/2023 | Pág. | 246 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 246 | Prazo Restante: | 54 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|---------------------|-------------------|---|-------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 27/08/2023 | Pág. | 247 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 247 | Prazo Restante: | 53 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------|-----------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 28/08/2023 | Pág. | 248 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 248 | Prazo Restante: | 52 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. | |
| | Engenheiro | | 1 | | | | |
| | Encarregado | | 1 | | | | |
| | Operador | | 4 | | | | |
| | Servente | | 6 | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| | Drenagem | | | | | | |

DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 29/08/2023 | Pág. | 249 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 249 | Prazo Restante: | 51 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/08/2023 | Pág. | 250 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 30/08/2023 | quarta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 250 | Prazo Restante: | 50 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 31/08/2023 | Pág. | 251 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 251 | Prazo Restante: | 49 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-----------|--|-----------|--|
| | Quant. | | Quant. | |
| | 1 | | | |
| | 1 | | | |
| | 4 | | | |
| | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

Visto Fiscalização:

Visto Contratada: RODRIGO

SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2023.09.04 12:02:54 -03'00'

Data

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 05/09/2023 | Pág. | 256 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 256 | Prazo Restante: | 44 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 DN: C=BR, O=CPF Brasil, OU=AC SOLUTI Munique v5, OU=34787814008110, OU=Personal, CN=Rodrigo Siliprandi
 Razão: motivo de sua assinatura não
 Localizado: sua assinatura de assinatura não
 Data: 2023.09.05 15:41:16 -0500
 Fonte: PDF Reader Versão: 3023.0.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 08/09/2023 | Pág. | 259 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 08/09/2023 | sexta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 259 | Prazo Restante: | 41 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 NO: 63830299915, CN: Rodrigo Siliprandi, OU: Coronel Vivida - PR, C=BR
 Assinatura: OU=Coronela Vivida, CN=Rodrigo Siliprandi:63830299915
 Hash: md5 da assinatura: 8041...
 Data: 2023.09.08 15:41:18-0500
 Total PDF: 2023.09.08 15:41:18-0500

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
 Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 11/09/2023 | Pág. | 262 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 262 | Prazo Restante: | 38 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



RODRIGO
 SILIPRANDI:63830299915

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 12/09/2023 | Pág. | 263 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 263 | Prazo Restante: | 37 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | |
|----------|--|--|
| Equipam. | | |
| | | |
| | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

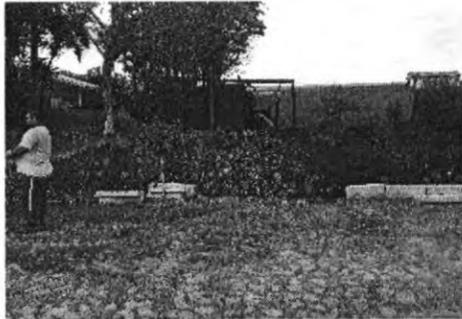

RODRIGO
 SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Nº 0-00, 0-00-CP Singel. DU-AC SOLUTI Multiss v8. DU-347878 4000110 DU
 ePresente: DU-Contratos PP. 03. DU-RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Razão: motivo de sua assinatura eletr
 Localidade: sua localidade de assinatura eletr
 Data: 2023.09.08 15:41:18-2700
 Font: PDF Reader Versão: 2023.0.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/09/2023 | Pág. | 264 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 264 | Prazo Restante: | 36 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

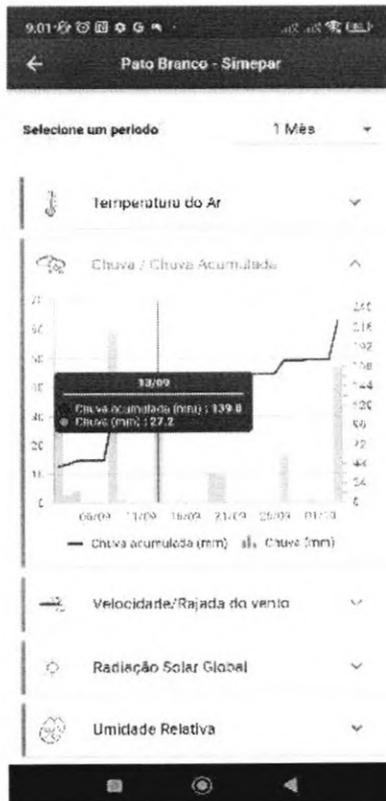

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Asturado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 NO: C=BR, O=CPF Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v1, DN=24797814000110, OU
 =Presencial, CN=Rodrigo FF de CHURRODRO SILIPRANDI:63830299915
 Razão: motivo da sua assinatura aqui
 Localidade: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.09.08 15:41:18 -0300
 Font: PDF Reader Versão: 2023.0.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/09/2023 | Pág. | 265 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 14/09/2023 | quinta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 265 | Prazo Restante: | 35 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado em: 14/09/2023
 402 Cert. D-U-CP-Brasil, CN=AC SOLUPI Matéria-VL, OU=CA/179114000110, OU=Preparação, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO SILIPRANDI/63830299915
 Feito no sistema de assinatura digital
 Localização: sua localização de assinatura não é conhecida
 Data: 2023.09.14 16:31:02
 Versão PDF: Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 20/09/2023 | Pág. | 271 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 20/09/2023 | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 271 | Prazo Restante: | 29 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

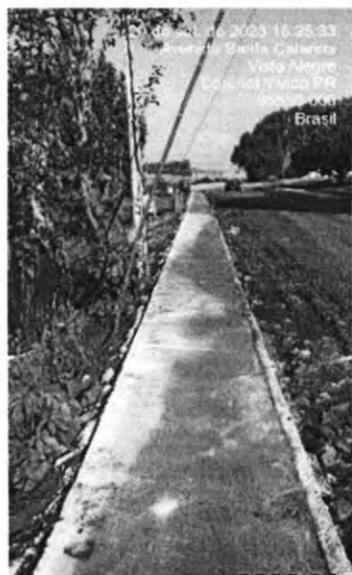

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Aprovado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 DN: C=BR, O=CIP Brasil, OU=SEI, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915, OU=Assinatura
 -Proprietor: DN=Certificado PF AZ, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Postal: e-mail de sua assinatura: ror
 Localização: sua localização de assinatura: ror
 Data: 2023.09.08 15:41:15 -0300
 Post-PCF Reader Versão: 2023.2.2

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/09/2023 | Pág. | 272 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 21/09/2023 | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | | |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 272 | Prazo Restante: | 28 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Assentamento de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual Lavação das ruas |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
RG: 24.048.504-0/PR - CPF: 034.934.714-5 - CNPJ: 07.911.400/11-01
- Profissional: OAB-Caridade PF AD. CN: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
- Título: registro de sua assinatura ecp
- Emissão: 2023-09-21 15:11:15-0278
- Fonte PDF Reader: versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 22/09/2023 | Pág. | 273 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 22/09/2023 | sexta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 273 | Prazo Restante: | 27 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Assentamento de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual Lavação das ruas |

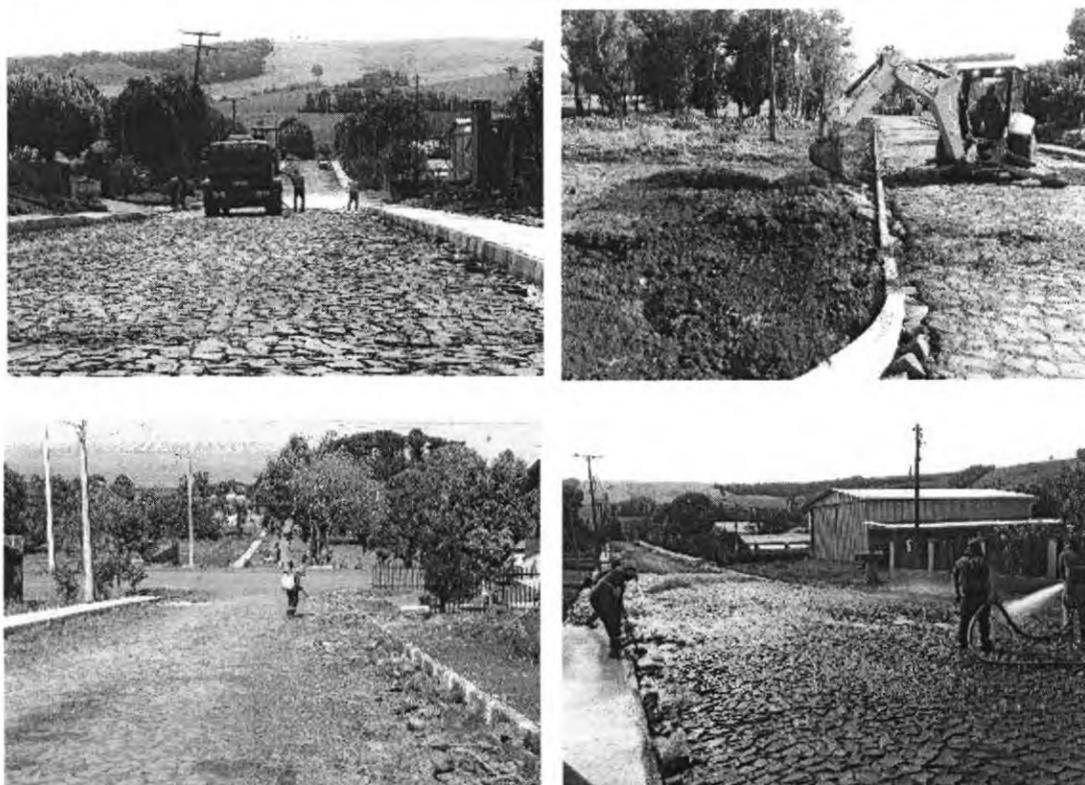

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI 63830299915
162 - CPF: 04071888-0 - CNPJ: 08.000.000/0001-10 - CNAE: 23.91-3/01
Assinatura: Du-Cartão: PF AS - CN: RODRIGO SILIPRANDI-63830299915
Todos os dados de sua assinatura são
certificados: sua certificação de assinatura não
vence 2023-09-19 18:07:00
Tipo PDF Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|--|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: 23/09/2023 | Pág. 274 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | sábado | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco Chuva Operacional Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X |
| Prazo Decorrido: | 274 | Prazo Restante: | 26 | Tarde | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Assentamento de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Dessecação, limpeza manual
 Lavação das ruas

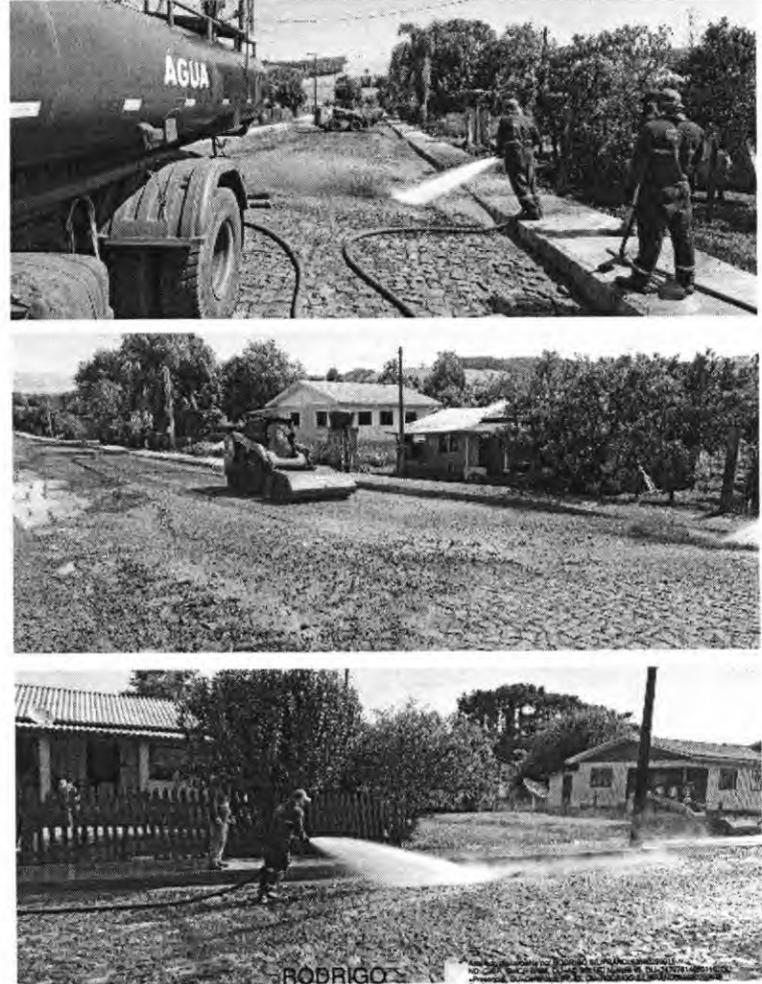

RODRIGO
 SILIPRANDI:63830299915

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|----------------------------|--------------------------|-------------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/09/2023 | Pág. | 276 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 276 | Prazo Restante: | 24 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|----------------------------|
| Serviços | Assentamento de meio-fio |
| | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual |
| | Lavação das ruas |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SCLUTI MUIPA vs. OU=347814000113, OU=Proteron, OU=Certificado PF AE, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Pedido enviado da sua assinatura e-pp
Assinatura: sua assinatura de assinatura e-pp
Data: 2023.09.25 15:41:16-0200
Versão PDF: Proteron Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 26/09/2023 | Pág. | 277 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 277 | Prazo Restante: | 23 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 7 | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|----------------------------|
| Serviços | Assentamento de meio-fio |
| | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual |
| | Lavação das ruas |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Aprovado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
15/09/2023 10:08:15
Assinatura: O=C=Rodrigo Siliprandi, O=Município de Coronel Vivida, CN=Rodrigo Siliprandi:63830299915
Fecha: 2023.09.26 10:08:15
Fonte PDF: Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 27/09/2023 | Pág. | 278 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 278 | Prazo Restante: | 22 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|
| Serviços | Execução de calçadas | | |
| | Dessecação, limpeza manual | | |
| | Lavação das ruas | | |
| | Execução de base sobre tubulação | | |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
No Dia: 2023.09.27 às 15:41:18 (UTC-03:00) em
Procedimento: OJ-Certificado PF Ass. Dig-RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Poder: motivo de sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.09.27 15:41:18 -03:00
Poder PDF Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 29/09/2023 | Pág. | 280 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 280 | Prazo Restante: | 20 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|
| Serviços | Dessecação, limpeza manual | | |
| | Lavação das ruas | | |
| | Execução de base sobre tubulação | | |
| | Nivelamento da pista com BGS | | |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Aprovado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Nº: C-889, D-107-8888, D-1040, S-04771-Mulheres v.8, D-24-78781-4000115, D-1
 -Prestador: D-1040-8888 PF S/AZ, D-1040-RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Data: 2023.10.06 15:41:18 -0300
 Padrão PDF Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/09/2023 | Pág. | 281 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 281 | Prazo Restante: | 19 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|----------------------------------|
| Serviços | Dessecação, limpeza manual |
| | Lavação das ruas |
| | Execução de base sobre tubulação |
| | Nivelamento da pista com BGS |



RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Nº: 04/8 - Du-CP-Bras - Du-AC-SOLU71-Mulheres vs. Du-34778-4000110 - Du
 -Preseleção - Du-Certificado PP AD - Du-RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Assinado: motivo de sua assinatura não
 certificado sua identidade de assinatura epp
 Data: 2023.10.06 15:41:19 -0300
 File: PDF Reader Versão: 2023.0.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 05/09/2023 | Pág. | 256 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 256 | Prazo Restante: | 44 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
|----------|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Nº Cert. D-U-CP-Brasil: 00440304711000110, OU
 Apresentação: D-U-Certificado: PF-A3, OU:RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Assinatura: mesmo de sua assinatura aqui
 C: Certificação em conformidade de assinatura aqui
 Data: 2023.10.08 15:41:19:0202
 Padrão PDF Reader Versão: 2002.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 08/09/2023 | Pág. | 259 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 259 | Prazo Restante: | 41 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços

Limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem

9:00

Pato Branco - Simepar

Selecione um período 1 Mês

Temperatura do Ar

Chuva / Chuva Acumulada

06/09 11/09 16/09 21/09 26/09 01/10

— Chuva acumulada (mm) | Chuva (mm)

Velocidade/Rajada do vento

Radiação Solar Global

Umidade Relativa

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
 Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Aterro regularizado por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 ND: C-8R, C-CP-8rgr, C-U-AC, S-CLUT1, M-8rgr, V-8, C-U-34797814000110, C-U
 #Presença: C-U-Certificado PF 83, C-U-RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 #Ratão: mofo de sua assinatura esp
 Localizador: sua localização de assinatura esp
 Data: 2023-09-08 10:41:16-0200
 Font: PDF Reader Versão: 2023.0.0

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|----------------------------|--------------------------|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 11/09/2023 | Pág. | 262 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 11/09/2023 | | |
| | | | | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 262 | Prazo Restante: | 38 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem




JEAN FELIPE
 MIECOANSKI:
 08136345988
 Coronel Vivida - PR

RODRIGO
 SILIPRANDI:63830299915

Prova: 11/09/2023 16:52:00
 Nome: RODRIGO SILIPRANDI
 Data: 2023-09-11 16:52:00
 Font: PDF Reader Versão: 2023.0.0

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|----------------------------|--------------------------|-------------|




DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 12/09/2023 | Pág. | 263 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 263 | Prazo Restante: | 37 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

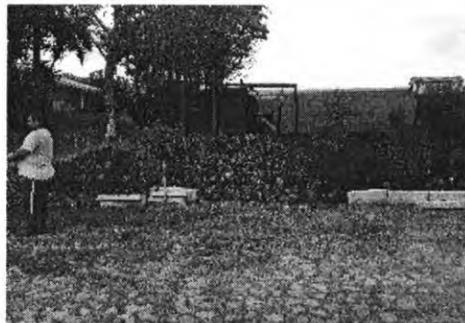

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND: CN=RD, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTUM Multipia v6, OU=34787814000115, OU=SP-Brasil, OU=Certificado PP AL, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Resíduo: motivo de sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.08 15:41:15 -03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/09/2023 | Pág. | 264 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 264 | Prazo Restante: | 36 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

Pato Branco - Simepar

Selecione um período: 1 Mês

Temperatura do Ar

Chuva / Chuva Acumulada

13/09
 Chuva acumulada (mm): 139.0
 Chuva (mm): 127.2

Velocidade/Rajada do vento

Radiação Solar Global

Umidade Relativa

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Autorizado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Nº: 0288, Doc: CP Brasil, Doc: AC SOLUTI Munique v6, Doc: 04787814000110, DU
 e-Identific: Doc: Certificado PP AS, Doc: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Razão: motivo de sua assinatura aqui
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.09.08 15:41:18 -0200
 Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/09/2023 | Pág. | 265 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 265 | Prazo Restante: | 35 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
|----------|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado em: 14/09/2023
 Nº: 0408, 04-CP-Brasil, 04-AC-SCALTI-Mulher vs. 04-34767814000110, 04
 -Pessoa: 04-Certidão PF AL CHACARRAO SILIPRANDI30299915
 Razão: motivo de sua assinatura não
 Localizado sua assinatura de assinatura.pdf
 Data: 2023-10-06 18:41:18-03707
 Fonte PDF Reader: Versão: 2023.0.1

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 20/09/2023 | Pág. | 271 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 20/09/2023 | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 271 | Prazo Restante: | 29 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Nº do Cad. D.U.C.P. Brasil: 00-AC-SOL-171-Mun. v.5 - 00-24-7978-14000110 - Ou
 e-Registro: 00-AC-Certificado PF-43 - 00-AC-RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Pacote: motivo de sua assinatura.asp
 Certificação: sua assinatura na assinatura.asp
 Data: 2023-09-20 18:41:18 -07:00
 Post PDF: Reader: Veritas: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/09/2023 | Pág. | 272 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 272 | Prazo Restante: | 28 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Assentamento de meio-fio | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | |
| | Execução de calçadas | | |
| | Dessecação, limpeza manual Lavação das ruas | | |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI.08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND: Cadei, D:\CP\Banco - D:\ACI SOLUTI\Banco e\CA\3475 1400110.DU
Assinatura: OJ-CORRIGIDO PF AD, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Feito: menos de 5 minutos atrás
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-09 15:41:18-0500
Fonte: PDF Reader Versão: 8023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 22/09/2023 | Pág. | 273 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 273 | Prazo Restante: | 27 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Assentamento de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual Lavação das ruas |

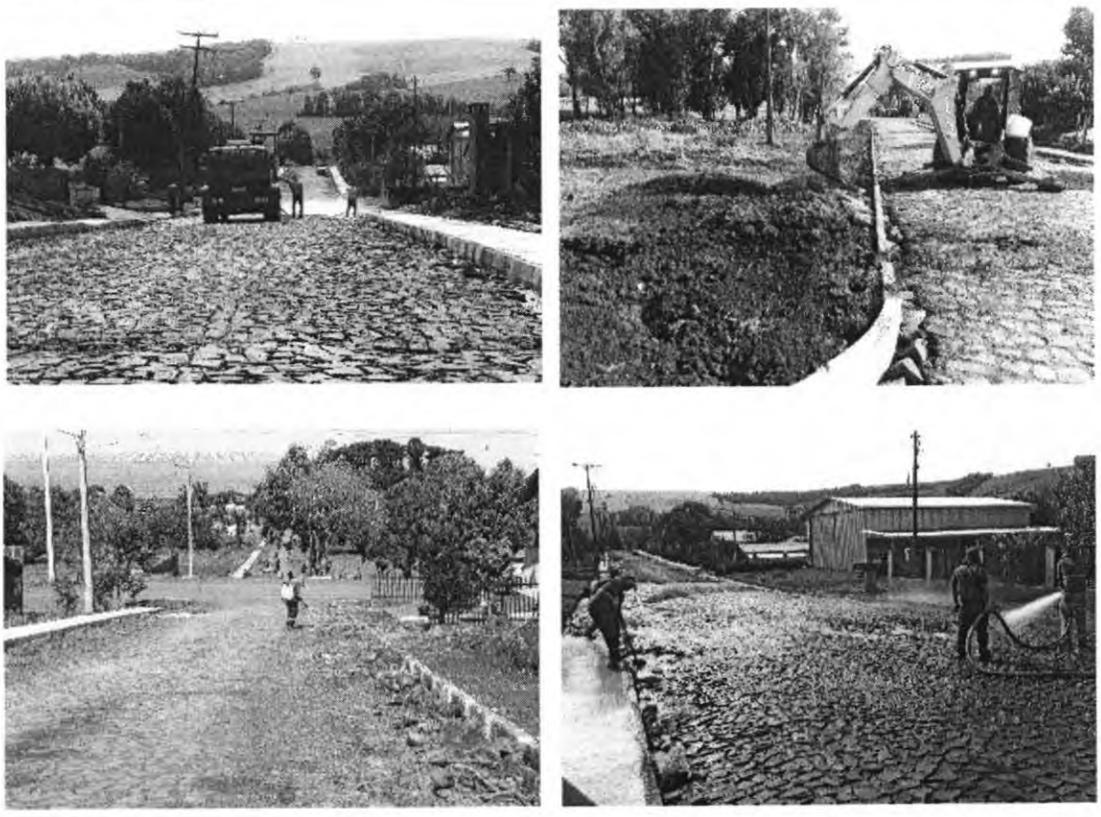

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
RG: 04381.000-0/BRASIL - OUVAC: 0001110.00 - OUVAC: 0001110.00
Assinatura: OUVAC: 0001110.00 - OUVAC: 0001110.00
Assinatura: OUVAC: 0001110.00 - OUVAC: 0001110.00
Data: 2023.09.22 15:41:15-0300
PDF Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 23/09/2023 | Pág. | 274 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 274 | Prazo Restante: | 26 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | |
|---------|-------------|--|--------|--|
| | | | | |
| | Engenheiro | | 1 | |
| | Encarregado | | 1 | |
| | Operador | | 4 | |
| | Servente | | 6 | |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Serviços | Assentamento de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual |
| | Lavação das ruas |



JEAN FELIPE
MIEGANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Este documento foi gerado pelo sistema de gerenciamento de obras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o setor de engenharia municipal. Data: 2023-09-26 15:41:16-2023.09-26. Revizor PDF: Versão: 2023.0.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/09/2023 | Pág. | 276 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 276 | Prazo Restante: | 24 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|----------------------------|
| Serviços | Assentamento de meio-fio |
| | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual |
| | Lavação das ruas |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
RD: CN=RD, O=CP-Brasil, OU=AC SOLTI MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, OU=24797814200110, OU=Secretaria de Engenharia e Obras, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Fecha: 2023.09.25 15:41:19-0202
Firma PDF: Reader Versão: 2023.2.2

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 26/09/2023 | Pág. | 277 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 277 | Prazo Restante: | 23 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Assentamento de meio-fio | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| | Dessecação, limpeza manual | | | | | | |
| | Lavação das ruas | | | | | | |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND 5484, DnCP-Brazil, DN:AC=SILIPRANDI, OU=Município de Coronel Vivida, O=Coronel Vivida, CN=Rodrigo Siliprandi
Fecha: 2023.09.26 15:41:18 (GMT)
Post PDF: Reader Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 27/09/2023 | Pág. | 278 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 278 | Prazo Restante: | 22 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|
| Serviços | Execução de calçadas | | |
| | Dessecação, limpeza manual | | |
| | Lavação das ruas | | |
| | Execução de base sobre tubulação | | |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
NO CadR. DUCP-Brazil. OJAC SOLUTI Munique v5. OJAC-797814000110. OJ
Assinado em: 27/09/2023 15:41:18-2302
Localização: Rua Imaculada de Assis, 150 - Coronel Vivida - PR
Data: 2023-09-27 15:41:18-2302
Tipo: PDF Assinado Versão: 2003.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 28/09/2023 | Pág. | 279 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 28/09/2023 | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 279 | Prazo Restante: | 21 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|----------------------------------|
| Serviços | Execução de calçadas |
| | Dessecação, limpeza manual |
| | Lavação das ruas |
| | Execução de base sobre tubulação |
| | Nivelamento da pista com BGS |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
RG: 0416110 - CPF: 03640104 - CNH: 0401110 - CN: 0401110 - OU: 0401110
- Presença: CN=Rodrigo Siliprandi:63830299915
- Posição: Diretor de Engenharia
- Localização: Rua da Liberdade, 100
- Data: 2023.10.08 15:11:16 -0300
- Versão: 2023.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 29/09/2023 | Pág. | 280 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 29/09/2023 | sexta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 280 | Prazo Restante: | 20 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|
| Serviços | Dessecação, limpeza manual | | |
| | Lavação das ruas | | |
| | Execução de base sobre tubulação | | |
| | Nivelamento da pista com BGS | | |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
NO CadeNet, CadeNet Brasil, CadeNet SOUTI Multigov v.6, CUI-34767814000110, CUI-34767814000110, CUI-34767814000110, CUI-34767814000110
Número: 63830299915
Razão: motivo de sua assinatura e/ou
Localizador: sua localização de assinatura e/ou
Data: 2023.09.29 15:41:18-22:00
Formato: PDF Reader Versão: 2023.3.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/09/2023 | Pág. | 281 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 281 | Prazo Restante: | 19 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|--|
| Serviços | Dessecação, limpeza manual | | | |
| | Lavação das ruas | | | |
| | Execução de base sobre tubulação | | | |
| | Nivelamento da pista com BGS | | | |



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Aterrido digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTUMuldas v.0, CN=3479194000116, OU
=Assinador, CN=Certificado PF de CHAFCORRADO DA PRANCO:63830299915
Papel: modelo de sua assinatura aqui
Localizado: sua assinatura de assinatura aqui
Data: 2023.10.06 15:41:18-02:00
Font: PDF Reader Versão: 2022.2.0

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 160

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|-------------|-----|----------------------|---------------|------------------|--|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2022 | DATA RDO: | 02/10/2023 - seg | |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-28455/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | PR-148918/D | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--|
| 1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA |
| 2. REGULARIZAÇÃO - NIVELAMENTO DA PISTA COM BASE (BGS) |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| <small>RODRIGO SILIPRANDI: 638302999</small> <small>15</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988</small> <small>Coronel Vivida - PR</small> JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 161

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 03/10/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 6 SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|---|
| 1. | LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA |
| 2. | REGULARIZAÇÃO - NIVELAMENTO DA PISTA COM BASE (BGS) |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI <small>RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15</small> 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08196345988</small> Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 162

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 04/10/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----|-----------------|-----|-----|--------|--|--|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | | OBRA PARALISADA | | | OUTRO: | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO | | | |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|---|
| 1. | LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA |
| 2. | REGULARIZAÇÃO - NIVELAMENTO DA PISTA COM BASE (BGS) |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15 <small>RODRIGO SILIPRANDI NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO RESPONSÁVEL TÉCNICO</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</small> |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 163

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 05/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | X | | |
| TARDE | | | X | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--|
| 1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA |
| 2. REGULARIZAÇÃO - NIVELAMENTO DA PISTA COM BASE (BGS) |
| 3. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - CAPA |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| <small>RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988</small> JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 164

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 06/10/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 6 SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6h-feira | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--|
| 1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA |
| 2. REGULARIZAÇÃO - NIVELAMENTO DA PISTA COM BASE (BGS) |
| 3. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - REPERFILAMENTO |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 165

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 09/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | OBRA PARALISADA | OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM X NÃO | RETRABALHO: | SIM NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 6 SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 2ª-feira | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--|
| 1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA |
| 2. REGULARIZAÇÃO - NIVELAMENTO DA PISTA COM BASE (BGS) |
| 3. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - REPERFILAMENTO |
| 4. EXECUÇÃO DRENAGEM |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 166

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 10/10/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | | OBRA PARALISADA | | | OUTRO: | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO | | | |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|---|
| 1. | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - REPERFILAMENTO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)



Nº 167

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 11/10/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 6 SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 41-feira | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--------------------------------------|
| 1. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - CAPA |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | | |
|--|--|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO | |
| ASSINATURAS | | |
| RODRIGO SILIPRANDI <small>RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15</small> RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988</small> Coronel Vivida - PR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 168

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 12/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 6 SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|--|
| 1. IMPRODUTIVO | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15 <small>RODRIGO SILIPRANDI CPF: 638302999-15 RG: 11.111.111-11 Data de Nascimento: 01/01/1988</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI CPF: 08136345988 RG: 11.111.111-11 Data de Nascimento: 01/01/1988</small> |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 169

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 13/10/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 6ª-feira | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|--------------------------------------|--|
| 1. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - CAPA | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI <small>RODRIGO SILIPRANDI 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</small> |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 170

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 16/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL |
| | | | | | | 1 | MOTORISTA(S) |
| | | | | | | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | | | | | | PEDREIRO(S) |
| | | | | | | | PINTOR(ES) |
| | | | | | | 6 | SERVENTES |
| | | | | | | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| 21-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|--------------------------------------|--|
| 1. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - CAPA | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 171

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 17/10/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----|-----------------|-----|-----|--------|--|--|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | | OBRA PARALISADA | | | OUTRO: | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO | | | |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS= 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|------------------------------------|---------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |

| ASSINATURAS | | |
|---|---|---|
| RODRIGO SILIPRANDI <small>CPF: 038302999-15</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>CPF: 08136345988</small> Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 172

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 18/10/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 MZ. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDICÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | X | | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--------------------------------------|
| 1. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - CAPA |
| 2. TARDE - IMPRODUTIVO |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999 <small>Assinatura eletrônica de Rodrigo Siliprandi</small> 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 <small>Assinatura eletrônica de Jean Felipe Miecowski</small> Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 173

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 19/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | X | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5h-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------------|
| 1. IMPRODUTIVO |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)



Nº 174

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|--|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 20/10/2023 - sex | |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 6 SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|--------------------------------------|--|
| 1. EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - CAPA | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI <small>CPF: 038302999-15</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>CPF: 08136345988</small> Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 175

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 23/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----|-----------------|-----|--|--------|-----|--|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | | | OBRA PARALISADA | | | OUTRO: | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | | | NÃO | |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | |
| TARDE | | X | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|---------|
| 1. | LIMPEZA |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI <small>RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15</small> RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08196345988</small> Coronel Vivida - PR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 176

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 24/10/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|---------|
| 1. | LIMPEZA |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| <small>RODRIGO SILIPRANDI: 638302999</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 177

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 25/10/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | OBRA PARALISADA | OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM X NÃO | RETRABALHO: | SIM NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|--|
| 1. LIMPEZA | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|--|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999 <small>RODRIGO SILIPRANDI 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08196345988 Coronel Vivida - PR</small> |
| RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 178

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 26/10/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 5ª-feira | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|----------|
| 1. | VISTORIA |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 179

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 27/10/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | OBRA PARALISADA | OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM X NÃO | RETRABALHO: | SIM NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI 08136345988 Coronel Vivida - PR JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 180

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 30/10/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| STATUS DA OBRA: | OBRA EM ANDAMENTO | OBRA PARALISADA | OUTRO: |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | SIM X NÃO | RETRABALHO: | SIM NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|
| MANHÃ | | | X | | |
| TARDE | | | X | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 181

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 31/10/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS= 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | X | | | |
| TARDE | | | X | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. | NÃO PRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|------------------------------------|---------------------|
| NOME: NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO | FUNÇÃO: ENCARREGADO |

| ASSINATURAS | | |
|--|--|------------------------------|
| RODRIGO SILIPRANDI <small>RODRIGO SILIPRANDI CPF: 08136345988 RG: 15.111.111-11 CNH: 111-111-11111111 INSC. EST. 111.111.111-11</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI <small>JEAN FELIPE MIECOANSKI CPF: 08136345988 RG: 15.111.111-11 CNH: 111-111-11111111 INSC. EST. 111.111.111-11</small> | NOME DE QUEM PREENCHEU O RDO |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | ENCARREGADO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 182

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 01/11/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 4ª-feira | | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | | | |
| TARDE | X | | | | | | |
| NOITE | | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 Nº do Cert. ou CPF Assin. ou AC SOLUTI Múltipla v1. Data e Hora de Assinatura: 11/11/2023 15:05:00 Localizador: Assinatura de Rodrigo Siliprandi Data: 2023-11-11 15:05:00 Versão PDF: Versão: 2002.0</small> | RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 Nº do Cert. ou CPF Assin. ou AC SOLUTI Múltipla v1. Data e Hora de Assinatura: 11/11/2023 15:05:00 Localizador: Assinatura de Rodrigo Siliprandi Data: 2023-11-11 15:05:00 Versão PDF: Versão: 2002.0</small> |
| JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 184

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 03/11/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS= 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|---|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | | | X |
| TARDE | | | | | | X |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI 0299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 185

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 06/11/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI 0299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 186

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 07/11/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI SILIPRANDI:63830299915 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI SILIPRANDI:63830299915 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVELS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 187

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 08/11/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDICÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 4ª-feira | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI Responsável Técnico <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. Nº. CREA: D-CP 15441. Cui-AC: BCL/UTI Município: Coronel Vivida. Nº. CREA/CAU: A9999999. Nº. ART / RRT: 1720230866607. Data: 08/11/2023 16:08:20 (UTC-03:00). Fuso: PDF Reader versão: 2023.2.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI Responsável pela Fiscalização |
| RODRIGO SILIPRANDI Responsável Técnico <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. Nº. CREA: D-CP 15441. Cui-AC: BCL/UTI Município: Coronel Vivida. Nº. CREA/CAU: A9999999. Nº. ART / RRT: 1720230866607. Data: 08/11/2023 16:08:20 (UTC-03:00). Fuso: PDF Reader versão: 2023.2.0</small> | RODRIGO SILIPRANDI Responsável Técnico |

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS DIL SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 188

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 09/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|--|
| 1. IMPRODUTIVO | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI ASSINADO DIGITALMENTE POR RODRIGO SILIPRANDI:638302999-15 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI ASSINADO DIGITALMENTE POR RODRIGO SILIPRANDI:638302999-15 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| JEAN FELIPE MIECOANSKI ASSINADO DIGITALMENTE POR JEAN FELIPE MIECOANSKI: A9999999-1 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 189

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 10/11/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS= 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | |
| TARDE | | X | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI SILIPRANDI:63830299915 0299915 <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 em 10/11/2023 às 15:59:02. Localização: sua localização de assinatura não pode ser verificada. Data: 2023-12-08 15:59:02. Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 em 10/11/2023 às 15:59:02. Localização: sua localização de assinatura não pode ser verificada. Data: 2023-12-08 15:59:02. Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 191

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 14/11/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>RODRIGO SILIPRANDI: 63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |
| <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI</p> <p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 192

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 15/11/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROCABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | | X |
| TARDE | | | | | X |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:6383 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:638302999-15 NO CUBO DO CDP Brasil - OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA - OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA PP AS OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA Assinatura: 15/11/2023 15:02:07 Data: 2023-11-15 15:02:07 Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:638302999-15 NO CUBO DO CDP Brasil - OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA - OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA PP AS OUVAC SOLUÇÕES MUNICÍPIOS LTDA Assinatura: 15/11/2023 15:02:07 Data: 2023-11-15 15:02:07 Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> |
| JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 193

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 16/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 5ª-feira | | | | |
|--------------------|----------|--|---|--|--|
| MANHÃ | | | | | |
| TARDE | | | X | | |
| NOITE | | | X | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:6383029915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>RODRIGO SILIPRANDI:6383029915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |
| <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 194

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM 59 | Lote 1 | Ano 2023 | DATA RDO: | 17/11/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDICÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL |
| | | | | | | 1 | MOTORISTA(S) |
| | | | | | | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | | | | | | PEDREIRO(S) |
| | | | | | | | PINTOR(ES) |
| | | | | | | 6 | SERVENTES |
| | | | | | | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | | |
| TARDE | | X | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|--|
| 1. IMPRODUTIVO | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RODRIGO SILIPRANDI |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302990 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302990 15 RODRIGO SILIPRANDI RODRIGO SILIPRANDI | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS (01 SEMANA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 196

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 21/11/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | | |
| TARDE | | X | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | RETRABALHO - CALÇADAS |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI em 2023/11/21 às 14:09:22 (UTC-03:00) - CPF: 02999151515 - CNPJ: 08.000.000/0001-91</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI em 2023/11/21 às 14:09:22 (UTC-03:00) - CPF: 02999151515 - CNPJ: 08.000.000/0001-91</small> 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 198

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 23/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDICÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 3 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 11 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | 1 | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 2 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | X | | |
| TARDE | | | X | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|--------------------------|--|
| 1. IMPRODUTIVO - MOLHADO | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:6383029915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>RODRIGO SILIPRANDI:6383029915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 199

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 24/11/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | RETRABALHO - CALÇADAS |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:638302999 0299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 200

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 27/11/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | X | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 201

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 28/11/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | |
|---|---|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROSCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 ENCARRECADOS(S) | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 ENGENHEIRO(S) | 6 SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | X | | |
| TARDE | | | X | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 203

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 30/11/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A99999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | | SIM | NÃO | |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|--------------------------|
| 1. RETRABALHO - CALÇADAS |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:6383 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p style="font-size: small;">Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Nº CREA/CAU: PR-999.999/D Nº ART / RRT: 1720230866607 Data: 2023-11-30 16:05:21 (GMT-03:00) Fonte: PDF Assinador versão: 2023.2.0</p> | <p style="text-align: center;">JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> <p style="text-align: right;">RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p style="font-size: small;">Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Nº CREA/CAU: PR-999.999/D Nº ART / RRT: 1720230866607 Data: 2023-11-30 16:05:21 (GMT-03:00) Fonte: PDF Assinador versão: 2023.2.0</p> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 204

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 01/12/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDICÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|--------------------------|--|
| 1. RETRABALHO - CALÇADAS | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 206

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM 59 | Lote 1 | Ano 2023 | DATA RDO: | 05/12/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | Nº CREA/CAU: | A9999999 | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | SIM | <input type="checkbox"/> |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | X | | |
| TARDE | | X | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - MOLHADO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| Assinatura digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>NO: Cert. D-CP de aut. QUAC SGA DTI Múltipla v3.02-02/2010 (11/03/2020) - 01/10/2020 17:58:11 02/20</small> <small>Assinatura digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Razão: motivo de sua assinatura aqui Localidade: sua localidade de assinatura aqui Data: 2024-12-05 17:58:11 02/20 Versão PDF: versão 2023.2.2</small> | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 207

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 06/12/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | RETRABALHO - CALÇADAS |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NO DIA 06/12/2023 às 17:58:02 (UTC-03:00) em favor de F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA CPF: 08.908.238/0001-10 CNPJ: 08.908.238/0001-10 Data: 2023.12.06 17:58:02 (UTC-03:00) Fone: 51 3333 3333</small> | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NO DIA 06/12/2023 às 17:58:02 (UTC-03:00) em favor de F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA CPF: 08.908.238/0001-10 CNPJ: 08.908.238/0001-10 Data: 2023.12.06 17:58:02 (UTC-03:00) Fone: 51 3333 3333</small> |
| JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 208

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 07/12/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | X | | |
| TARDE | | | | X | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 Nº Cert. 05/CF/Bras. 00046304.011/Munícip. de Coronel Vivida - SC Nº 01/2014-000115. Data: 2024/02/08 17:56:02-03:00 Data: 2024/02/08 17:56:02-03:00 Fone: PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 Nº Cert. 05/CF/Bras. 00046304.011/Munícip. de Coronel Vivida - SC Nº 01/2014-000115. Data: 2024/02/08 17:56:02-03:00 Data: 2024/02/08 17:56:02-03:00 Fone: PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 209

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 08/12/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | | | | | |
| 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | |
| TARDE | | X | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. | RETRABALHO - CALÇADAS |
| 2. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 210

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 11/12/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|---------------------------|
| 1. RETRABALHO - CALÇADAS |
| 2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Nº do Cert. Digital: 0299915 Nº do Certificado: 0299915 Data: 2023.12.20 15:58:11 (UTC-03:00) -03:00 Para obter o texto assinado clique aqui</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI 0299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 211

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|----|--------------|--------------|-----|----------------------|----------------------|------------------|------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 12/12/2023 - ter | |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | | | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | | | 18/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|---------------------------|
| 1. RETRABALHO - CALÇADAS |
| 2. EXECUÇÃO PISO TÁTIL |
| 3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 212

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 13/12/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITERA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | | |
| TARDE | X | | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. | EXECUÇÃO PISO TÁTIL |
| 2. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 CN=C=BR, O=C=CP Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, DN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Razão: Inválido de sua assinatura digital Localização: sua localização de assinatura não é conhecida Data: 2023.12.13 17:05:03 Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 CN=C=BR, O=C=CP Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, DN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Razão: Inválido de sua assinatura digital Localização: sua localização de assinatura não é conhecida Data: 2023.12.13 17:05:03 Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 213

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 14/12/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|---------------------------|--|
| 1. EXECUÇÃO PISO TÁTIL | |
| 2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 DN: C=BR, CN=CP Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v1, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CN=Rodrigo Siliprandi</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 DN: C=BR, CN=CP Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v1, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CN=Rodrigo Siliprandi</small> RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 214

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 15/12/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDICÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADOS(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | | |
| TARDE | | X | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|---------------------------|
| 1. EXECUÇÃO PISO TÁTIL |
| 2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=SISTEMAS, CN=Rodrigo Siliprandi:63830299915 Razão: motivo de sua assinatura aqui Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.12.05 11:46:02 -0500 Ford PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 215

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 18/12/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITERA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|-----|
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | |
| TARDE | | | X | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 0299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 216

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 19/12/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. | EXECUÇÃO PISO TÁTIL |
| 2. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI 0299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 217

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 20/12/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----|
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | SIM | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADOS(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|---------------------------|--|
| 1. EXECUÇÃO PISO TÁTIL | |
| 2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:638302999-15 em 20/12/2023 às 17:58:00 (GMT-05:00) - Cor: Azul</small> | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:638302999-15 em 20/12/2023 às 17:58:00 (GMT-05:00) - Cor: Azul</small> | RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO <small>Assinado eletronicamente por RODRIGO SILIPRANDI:638302999-15 em 20/12/2023 às 17:58:00 (GMT-05:00) - Cor: Azul</small> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 218

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 21/12/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | <input type="checkbox"/> | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NOITE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| ATIVIDADES REALIZADAS |
|---------------------------|
| 1. EXECUÇÃO PISO TÁTIL |
| 2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |

| OCORRÊNCIAS |
|-------------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 0299915 RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NO: C=BR, O=CEP Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig eS, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NO: C=BR, O=CEP Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig eS, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI NO: C=BR, O=CEP Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig eS, CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NO: C=BR, O=CEP Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig eS, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NO: C=BR, O=CEP Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig eS, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 NO: C=BR, O=CEP Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig eS, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</small> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 219

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 22/12/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | 1 | ARMADOR(ES) | 1 | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | 1 | AUX. CARREGAMENTO | 1 | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | 1 | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | 1 | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | 1 | ELETRECISTA(S) | 1 | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | 1 | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | 1 | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| MANHÃ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TARDE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NOITE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|---------------------------|--|
| 1. EXECUÇÃO PISO TÁTIL | |
| 2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI: 638302999 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIARIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 220

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 25/12/2023 - seg |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | |
| | | COMPACTADOR | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 2ª-feira | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | X | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-------------|
| 1. | IMPRODUTIVO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|--|--|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:638302999 15 RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |
| ASSINADO digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:638302999 CN=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipl vs, CN=RODRIGO SILIPRANDI:638302999 | ASSINADO digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:638302999 CN=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipl vs, CN=RODRIGO SILIPRANDI:638302999 |
| RODRIGO SILIPRANDI 0299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO | RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 221

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 26/12/2023 - ter |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |
| STATUS DA OBRA: | X | OBRA EM ANDAMENTO | | OBRA PARALISADA | | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | | SIM | X | NÃO | RETRABALHO: | | SIM | | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | 1 | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARREGADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA | 3ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | X | | | | |
| TARDE | | X | | | | |
| NOITE | | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - RECESSO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p style="text-align: right;">RODRIGO SILIPRANDI: 638302999-15</p> <p style="text-align: right;">RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |
| <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 222

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 27/12/2023 - qua |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 4ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | | |
| TARDE | | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - RECESSO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. NO: C=BR, O=CMV Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, CN=63830299915. OUV=Assinatura. OUV=Certificado PP. AS: OUV=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915. Razão motivo de sua assinatura aqui. Localização sua identidade de assinatura aqui. Data: 2024-02-08 17:36:02-03:02. Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0</small> | RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO | JEAN FELIPE MIECOANSKI RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 223

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 28/12/2023 - qui |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDICÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

DESCRIÇÃO DO RETRABALHO:

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | ARMADOR(ES) | MESTRE DE OBRAS | | |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | AUX. CARREGAMENTO | MONT. ANDAIME(S) | | |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) | |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) | |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) | |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADO(S) | PINTOR(ES) | |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 5ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | | | | | |
| TARDE | | | | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - RECESSO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |
| <p>JEAN FELIPE MIECOANSKI</p> <p>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> | |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 224

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| MUNICÍPIO: | CORONEL VIVIDA | SAM | 59 | Lote | 1 | Ano | 2023 | DATA RDO: | 29/12/2023 - sex |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2. | | | | | | CONTRATO EMPREITADA: | 156/2022 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | | | DATA ASSINATURA: | 23/12/2022 | |
| RESP. TÉCNICO: | RODRIGO SILIPRANDI | | | Nº CREA/CAU: | PR-999.999/D | | Nº ART / RRT: | 1720230866607 | |
| FISCAL OBRA: | JEAN FELIPE MIECOANSKI | | | Nº CREA/CAU: | A9999999 | | Nº ART / RRT: | 1720225726371 | |
| PRAZO DA OBRA (dias): | 180 | DATA PRAZO DE EXECUÇÃO: | 21/06/2023 | | DATA PRAZO VIGÊNCIA: | 18/12/2023 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| STATUS DA OBRA: | <input checked="" type="checkbox"/> | OBRA EM ANDAMENTO | <input type="checkbox"/> | OBRA PARALISADA | <input type="checkbox"/> | OUTRO: | | | |
| MEDIÇÃO REALIZADA: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO | RETRABALHO: | <input type="checkbox"/> | SIM | <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |
| DESCRIÇÃO DO RETRABALHO: | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE DE MÁQUINAS= 2 E EQUIPAMENTOS= 1 | | | | QUANTIDADE DE EFETIVOS: 10 PESSOAS | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| MÁQUINAS | 1 | CAM. BASCULANTE | EQUIPAMENTOS | 1 | ARGAMASSADEIRA | | ARMADOR(ES) | | MESTRE DE OBRAS |
| | | COMPACTADOR | | | BETONEIRA | | AUX. CARREGAMENTO | | MONT. ANDAIME(S) |
| | | ESCAVADEIRA | | | BOMBA | | CALCETEIRO(S) | 1 | MOTORISTA(S) |
| | 1 | RETROESCAVADEIRA | | | COMPRESSOR | | CARPINTEIRO(S) | 1 | OPERADOR(ES) |
| | | ROLO DE PATAS | | | GERADOR | | ELETRECISTA(S) | | PEDREIRO(S) |
| | | ROLO DE PNEUS | | | ROMPEDOR | 1 | ENCARRECADOS(S) | | PINTOR(ES) |
| | | ROLO LISO | | | VIBRADOR | 1 | ENGENHEIRO(S) | 6 | SERVENTES |
| | | VIBROACABADORA | | | | | MEIO OFICIAL | | TÉCN. SEGURANÇA |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|
| SITUAÇÃO CLIMÁTICA 6ª-feira | | | | | |
| MANHÃ | X | | | | |
| TARDE | | | X | | |
| NOITE | | | | | |

| ATIVIDADES REALIZADAS | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | IMPRODUTIVO - RECESSO |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

| OCORRÊNCIAS | |
|-------------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

| PREENCHIMENTO | |
|---|---|
| NOME: RODRIGO SILIPRANDI | FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| ASSINATURAS | |
| <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> | <p>RODRIGO SILIPRANDI:63830299915</p> <p>RODRIGO SILIPRANDI RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> |

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO E DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DEVEM SER DIÁRIAS OU SEMANAIS.



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: 01/08/2023 | Pág. 221 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | terça-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X |
| Prazo Decorrido: | 221 | Prazo Restante: | 79 | Tarde | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X |


| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|----------------------------|--------------------------|--------------|

DocuSigned by:

 D13D5C21EB26497...

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 02/08/2023 | Pág. | 222 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 02/08/2023 | quarta-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 222 | Prazo Restante: | 78 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| Drenagem | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 03/08/2023 | Pág. | 223 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 223 | Prazo Restante: | 77 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| |
|--|
| |
|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 04/08/2023 | Pág. | 224 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 224 | Prazo Restante: | 76 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| |
|--|
| |
|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 05/08/2023 | Pág. | 225 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 225 | Prazo Restante: | 75 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Designed by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|--|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 06/08/2023 | Pág. | 226 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 226 | Prazo Restante: | 74 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: 07/08/2023 | Pág. 227 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | Chuva Operacional |
| Prazo Decorrido: | 227 | Prazo Restante: | 73 | Tarde | Chuva Não Operacional |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas
 Execução de calçadas
 Drenagem

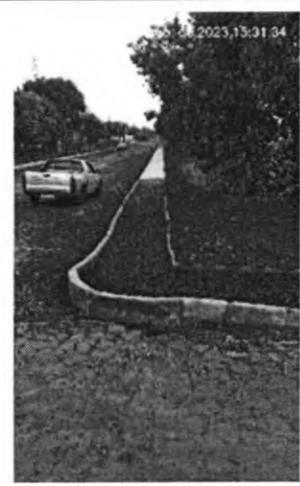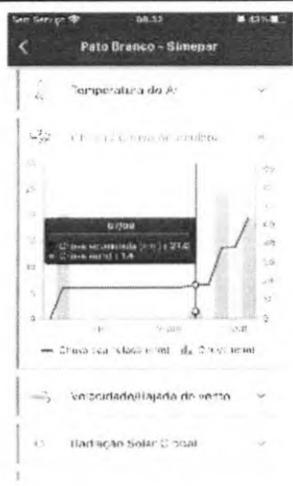

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 08/08/2023 | Pág. | 228 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 228 | Prazo Restante: | 72 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 09/08/2023 | Pág. | 229 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 229 | Prazo Restante: | 71 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

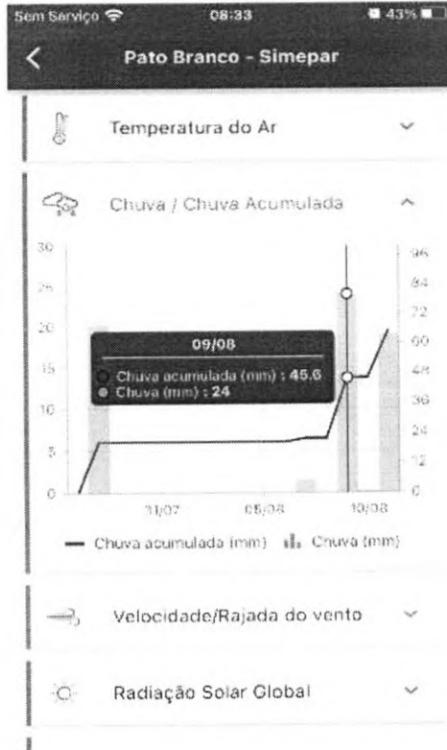

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned By: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|--|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras




DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 10/08/2023 | Pág. | 230 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 10/08/2023 | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 230 | Prazo Restante: | 70 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

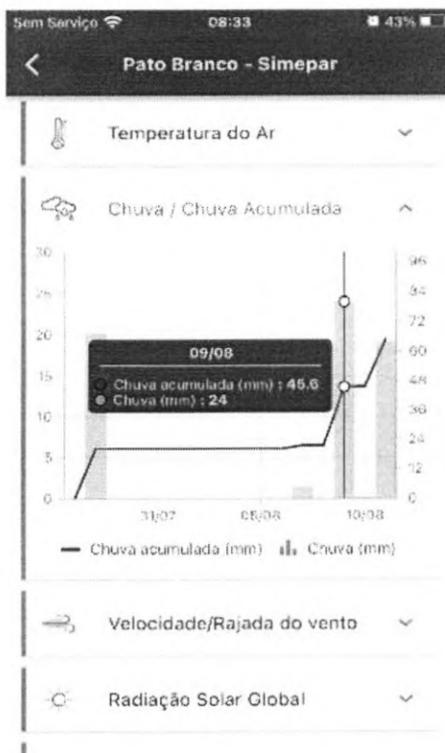

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 11/08/2023 | Pág. | 231 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 231 | Prazo Restante: | 69 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

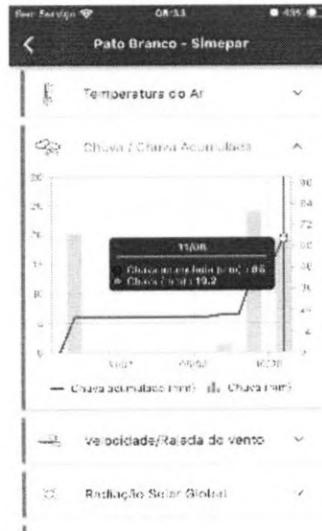

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 12/08/2023 | Pág. | 232 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 232 | Prazo Restante: | 68 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
|----------|--|--|--|--|

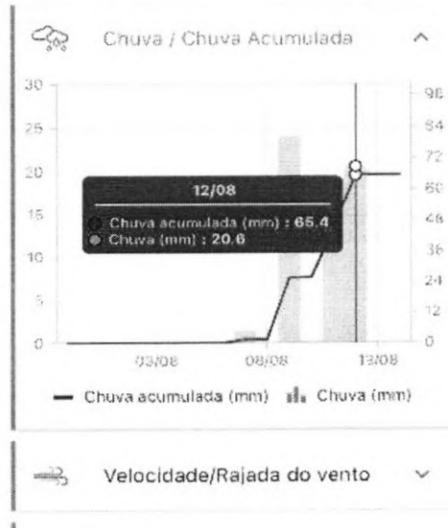

| | | |
|---------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/08/2023 | Pág. | 233 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 233 | Prazo Restante: | 67 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data: |
|---------------------|---|-------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/08/2023 | Pág. | 234 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 234 | Prazo Restante: | 66 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 15/08/2023 | Pág. | 235 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 235 | Prazo Restante: | 65 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 16/08/2023 | Pág. | 236 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 236 | Prazo Restante: | 64 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
|----------|---|--|--|
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | |
| | Execução de calçadas | | |
| | Drenagem | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 17/08/2023 | Pág. | 237 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 237 | Prazo Restante: | 63 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
| | RODRIGO SILIPRANDI | |



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 18/08/2023 | Pág. | 238 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 18/08/2023 | | 238 |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 238 | Prazo Restante: | 62 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 19/08/2023 | Pág. | 239 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 239 | Prazo Restante: | 61 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 20/08/2023 | Pág. | 240 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 240 | Prazo Restante: | 60 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|--------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/08/2023 | Pág. | 241 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 241 | Prazo Restante: | 59 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 22/08/2023 | Pág. | 242 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 242 | Prazo Restante: | 58 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------|--------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 23/08/2023 | Pág. | 243 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 243 | Prazo Restante: | 57 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| | Drenagem | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/08/2023 | Pág. | 245 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 245 | Prazo Restante: | 55 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. | |
| | Engenheiro | | 1 | | | | |
| | Encarregado | | 1 | | | | |
| | Operador | | 4 | | | | |
| Servente | | 6 | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e reposição de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| Drenagem | | | | | | | |

DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 26/08/2023 | Pág. | 246 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 246 | Prazo Restante: | 54 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 28/08/2023 | Pág. | 248 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 248 | Prazo Restante: | 52 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e reposição de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| Drenagem | | | | | | | |

DocuSigned by:

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO SILIPRANDI

Data



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 29/08/2023 | Pág. | 249 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 249 | Prazo Restante: | 51 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 300 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|---------------------|-------------------|---|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/08/2023 | Pág. | 250 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 30/08/2023 | | 250 |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 250 | Prazo Restante: | 50 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|---|
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |
| | Execução de calçadas |
| | Drenagem |



| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | DocuSigned by: RODRIGO SILIPRANDI | Data |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 31/08/2023 | Pág. | 251 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 251 | Prazo Restante: | 49 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 300 dias | | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | | Quant. | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | Aterro e regularização para calçadas | | | | | | |
| | Execução de calçadas | | | | | | |
| | Drenagem | | | | | | |

Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

RODRIGO

SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2023.09.04 12:02:54 -03'00'

Data



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 10/01/2023 | Pág. 1 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 1 | Prazo Restante: | 179 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 | dias | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Planejamento | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/03/2023 | Pág. 62 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Sillprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 62 | Prazo Restante: | 118 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/03/2023 | Pág. | 63 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Sillprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 63 | Prazo Restante: | 117 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 15/03/2023 | Pág. 64 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 64 | Prazo Restante: | 116 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 16/03/2023 | Pág. | 65 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 16/03/2023 | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 65 | Prazo Restante: | 115 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |

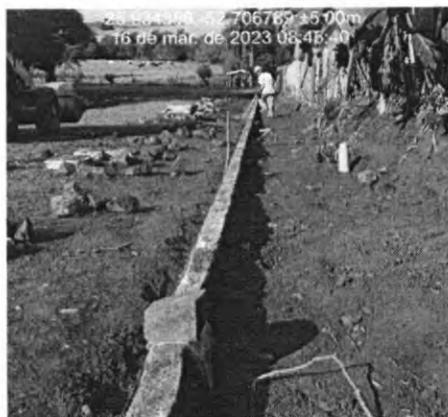

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 17/03/2023 | Pág. | 66 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 66 | Prazo Restante: | 114 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|---|-----------|--|
| | Quant. | | Quant. | |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------|--------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 18/03/2023 | Pág. | 67 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 18/03/2023 | | |
| | | | | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 67 | Prazo Restante: | 113 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. | | | |
| | Engenheiro | 1 | | | | | |
| | Encarregado | 1 | | | | | |
| | Operador | 4 | | | | | |
| | Servente | 6 | | | | | |
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------|------------------------------|----|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 19/03/2023 | Pág. | | 68 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional | |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | | |
| Prazo Decorrido: | 68 | Prazo Restante: | 112 | Tarde | X | | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Serviços | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|----------------------------|--------------------------|-------------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 20/03/2023 | Pág. | 69 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 69 | Prazo Restante: | 111 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |



| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/03/2023 | Pág. | 70 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 70 | Prazo Restante: | 110 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|-----------------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|----------------------------|--------------------------|-------------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 23/03/2023 | Pág. 72 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 72 | Prazo Restante: | 108 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|-------------|------------|---|--------|-----------|--|--------|
| | Engenheiro | | 1 | | | |
| Encarregado | | 1 | | | | |
| Operador | | 4 | | | | |
| Servente | | 6 | | | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 24/03/2023 | Pág. | 73 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 73 | Prazo Restante: | 107 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | |
| | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/03/2023 | Pág. | 74 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 74 | Prazo Restante: | 106 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 27/03/2023 | Pág. 76 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 76 | Prazo Restante: | 104 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 28/03/2023 | Pág. | 77 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 77 | Prazo Restante: | 103 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 29/03/2023 | Pág. | 78 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 78 | Prazo Restante: | 102 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/03/2023 | Pág. | 79 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 79 | Prazo Restante: | 101 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | |



Visto Fiscalização:

Visto Contratada:

Data



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 01/04/2023 | Pág. | 81 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 81 | Prazo Restante: | 99 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|---|-----------|--|
| | Quant. | | Quant. | |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|---------------------|-------------------|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 31/03/2023 | Pág. | 80 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 80 | Prazo Restante: | 100 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|---------------------|-------------------|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 02/04/2023 | Pág. | 82 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 82 | Prazo Restante: | 98 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|---------------------|-------------------|-------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 03/04/2023 | Pág. 83 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 83 | Prazo Restante: | 97 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|-------------|------------|---|--------|-----------|--|--------|
| | Engenheiro | | 1 | | | |
| Encarregado | | 1 | | | | |
| Operador | | 4 | | | | |
| Servente | | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|


DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 04/04/2023 | Pág. | 84 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 84 | Prazo Restante: | 96 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | |

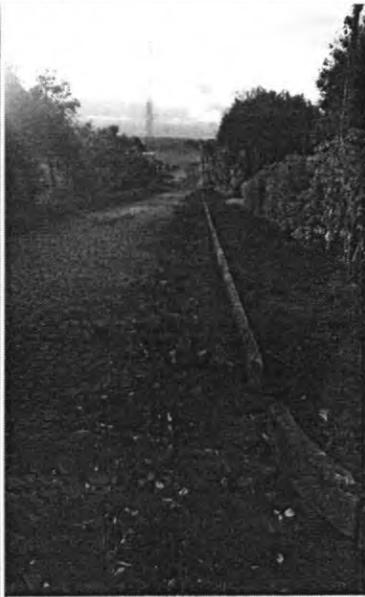

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 06/04/2023 | Pág. | 86 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 86 | Prazo Restante: | 94 | Tarde | | X | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | | X | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 07/04/2023 | Pág. 87 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | X | |
| Prazo Decorrido: | 87 | Prazo Restante: | 93 | Tarde | | X | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | | X | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Quant. | Descrição | | Quant. |
|-------------|------------|---|--------|-----------|--|--------|
| | Engenheiro | | 1 | | | |
| Encarregado | | 1 | | | | |
| Operador | | 4 | | | | |
| Servente | | 6 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores | | | | | |
| | Retirada e recolocação de meio-fio | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 08/04/2023 | Pág. | 88 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 88 | Prazo Restante: | 92 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|---------------------|-------------------|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 09/04/2023 | Pág. | 89 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 89 | Prazo Restante: | 91 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | | Descrição | |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | Quant. | | Quant. |
| | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 10/04/2023 | Pág. | 90 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 90 | Prazo Restante: | 90 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|---------------------|-------------------|-------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 12/04/2023 | Pág. | 92 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | 12/04/2023 | | 92 |
| | | | | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 92 | Prazo Restante: | 88 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

Serviços
 Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores
 Retirada e recolocação de meio-fio
 Aterro e regularização para calçadas



| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 13/04/2023 | Pág. | 93 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 93 | Prazo Restante: | 87 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | | 1 | |
| Encarregado | | 1 | | |
| Operador | | 4 | | |
| Servente | | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e reposição de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |



| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|

Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 14/04/2023 | Pág. | 94 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Sillprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 94 | Prazo Restante: | 86 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Equipam. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |



| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 15/04/2023 | Pág. 95 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 95 | Prazo Restante: | 85 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 16/04/2023 | Pág. 96 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 96 | Prazo Restante: | 84 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 17/04/2023 | Pág. | 97 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | segunda-feira | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 97 | Prazo Restante: | 83 | Tarde | | | X |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | | | X |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



Município de Coronel Vivida
Secretaria de Engenharia e Obras

DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 18/04/2023 | Pág. | 98 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 98 | Prazo Restante: | 82 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

Serviços
Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores
Retirada e re colocação de meio-fio
Aterro e regularização para calçadas
Execução calçadas



| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 19/04/2023 | Pág. 99 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 99 | Prazo Restante: | 81 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 20/04/2023 | Pág. | 100 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Silliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 100 | Prazo Restante: | 80 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |



| | | |
|---------------------|-------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|---------------------|-------------------|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 21/04/2023 | Pág. 101 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 101 | Prazo Restante: | 79 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 23/04/2023 | Pág. 103 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 103 | Prazo Restante: | 77 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 24/04/2023 | Pág. | 104 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | segunda-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 104 | Prazo Restante: | 76 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 25/04/2023 | Pág. | 105 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Sillprandi | CREA | 28455/D | | terça-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | | X |
| Prazo Decorrido: | 105 | Prazo Restante: | 75 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 26/04/2023 | Pág. | 106 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quarta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | | X | |
| Prazo Decorrido: | 106 | Prazo Restante: | 74 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|-------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data: |
|---------------------|-------------------|-------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 27/04/2023 | Pág. | 107 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | quinta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 107 | Prazo Restante: | 73 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | 180 dias | | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | Descrição | | Quant. | |
|----------------|------------------|--|---------------|--|
| | | | | |
| Pessoal | Engenheiro | | 1 | |
| | Encarregado | | 1 | |
| | Operador | | 4 | |
| | Servente | | 6 | |

| | |
|-----------------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|----------------------------|--------------------------|-------------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 28/04/2023 | Pág. 108 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sexta-feira | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 108 | Prazo Restante: | 72 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | |
| | | | | |

| | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| Pessoal | Engenheiro | 1 | | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | |
|----------|--|
| Serviços | Início limpeza dos passeios - Remoção de árvores |
| | Retirada e recolocação de meio-fio |
| | Aterro e regularização para calçadas |

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 29/04/2023 | Pág. 109 | |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | sábado | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 109 | Prazo Restante: | 71 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|
| | Engenheiro | 1 | | |
| Encarregado | 1 | | | |
| Operador | 4 | | | |
| Servente | 6 | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------------|------|
| Visto Fiscalização: | Visto Contratada: | Data |
|---------------------|-------------------|------|



DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| Empresa Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | | | | Data: | 30/04/2023 | Pág. | 110 |
| Resp. Técnico | Rodrigo Siliprandi | CREA | 28455/D | | domingo | | |
| Obra : | CONTRATO 156/2022 | | | Tempo | Seco | Chuva Operacional | Chuva Não Operacional |
| Local: | Município de Coronel Vivida | | | Manhã | X | | |
| Prazo Decorrido: | 110 | Prazo Restante: | 70 | Tarde | X | | |
| Prazo da Obra | | 180 dias | | Noite | X | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Equipam. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Pessoal | Descrição | Quant. | Descrição | Quant. |
|---------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | Engenheiro | 1 | |
| | Encarregado | 1 | | |
| | Operador | 4 | | |
| | Servente | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Serviços | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|------|
| Visto Fiscalização: | JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR | Visto Contratada: RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 | Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2023.05.06 11:32:20 -03'00' | Data |
|---------------------|---|--|---|------|

Re: Orientação - aditivos



"Genezi Guedes dos Santos" <guedes@paranacidade.org.br>

2 de agosto de 2024 12:41

Para: jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br

Bom dia, seria melhor pois no decorrer da obra sempre aparece aditivos e agora na lei nova é bem diferente a inclusão no portal



Genezi Guedes dos Santos
Analista de Desenvolvimento Municipal

46-3211-5752 | guedes@paranacidade.org.br
Rua Perú, 1301 | Francisco Beltrão, Paraná | 85605-470
www.paranacidade.org.br | www.paranainterativo.pr.gov.br

De: jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br <jeanfelipe@coronelvivida.pr.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de agosto de 2024 09:12

Para: Genezi Guedes dos Santos <guedes@paranacidade.org.br>

Assunto: Orientação - aditivos

Olá, bom dia Genezi, tudo bem?

Genezi, só queria tirar uma dúvida, com relação aos aditivos de metafísica permanece a orientação de deixarmos para enviar no final do contrato (medição final), certo?

Atenciosamente,
Jean Felipe Miecoanski



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 135/2024– DEP

Coronel Vivida PR, 09 de agosto de 2024.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO DE ADITIVO DE METAFÍSICA AO CONTRATO 156/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 25/2022, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, SAM 59.**

Vimos através deste solicitar a reanálise do pedido de aditivo de metafísica ao contrato supra citado.

O contrato foi assinado na data de 23 de dezembro de 2022, tendo 180 dias de prazo de execução e 360 dias de prazo de vigência. O primeiro e segundo aditivo formalizados, respectivamente com data de 31 de agosto de 2023 e 01 de novembro de 2023, prorrogaram o prazo de execução até 18 de dezembro de 2023. Os aditivos posteriores com número: 3, 4, 5 e 6 prorrogaram o prazo de vigência até o dia 13 de outubro de 2024.

A presente solicitação de aditivo de metafísica diz respeito à vários serviços que foram executados durante a obra, conforme descrito no Proc. Administrativo 6.427/2024 do 1Doc. Um desses serviços se refere a execução de drenagem nas ruas que são objeto do contrato. Esse serviço faz parte do escopo da obra de pavimentação, sendo essencial para garantir a durabilidade da obra, garantir a segurança de quem trafega pelas vias, além de evitar transtornos às propriedades adjacentes à obra. Inicialmente esse serviço não estava no orçamento e projeto pois o mesmo seria executado pelo departamento de obras, viação e urbanismo do município. Porém, quando foi solicitada a execução, o departamento não tinha disponibilidade para tal, devido a demanda constante de manutenção das estradas rurais e pela redução do quadro de funcionários. Dessa forma, foi solicitado que a empresa executora realizasse o serviço.

Além disso, outros serviços precisaram de alteração de quantidade no momento da execução por se mostrarem como melhores soluções técnicas, contribuindo para a qualidade final da obra, incluindo alterações nas quantidades de rampas PNE, placa de sinalização, calçada em CBUQ e meio-fio novo.

A solicitação desse aditivo foi feita apenas no fim da obra, seguindo a recomendação da reunião de partida do paranacidade, conforme e-mail com confirmação em anexo. Porém, ressaltamos que todos os serviços foram executados dentro do prazo de execução, conforme diário de obras e relatório fotográfico em anexo.

Dessa forma, solicitamos a reanálise do pedido, para que os serviços executados sejam pagos a empresa executora, e para que o contrato possa ser finalizado.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - CREA 148.981D-PR
RNP 173425598

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR
2024.08.09 17:15:47-03'00'

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA

CONTRATO: 156/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 25/2022

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA.





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Foto 2 – serviços de terraplanagem em andamento. Data 26/05/2023



Foto 3 – Finalização do serviço de drenagem 17/08/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Foto 4 – Finalização do serviço de drenagem. Data 17/08/2023



Foto 5 – Pavimentação executada após a drenagem. Data 17/11/2023



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



Foto 6 – Pavimentação executada após a drenagem. Data 17/11/2023

Coronel Vivida, 09 de agosto de 2024


Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil - CREA 148.981-D-16
RUBR. 171423306

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR
2024.08.09
17:16:14-03'00"

Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil – Crea: PR/148.981D/D
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



Proc. Administrativo 7- 6.427/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica

Data: 13/08/2024 às 11:01:07

Segue para análise

—

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 8- 6.427/2024

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 13/08/2024 às 11:18:41

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 156 - cp 25 - sam 59

Pelo que se retira do constante no Despacho 6 do presente memorando, a Divisão de Estudos e Projetos apresentou justificativa para a formalização do aditivo tardio da meta física e a inclusão de objeto não previsto inicialmente no projeto.

Em sua justificativa afirma que os serviços foram efetivamente realizados dentro do prazo de execução e vigência contratual. Ademais, informa que o aditivo realizado após o encerramento do prazo de execução (mas dentro da vigência) se deu por orientação do Paranacidade.

Da mesma forma, em relação ao objeto incluído posteriormente e que não estava incluso no projeto (drenagem), o setor técnico afirma que isso se deu em razão do Departamento de Obras "*não tinha disponibilidade para tal, devido a demanda constante de manutenção das estradas rurais e pela redução do quadro de funcionários.*"

Assim sendo, **diante da justificativa apresentada**, esta Procuradoria Jurídica opina pelo normal prosseguimento do pedido.

—

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313

Assinado por 1 pessoa: DANIEL PROENCA LARSSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/50E5-1E0D-573F-2823> e informe o código 50E5-1E0D-573F-2823



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 50E5-1E0D-573F-2823

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 13/08/2024 11:18:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/50E5-1E0D-573F-2823>

Proc. Administrativo 9- 6.427/2024



De: Iana S. - SA-DLC

Para: SF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 13/08/2024 às 11:21:59

Conforme novo pedido e nova análise jurídica, segue para indicação orçamentária.

—
Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 10- 6.427/2024

De: Ademir A. - SF-DC

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 21/08/2024 às 16:27:57

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 156 - cp 25 - sam 59

EM ANEXO INDICAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O PRESENTE OBJETO

Ademir Antonio Aziliero
ANALISTA CONTÁBIL

Anexos:

30_pavimentacao_CV_1368_2022_SECID_ADITIVO.pdf

Assinado por 1 pessoa: ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/5FFD-E185-CBFF-161A> e informe o código 5FFD-E185-CBFF-161A



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de obras de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias públicas urbanas do distrito de Vista Alegre. – ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO – Processo Administrativo 1DOC nº 6427/2024.

| ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|----------------|-------|-----------------|
| UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações | | | | | | | |
| Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.99 – Outros Bens de Domínio Público | | | | | | | |
| UG | O/U | FONTE | P/A | DESCRIÇÃO | DESPESA PRINC. | DESD. | NATUREZA |
| 00 | 08/01 | 000 | 1.052 | Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052 | 500 | 2172 | 4.4.90.51.02.99 |
| 00 | 08/01 | 504 | 1.052 | Obras e Equipamentos de Circulação 08.001.26.451.0029.1.052 | 502 | 3774 | 4.4.90.51.02.99 |

Obs.: - Fonte 000 – despesa 2172, utilizar o valor de R\$ 195.891,18
- Fonte 504 – despesa 3774, utilizar o valor de R\$ 326.000,00

Coronel Vivida, 21 de agosto de 2024

ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CRC 025365-O/PR

Assinado por 1 pessoa: ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/5FFD-E185-CBFF-161A> e informe o código 5FFD-E185-CBFF-161A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FFD-E185-CBFF-161A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADEMIR ANTONIO AZILIERO (CPF 472.XXX.XXX-20) em 21/08/2024 16:28:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/5FFD-E185-CBFF-161A>

Proc. Administrativo 11- 6.427/2024



De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP - Gabinete do Prefeito

Data: 22/08/2024 às 16:19:59

Segue para análise e autorização

—
Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 12- 6.427/2024

De: Anderson B. - GP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 22/08/2024 às 16:27:33

Setores envolvidos:

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

Solicitação de aditivo - ct 156 - cp 25 - sam 59

Autorizado.

Anderson Manique Barreto
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/7C89-E7F9-30D7-539B> e informe o código 7C89-E7F9-30D7-539B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C89-E7F9-30D7-539B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 22/08/2024 16:27:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/7C89-E7F9-30D7-539B>



Proc. Administrativo (Nota interna 22/08/2024 16:52) 6.427/2024

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/08/2024 às 16:52:19

Segue aditivo de meta física e financeira para assinatura.

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

34_Aditivo_n_07_ao_Contrato_n_156_2022_F_Zancanaro.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------------------|---------------------|------------|---|
| Anderson Manique Barreto | 22/08/2024 16:54:33 | 1Doc | ANDERSON MANIQUE BARRETO CPF 967.XXX.XXX-91 |
| Fernando Zancanaro | 23/08/2024 17:01:32 | ICP-Brasil | FERNANDO ZANCANARO CPF 006.XXX.XXX-88 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B09E-40B3-3A7B-0711**



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 07

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Sétimo termo aditivo ao contrato nº 156/2022 decorrente da Concorrência Pública nº 25/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, situado na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, Estado do Paraná-PR, CNPJ 76.995.455/0001-56, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador da cédula de identidade RG. n.º 5.228.761-8, inscrito no CPF sob n.º 967.311.099-91.

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.461.328/0001-29, localizada na BR 158, km 513, 2800, Bairro São Francisco, na cidade de Pato Branco (85.501.970), Estado do Paraná, representada por seu representante legal, Sr. **Fernando Zancanaro**, portador da cédula de identidade RG. n.º 7.115.542-0 SESP PR, inscrito no CPF sob n.º 006.839.409-88.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 156/2022 que tem como objeto a **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. TRECHO:** • RUA GUANABARA (ENTRE AV SANTA CATARINA + 95,28M E AV. BRASIL) • RUA MATO GROSSO (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA MINAS GERAIS (ENTRE AV BRASIL E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA BAHIA (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA GOIAS (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA PARÁ (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • AV RIO GRANDE DO SUL (ENTRE RUA GUANABARA E RUA PARÁ) • AV BRASIL (ENTRE RUA MATO GROSSO E RUA PARÁ) • AV SANTA CATARINA (ENTRE RUA GUANABARA E RUA BAHIA), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação nº 25/2022 - Concorrência Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O acréscimo, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Décima Segunda do Contrato nº 156/2022 de 23 de dezembro de 2022, com fundamento no Art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos através do Processo Administrativo 1doc 6.427/2024, parecer jurídico, indicação orçamentária e deliberação superior.

Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO

Fica acrescido o valor de R\$ 521.891,18 (quinhentos e vinte e um mil e oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos), devido a execução de drenagem, rampas para PNE nas calçadas, placa de sinalização, trecho de calçada em CBUQ e meios-fios novos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 3.695.049,98 (três milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 156/2022 de 23 de dezembro de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 22 de agosto de 2024.

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

.....
Fernando Zancanaro
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B09E-40B3-3A7B-0711

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 22/08/2024 16:54:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO ZANCANARO (CPF 006.XXX.XXX-88) em 23/08/2024 17:01:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/B09E-40B3-3A7B-0711>

Proc. Administrativo 13- 6.427/2024



De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/08/2024 às 09:53:11

Setores (CC):

SF-DC, SF-SE, SOVU-DEP

Anexo as publicações do termo aditivo nº 07.

Encaminhado para acompanhamento e providências necessárias.

—

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

36_CORREIO_27_08_2024.pdf

37_AMP_27_08_2024.pdf

MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 41/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 41/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

1º TERMO ADITIVO
De 14 de maio de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 41/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 41/2022, celebrado em 21 de agosto de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 41/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

2º TERMO ADITIVO
De 21 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 41/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 41/2022, celebrado em 26 de agosto de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 41/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

3º TERMO ADITIVO
De 26 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 41/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 41/2022, celebrado em 27 de agosto de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 41/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

4º TERMO ADITIVO
De 27 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 41/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 5º Termo Aditivo do Contrato nº 41/2022, celebrado em 28 de agosto de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 41/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

5º TERMO ADITIVO
De 28 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 41/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2022, celebrado em 28 de agosto de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 01/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

1º TERMO ADITIVO
De 28 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 01/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2022, celebrado em 28 de agosto de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 01/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

2º TERMO ADITIVO
De 28 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 01/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2022, celebrado em 28 de agosto de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 01/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

3º TERMO ADITIVO
De 28 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 01/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2022, celebrado em 28 de agosto de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 01/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

4º TERMO ADITIVO
De 28 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 01/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

ATASTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Ata do 5º Termo Aditivo do Contrato nº 01/2022, celebrado em 28 de agosto de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CONTRATO Nº 01/2022
PREÇO PREVISIONAL Nº 502322

5º TERMO ADITIVO
De 28 de agosto de 2024

Tratam-se os Termos Aditivos do Contrato nº 01/2022, celebrado em 14 de maio de 2024, entre o Município de Porto Barreiro e a empresa contratada para a execução de obras de infraestrutura urbana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica adicionado ao contrato o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais) durante o prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor mensal passa a ser de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais) com anuidade em INPC de 0,50%.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MANEJO: [Assinatura]

YANDELI VOLT: [Assinatura]

DELVALLEIAI CONSTRUÇÕES DE ME: [Assinatura]

MUNICÍPIO DE GUARANIACU
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 18/2024

O MUNICÍPIO DE GUARANIACU, Paraná, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, para Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação via horizontal em diversas ruas do município.

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: até às 08:30h (horário de Brasília) do dia 12/09/2024. **ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** início às 09:00h (horário de Brasília) do dia 12/09/2024. LOCAL: Plataforma <https://licitacoes.org.br> (Bolsa Nacional de Compra) - Acesso Identificado. O certame reger-se-á pelas Leis nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 5.886/23, Decreto Estadual nº 10.886/2022 e demais aplicáveis. Locais de acesso: Salar de Licitações www.guaraniacu.pr.gov.br, a partir desta data. Informações com o Agente de Contratação do Comissão de Contratação e e-mail licitacoes@guaraniacu.pr.gov.br. Fone: (45-3232-1162).

PUBLIQUE-SE.

Guaraniacu, 26 de agosto de 2024.

OSMARIO DE LIMA PORTELA
Prefeito.

Cláudia Municipal de Nova Laranjeira
Estado do Paraná
Rua Pinheiro da Silva nº 112, Centro - CEP: 53300-000
Fone: (41) 3661-3725

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRA
ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024 - CMLN

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Laranjeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em face dos documentos e pareceres jurídicos, aprova a RATIFICAÇÃO a Dispensa de Licitação Nº 08/2024 - Câmara Municipal, cujo objeto é a realização de prestação de serviços de limpeza da Câmara Municipal (Voyage L& M, 01.06.2019/2024, flex. placa: AWX-1260), e ADJUDICAÇÃO à empresa DIKUCU WIELCZOKOWSKI - ME, CNPJ nº 09.001.1170001-99, sendo que a mesma apresenta o valor global de R\$ 8.793,25 (oito mil setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), este valor será pago em parcela única mediante a prestação dos serviços e emissão de nota fiscal.

Nova Laranjeira, 26 de agosto de 2024.

ADAO KREKANH PAULISTA:0502641966
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2024

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de Agosto de 2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede e Rua Marechal Deodoro, nº 100, CEP: 81.612-000/PR-13

CONTRATADO: EUCIMAR MOIOLINI JURULSKI, ME, inscrita no CNPJ nº 34.788.800/0001-89, com sede em Rua Aquilino Augusto Barz, 795, Bairro Nossa Senhora do Lázaro, Cx. 83, 81600-000, do Município de Marquinho, Estado do Paraná.

VALOR TOTAL: O preço global, após o ajuste das parcelas para execução do objeto do contrato, é de R\$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, O PROMOÇÃO.

PRazo DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

PRazo DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

FORD: Comissão de Licitação nº 08/2024.

Marquinho, Estado do Paraná, em 23 de Agosto de 2024.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP REGIONAIS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS E OUTROS MATERIAIS de consumo de caráter rotineiro para o Município de Coronel Vidua.

O Edital de Licitação nº 5/2024, publicado em 18 de setembro de 2024, encontra-se disponível no site www.licitacoes.org.br e no endereço eletrônico www.licitacoes.org.br. O prazo de entrega das propostas é até às 08h do dia 09 de setembro de 2024. A abertura das propostas será às 09h do dia 09 de setembro de 2024, no endereço eletrônico www.licitacoes.org.br. O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura das propostas. O valor máximo de cada lote é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor total das propostas não pode ultrapassar o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O valor máximo de cada lote é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor total das propostas não pode ultrapassar o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Coronel Vidua, 26 de agosto de 2024. Juliano Ribeiro, Diretor do Departamento de Licitação e Patrimônio.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

ADITIVO Nº 07 ao Edital nº 5/2024 - Concorrência Pública nº 25/2022 - Contratante: Município de Coronel Vidua; Contratada: F. ZANZANARO TERRAPLENAGEM LTDA; CNPJ nº 05.461.328/0001-26. Este Termo Aditivo tem por objeto o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica acrescido o valor de R\$ 521.891,16, devido a execução de drenagem, rampas para PNE nas calçadas, placas de sinalização, trecho de calçada em CBUQ e melhorias físicas. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vidua, 26 de agosto de 2024. Anderson Marques Barreto, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 5/2024 - Edital de Pregão Eletrônico nº 5/2024

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP REGIONAIS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS E OUTROS MATERIAIS de consumo de caráter rotineiro para o Município de Coronel Vidua.

O Edital de Licitação nº 5/2024, publicado em 18 de setembro de 2024, encontra-se disponível no site www.licitacoes.org.br e no endereço eletrônico www.licitacoes.org.br. O prazo de entrega das propostas é até às 08h do dia 09 de setembro de 2024. A abertura das propostas será às 09h do dia 09 de setembro de 2024, no endereço eletrônico www.licitacoes.org.br. O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura das propostas. O valor máximo de cada lote é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor total das propostas não pode ultrapassar o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Coronel Vidua, 26 de agosto de 2024. Juliano Ribeiro, Diretor do Departamento de Licitação e Patrimônio.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PARCERDA DE PREDEIRA E EQUIPE DE APOIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2024

DATA: 01/09/2024

ABERTURA: 19/08/2024

PROPOSTAS ATE: 08h

DISPUTA: 08h

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MOCHILAS E EPIs, conforme discriminado no Anexo 01, conforme o Edital nº 50/2024.

A publicação no site www.proc-administrativo.com.br em 06/08/2024, de acordo com o Edital nº 50/2024, regulamentado pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

Correio DO POVO DO PARANÁ

Assessoria de Comunicação Social

Correio
Sempre atualizado, sempre de perto.

WhatsApp: (41) 3661-3725

Instagram: @correiodopovo

Facebook: correiodopovo

Twitter: correiodopovo

YouTube: correiodopovo

Site: www.correiodopovo.com.br

As pessoas nunca buscaram por tanta informação.

Esse é o momento de você anunciar aqui.

Correio DO POVO DO PARANÁ

(42) 98428-1511

@correiodopovo

@correiodopovo

@correiodopovo

Fale com a gente

(42) 3635-2944

Correio DO POVO DO PARANÁ

SANGUE + DOAÇÃO

é ser sua vida viver em outra pessoa!

Correio DO POVO DO PARANÁ

Não finja que não vê!

Fuam abertos aos olhos de vocês também. Uma criança pode estar sofrendo!

Denúncia Disque 100

Correio DO POVO DO PARANÁ

O Jornal da Cantu

307.008

www.correiodopovo.com.br

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 206/2024**

SÚMULA: Exonera servidor contratado por prazo determinado

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, e a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019,

DECRETA

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

| Nome | CPF | Cargo | Matrícula | Data |
|---|----------------|-----------------------------|-----------|------------|
| PATRICIA CORREA DE MELLO SIEWERT | 090.277.119-17 | Agente Comunitário de Saúde | 37648 | 06/08/2024 |
| Regime: Especial Temporário Causa: Término de Contrato | | | | |

Art.2º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto no art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 26 de agosto de 2024.

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fabio Luis Malinowski Padilha
Código Identificador:1EB4528A

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA****DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO**

ADITIVO nº 07 ao Contrato nº 156/2022 – Concorrência Pública nº 25/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objeto o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA. Fica acrescido o valor de R\$ 521.891,18, devido a execução de drenagem, rampas para PNE nas calçadas, placa de sinalização, trecho de calçada em CBUQ e meios-fios novos. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 22 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Publicado por:

Iana Roberta Schmid
Código Identificador:56FAB9BA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2024**

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP SEDIADAS EM ÂMBITO REGIONAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS MATERIAIS. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h do dia 28 de agosto de 2024 até às 08h do dia 09 de setembro de 2024. Abertura das propostas após as 08h do dia 09 de setembro de 2024. Início da disputa de preços às 09h do dia 09 de setembro de 2024. **VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO:** R\$ 719.715,21. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvividapr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vivida, 26 de agosto de 2024.

JULIANO RIBEIRO,

Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.



Publicado por:

Leila Marcolina

Código Identificador:EAFA50C3

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO**

Aditivo nº 03 ao Contrato nº 57/2023 – Tomada de Preços nº 02/2023. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ nº 19.376.115/0001-03. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 90 dias, de 10.09.2024 a 08.12.2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 26 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Publicado por:

Iana Roberta Schmid

Código Identificador:06E1EACE

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO**

Aditivo nº 05 ao Contrato nº 92/2020 - Inexigibilidade nº 13/2020 - Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde – Contratada: INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ 17.340.842/0001-95. Prorroga-se a vigência do contrato por mais 30 dias, de 20 de agosto de 2024 a 19 de setembro de 2024. Conforme Portaria GM/MS nº 3.949/2024, que estabelece o reajuste dos valores de habilitação dos serviços de atenção domiciliar (EMAD), a serem incorporados ao limite financeiro de média e alta complexidade (MAC), fica aumentado a meta física financeira em R\$ 122.400,00, sendo R\$ 40.800,00 de ajuda de custos, mais 08 (oito) parcelas de R\$ 10.200,00, devido a alteração dos valores e considerando o art. 2º da Portaria GM/MS nº 3.949/2024, retroage o pagamento dos valores devidos, a partir da competência de janeiro a agosto de 2024. Pela prorrogação da vigência do contrato fica aumentado o valor de R\$ 34.000,00. Totalizando para este aditamento a quantia de R\$ 156.400,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 19 de agosto de 2024.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Publicado por:

Leila Marcolina

Código Identificador:17951532

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR
CMDCA EDITAL 18/2024****CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORONEL VIVIDA
EDITAL Nº 18/2024**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Coronel Vivida, no uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei Municipal nº. 2573/2014.

RESOLVE

Art. 1º - REVOGAR o Edital 16/2024 a partir de 24 de agosto de 2024.

Art. 2º - CONVOCAR, o Conselheiro Tutelar **Elevino da Conceição Rodrigues** – 1º colocado Suplente, para assumir o Cargo de Conselheiro Tutelar suplente no período de 27 de agosto de 2024 à 29 de setembro de 2024.
