



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2017



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, MEIO FIO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALCADAS EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DA OBRA, TOTALIZANDO 34.160,41 M²; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.

DATA: 24.10.17 ABERT: 24.11.17 HORÁRIO: 09:00hs

ANEXOS

--

--	--

--	--



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



OFÍCIO INTERNO Nº 093/2017

DE: INÉRIO KRAMBECK
Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Protocolo Interno n. <u>171, 17</u>
Em <u>13</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>17</u>

Funcionário

PARA: FRANK ARIEL SCHIAVINI
PREFEITO-MUNICIPAL

DATA: 11/10/2017

Senhor Prefeito:

Solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para a contratação de empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra, totalizando 34.160,41m², conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo.

O prazo para execução da obra é de 11 (onze) meses, contados da emissão da correspondente Ordem de Execução de Serviços.

Esta obra é decorrente de Projeto aprovado junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano – Projeto 38 – Operação de Crédito autorizada pela Lei Municipal nº 2760/2017.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DESTA OBRA

O município de Coronel Vivida está localizado na região Sudoeste do Estado do Paraná e, segundo o último censo do IBGE, conta com uma população total de 21.749 habitantes, sendo que 14.915 vivem na área urbana e 6.777 vivem na área rural. O seu IDH é de 0,775. O município é considerado o maior entroncamento rodoviário da região, servindo de passagem para quase todos os municípios do sudoeste, para os grandes centros e para a Capital do Estado. O projeto que ora estamos propondo irá contemplar a execução de RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES em





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



vias públicas integrantes do perímetro urbano da cidade de Coronel Vivida. As ruas selecionadas para a implantação do projeto são as que apresentam o maior nível deficitário na sua pavimentação, as quais tem um grande fluxo de pessoas que neles residem e que dependem do poder público para atender suas necessidades. Os municípios que pretendem se desenvolver nas mais diversas áreas devem se preocupar em proporcionar boas condições de infraestrutura necessária para sua plena funcionalidade, principalmente de pavimentação de suas ruas, facilitando o acesso e dando um aspecto urbano paisagístico de qualidade e com boa visualização, limpeza, organização, higiene e outras. Uma cidade limpa, pavimentada, além de proporcionar maior segurança para sua população, serve também de atrativo para maior desenvolvimento local e regional, atraindo novos investimentos causando impacto positivo. O projeto visa promover o acesso e a integração entre a área de intervenção e as áreas centrais da cidade, melhorando a qualidade de vida dos vividenses.

O valor total máximo estimado da licitação é de R\$ 3.071.211,99 (três milhões e setenta e um mil duzentos e onze reais e noventa e nove centavos).

Atenciosamente,



INÉRIO KRAMBECK

Departamento de Obras e Serviços Urbanos



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

Autorização para Licitação

Município : Coronel Vivida
Valor Viab.: R\$ 3.071.211,99

Nº Projeto : 38

Lote: 1

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com as características acima descritas.

Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão, deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente.

Alertamos que :


a) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para efetivação dos atos ora autorizados e, também, que este lote tem um valor total viabilizado de R\$3.071.211,99, com a seguinte composição financeira: Valor Financiável: R\$3.000.000,00; Adicional financeiro a cargo do município: R\$71.211,99;

b) Para a publicação do edital deverá ser obedecida a Instrução Normativa nº 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011, em anexo.

A publicação deverá ser feita imediatamente.

Curitiba , 03/10/2017

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado do Paraná


João Carlos Ortega
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano


Autorização para Licitação

Município : Coronel Vivida		Etapa : 010/17
Associação : AMSOP		Escritório Regional : Escritório Regional de Cascavel
Nº Projeto : 38		
Descrição : Lote 1 - Execução de 34.160,41 m ² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.		
Modalidade : Concorrência Nacional		Valor Viabilizado : R\$ 3.071.211,99
Nº do Convênio : 05.00.2002.0087		
Local do Objeto : Lote : 1 ==> Perímetro Urbano		
Indicadores : Lote : 1 ==> Calçadas 7610,39 m ² - Meio fio 6691,58 m - Área de Recape 34160,41 m ² -		
Objeto : Lote : 1 ==> Rua Leopoldo Schiavini (entre Rua Armindo Bernardo Pick e Rua Armindo José Gregolin) * Rua Luiz Ruffato (entre Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão) * Rua dos Caminhões (entre Prolongamento da Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão) * Rua Duque de Caxias (entre Rua Hermes Alcides Lunardi até o final do Lote 19 A da mesma Rua) * Rua 15 de Novembro (entre Rua Henrique Zanella e Rua Zefferino Poletto) * Rua Valdomiro Castro (entre Rua Jacó Fleck e Av. Generoso Marques) * Rua Dona Rosa Stédile (entre Rua Santa Catarina e Rua Tupi) * Rua das Azaleias (entre Rua Candido Inácio de Lima e Rua dos Canários) * Rua Duque de Caxias (entre Rua Luiz Bassan Mezzomo e Rua Doutor Ubaldino do Amaral) * Rua Antonio Inácio Rokemback (entre Rua Celeste Foppa e Rua Santa Catarina) * Rua Waldemar Antonio Fischer (entre Rua Clevelândia e Rua Antonio Inácio Rokemback) * Rua José Henrique de Freitas (entre Rua 15 de Novembro e Rua Luiz Costella) * Rua Luiz Costella (entre Rua Ângelo Colpani e Rua José Henrique de Freitas) * Rua Ângelo Colpani (entre Rua 15 de Novembro e Rua Clevelândia) * Rua Fioravante Panato (entre Av. Generoso Marques e Rua Candido Inácio de Lima) * Rua Giuseppe Guarnieri (entre Rua Antonio Schiavini e Rua Primo Zeni) *		

A V I S O I M P O R T A N T E

Com a Autorização para Licitação, estão sendo remetidos:

- CD contendo o Edital e demais anexos;
- **CD contendo a PLANILHA DE SERVIÇOS, MODELO Nº 08 (Tomada de Preços e/ou Concorrência Nacional); deverá ser entregue às proponentes por meio digital.**
- **Elementos Gráficos - deverá ser entregue às proponentes**
- CD contendo Modelo da Placa da Obra;
- Instrução Normativa nº 002/2011



ALERTAMOS QUE O EDITAL E SEUS ANEXOS NÃO PODERÃO SER ALTERADOS, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O PROCESSO LICITATÓRIO PODERÁ SER REVOGADO.

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado poderá ser feita diretamente pelo Município no site:

[www. Dioe.pr.gov.Br](http://www.Dioe.pr.gov.Br)

Qualquer dúvida entrar em contato com o Paranacidade:

Adriana Schweiger (41) 3350-3401
Silvana dos Anjos (41) 3350-3390

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2011

O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº15.211, de 17.07.2006 e o Estatuto da Entidade,

RESOLVE

1º) Estabelecer as seguintes regras básicas relativas aos procedimentos licitatórios, especificadamente as publicações, realizados pelo PARANACIDADE e também Municípios quando utilizarem recursos do Sistema de Ações Municipais (SFM):

1.1) Para licitações nas modalidades Concorrência e Tomada de Preços, será obrigatória a publicação do aviso, ao menos por uma vez, nos seguintes veículos de comunicação:


- a) Diário Oficial do Estado do Paraná;
- b) jornal diário de grande circulação no Estado do Paraná;
- c) jornal local ou regional, se houver, e
- d) internet se possível.

2º) O PARANACIDADE providenciará a publicação das autorizações para licitação na internet.

3º) As licitações autorizadas a partir desta data e que não observarem o disposto nesta Instrução Normativa não serão aprovadas.

4º) Fica revogada a Instrução Normativa de nº 02/2004.

Curitiba, 04 de abril de 2011.


CEZAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
Superintendente do PARANACIDADE



PROCESSO LICITATÓRIO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Após a licitação encaminhar cópias dos documentos abaixo relacionados à Procuradoria Jurídica do Paranacidade:

- Portaria designando a comissão de licitação;
- Edital, somente as 04 (quatro) primeiras páginas;
- Parecer jurídico do edital;
- Publicações do aviso (necessário constar o nome do jornal e data);
- Atas;
- Declaração das proponentes declinando do prazo recursal (se houver);
- Recurso, contrarrazões e decisão (se houver);
- Relatórios;
- Edital de habilitação;
- Edital de classificação;
- Proposta comercial da empresa vencedora;
- Planilha de orçamento e cronograma físico financeiro (obras/pavimentação) ou características técnicas preenchidas pela empresa (equipamentos)
- Declaração de inexistência de recursos.

COMUNICAÇÃO

O Município poderá homologar e contratar o objeto licitado, somente após o recebimento da "AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO", emitida pelo Paranacidade.

Ainda, como condição para cadastrar os contratos firmados, o Município deverá encaminhar, além do contrato devidamente firmado e a publicação de seu extrato, a prova da efetivação da garantia de execução contratual, quando tal exigência existir no contrato (cláusula nona).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

OBRA: RUA LEOPOLDO SCHIAVINI, RUA DOS CAMINHOES, RUA LUIZ RUFATTO, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA VALDOMIRO CASTRO, RUA DONA ROSA STEDILE, RUA DAS AZALEIAS, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA ANTONIO ROKEMBAK, RUA WALDEMAR ANTONIO FISCHER, RUA JOSE HOFMANN DE FREITAS, RUA LUIZ COSTELA, RUA ANGELO COLPANI, RUA GUIOSEPE GUARNIERI, RUA FIORAVANTE PANATTO.

DISPOSIÇÕES GERAIS

01 – EXECUÇÃO DA OBRA

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, a ser instaurada pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/PR.

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás.

02 – NORMAS GERAIS

2.1 – Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de Custos, sendo parte integrante do contrato de obra;

2.2 – Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõem o Projeto de construção deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.513 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



2.3 – Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciados pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuência expressa do autor dos projetos, que poderão exigir informações complementares, testes ou análises para embasar Parecer Técnico Final à sugestão alternativa;

2.4 – Os materiais e/ou serviços não previstos nestas especificações constituem casos especiais, devendo ser apreciados pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

2.5 – Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável técnico da empresa proponente.

2.6 – São Obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico:

- a) Obedecer às normas e Leis de higiene e segurança de Trabalho;
- b) Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;
- c) Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;
- d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvarás, certidões, licenças, evitando interrupções por embargos;
- e) Manter serviço ininterrupto de vigilância de obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma;
- f) Providenciar a colocação de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, CREA e outros;
- g) Apresentar no final da obra a documentação exigida no contrato de empreitada global;
- h) Para a execução da obra, objeto destas especificações técnicas, fica sob a responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.



03 – FISCALIZAÇÃO

3.1 – A fiscalização dos serviços será feita pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

3.2 – A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, deverá estar registrado no CREA – PR como responsável técnico da obra;

3.3 – Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens ou em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição será precedida dentro de vinte e quatro horas.

3.4 – Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira.

3.5 – A presença da fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislação pertinente;

3.6 – Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos serviços, bem como um livro diário de obras;


EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15.913 IMPR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ



04 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

4.1 – As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos;

4.2 – Em caso de dúvida sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;

4.3 – A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras de propriedade da prefeitura municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira;

05 – INSTALAÇÃO DA OBRA

5.1 – Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias a execução dos serviços provisórios, e a colocação da placa de obra com as indicações do projeto, conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

6.0 – DEMOLIÇÃO

6.1 – Os serviços previstos de demolição de rampas são oriundos das rampas que avançam a pista de rolagem, comuns em entradas de veículos, sendo que as mesmas deverão ser demolidas e retiradas do local, observando um local apropriado indicado pelo Município de Coronel Vivida para o destino final dos materiais;

7.0 – MEIO FIO

A principal característica do meio-fio é a de constituir um obstáculo ou uma separação entre o tráfego de veículos na faixa de rolamento e o trânsito de pedestres nos passeios.

O meio-fio tem ainda por função delimitar a faixa de rolamento da via pública e os passeios laterais ou refúgios centrais, protegendo-os e mantendo-lhes os bordos alinhados. Além disso, constitui uma ótima referência para o tráfego de veículos, pois orienta os seus condutores indicando-lhes as linhas extremas de faixa onde ele é permitido; é assim, também, um elemento indispensável à segurança dos transeuntes, nos passeios e nos refúgios centrais.

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913-D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ



7.1 – Nas ruas objeto do projeto que são compostas por meio fio existentes em concreto, os mesmos deverão ser cuidadosamente realinhados antes das ruas serem asfaltadas, observando o rebaixamento dos mesmos nas entradas de veículos, sendo que no momento do serviço a quebra e substituição por erro ou descuido é de responsabilidade da executora;

7.2 – Nas ruas objeto do projeto que são compostas por meio fio existentes em concreto, foram contempladas substituição das peças de meio pois alguns trechos encontram-se em estado crítico, quebradas ou em fase de esfarelamento portanto os mesmos deverão ser retirados e depositados no Departamento de Viação Obras e Urbanismo sendo posteriormente substituídos por Meio fio pré-moldados em concreto com dimensões de 12x15x30x100cm, e observando o rebaixamento dos mesmos nas entradas de veículos; de veículos;

8.0 – REVESTIMENTO

Este projeto trata da Pavimentação asfáltica (CBUQ), sobre pavimentação poliédrica existente.

Os serviços deverão ser executados conforme especificações definidas em projeto, as dúvidas serão sanadas pela fiscalização na época da execução dos serviços.

A execução do recapeamento compreende as seguintes etapas:

a) Limpeza e Lavagem da Pista:

Este serviço considera na limpeza completa do local onde será executada a pavimentação. Prevendo a remoção transporte e destinação de todo material solto (terra, pedra, entulhos, etc.) incluindo as rampas em concreto que possam comprometer a estabilidade da pavimentação.

O serviço só será aceito após vistoria da fiscalização indicada pela Prefeitura Municipal. A fiscalização determinará se o serviço atende as normas definidas e se poderá ser aceito ou não.

b) Pintura de Ligação com Emulsão

Após a limpeza será feita a primeira demão de Pintura de Ligação com RR-1C, em toda a área a pavimentar, para que as camadas de CBUQ tenham aderência à pavimentação já existente;

Após o reperfilamento em CBUQ estar executado será feita a segunda demão de para Pintura de Ligação com RR-1C, em toda a área, para que as próximas camadas de CBUQ tenham aderência à primeira camada de pavimentação;



c) Reperfilamento (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 – 5,7%, espalhada e comprimida a quente.

O reperfilamento será executado com tempo ensolarado sobre a pintura de ligação já existente, em uma camada de 2cm (dois centímetros) com densidade de 2,5 t/m³ (toneladas por metro cúbico), espalhado com motoniveladora e compactada com rolo de Pneu e com Rolo compactador. O rolo de Pneu e o rolo compactador liso deverão passar em torno de três vezes sobre o trecho de maneira a ser compactado homogeneizadamente.

A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

d) Capa de Rolagem (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, desagregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-50/70 – 5,7%, espalhada e comprimida a quente.

A capa de Rolagem será executado será executado com tempo ensolarado em concreto usinado CBUQ sobre a camada de reperfilamento e pintura de ligação já existente, em uma camada de 4cm (quatro centímetros) com densidade de 2,5 t/m³ (toneladas por metro cúbico); espalhado com vibroacabadora e compactada com rolo de Pneu e com Rolo compactador. O rolo de Pneu e o rolo compactador liso deverão passar em torno de três vezes sobre o trecho de maneira a ser compactado homogeneizadamente.

A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.

e) Aceitação dos Serviços

A aceitação final dos serviços será mediante apreciação visual e com testes a serem julgado satisfatórios pela fiscalização, assim como também a largura do pavimento e espessura média da pavimentação;

9.0 – SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

9.1 – Sinalização Vertical

Euclides Luiz Weiss
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.513/D/PR



Serão colocadas placas de sinalização vertical do tipo de a preferência, PARE, PROIBIDO ESTACIONAR ou PROIBIDO ESTACIONAR E PARAR, em lugares estipulados pelo projeto;

As placas deverão seguir as normas do Código de Trânsito Brasileiro;

9.2 – Sinalização Horizontal

Serão executadas as pinturas na pavimentação, conforme projeto;

O material usado (tinta) deverá atender às especificações : NBR 11862- Tinta para Sinalização Horizontal de Resina Acrílica, da ABNT.

Sua resistência deverá seguir a tabela abaixo;

ESPESSURA	VMD	DURAÇÃO
0,6 mm	20.000	24 meses

10 – IDENTIFICAÇÃO

10.1 – Identificação da obra – Placa da Obra

Será colocada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, seguindo os padrões do Paraná Cidade em um dos trechos que recebera o recapeamento asfáltico.

10.2 - Identificação de Logradouro

Serão colocadas placas de identificação do logradouro nos locais e quantidade pré-definidas em projeto nas ruas que receberão o recapeamento asfáltico.

11 – CONTROLE DE QUALIDADE

É obrigatório o controle tecnológico, das obras de pavimentação asfáltica, sendo indispensável à apresentação de Laudo Técnico de Controle Tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de "Análise dos Resultados", descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverão constar o numero da ART correspondente, podendo ser única para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence à amostra.



12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS


Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento anexo.


Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os tipos de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalização do Município.


Toda e qualquer modificação do tipo material e serviço constantes dos documentos que integram o Projeto Executivo, somente poderão ser executados com autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medições dos serviços ficarão sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 11 de Setembro de 2017.



EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil
CREA-PR 16.913/D

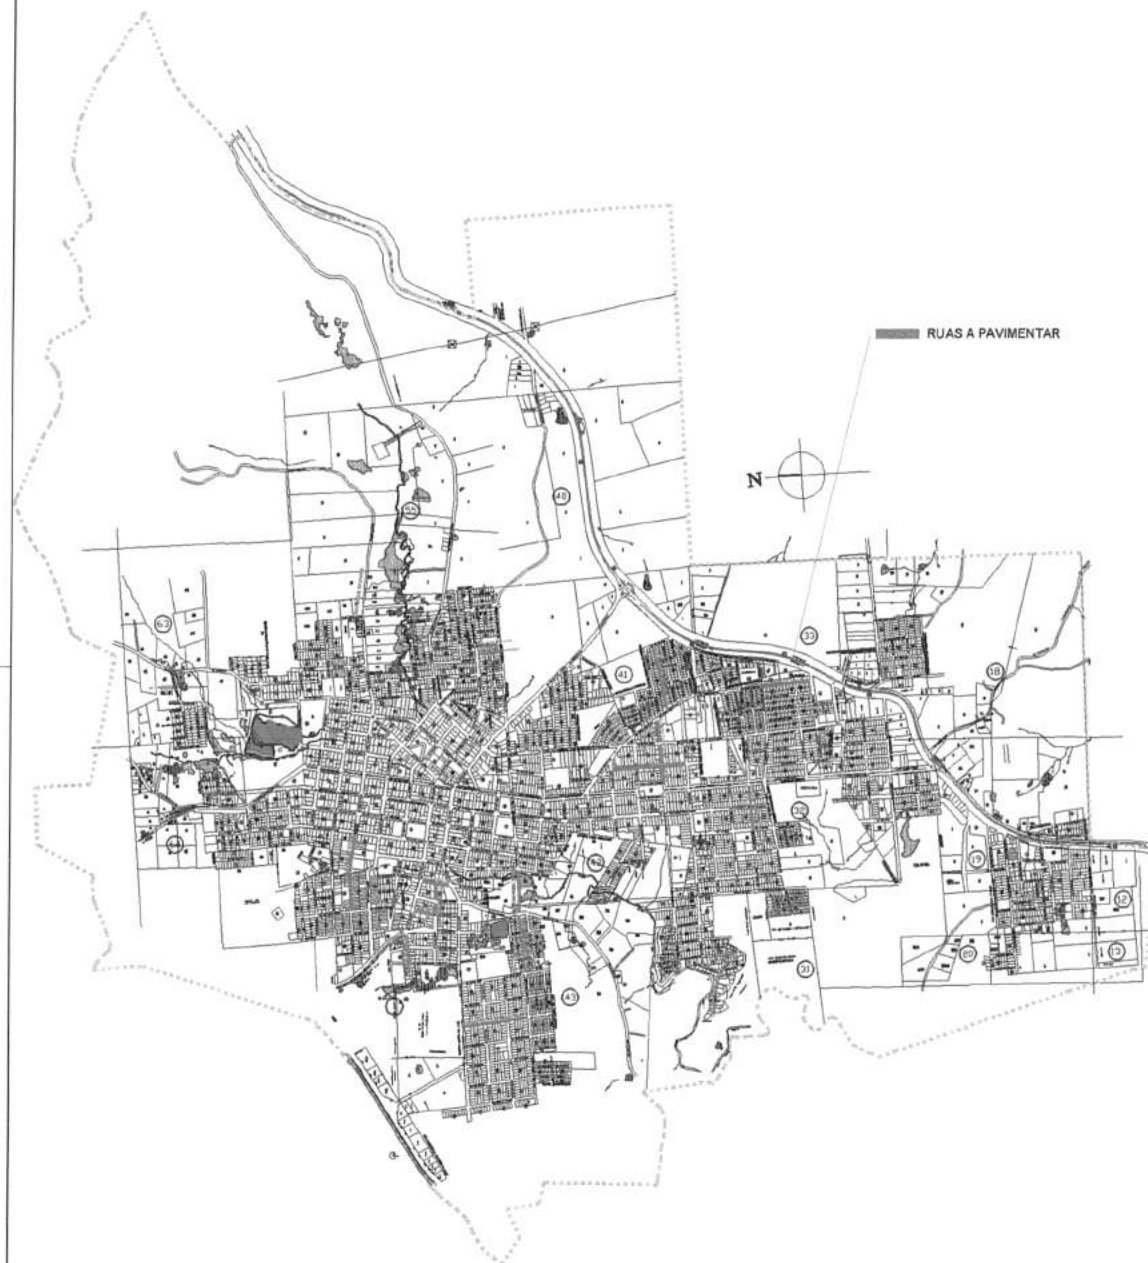

LOCALIZAÇÃO
5 / Folha

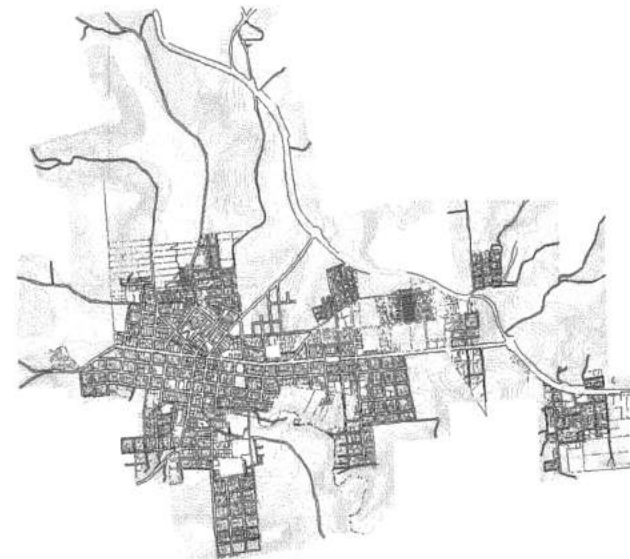

CURVAS DE NÍVEL - BACIA DE CONTRIBUIÇÃO
5 / Folha


 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Direção de Estudos e Projetos Praça Angelo Naccato, s/nº Coronel Vivida - Paraná (41) 3320-8320 - 3320-8034		
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES		
Endereço da Obra: DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE CORONEL VIVIDA - PR		
Responsável Técnico:  FRANK ARIEL SCHIAVINI Prefeito Municipal	Título da Obra: LOCALIZAÇÃO - CURVAS DE NÍVEL	Data: 31.08.2017
Responsável Técnico:  EUDENE LUIZ WEISS Engenheiro Civil - CRP 10.000	ART: 20173948296 Caracterização: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA Desenhado: Douglas Stramazzini	Assinatura: 01/17






SITUAÇÃO
ESCALA: 1:500

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°59'46.37" S	52°33'39.35" W
P2 25°59'54.95" S	52°33'38.32" W

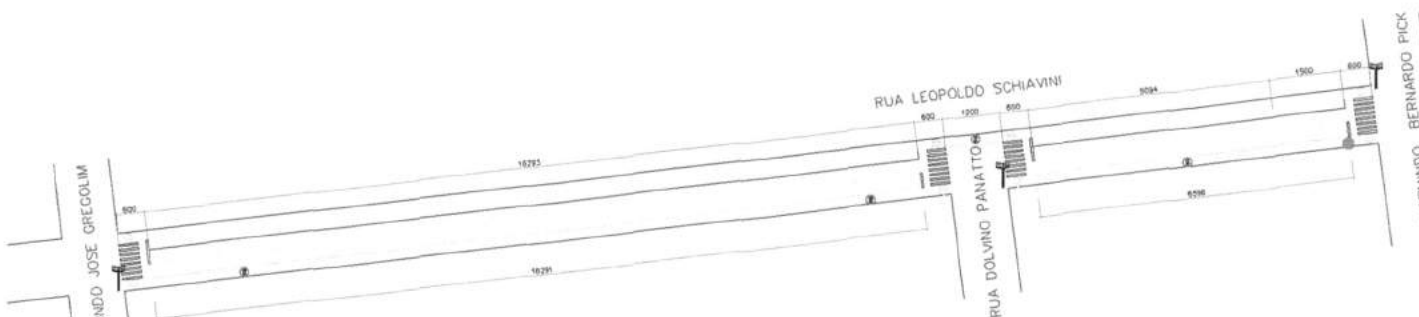

SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:500

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULOS
- ▲ RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADAS EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA
- CALÇADAS EXISTENTES
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MÉDIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

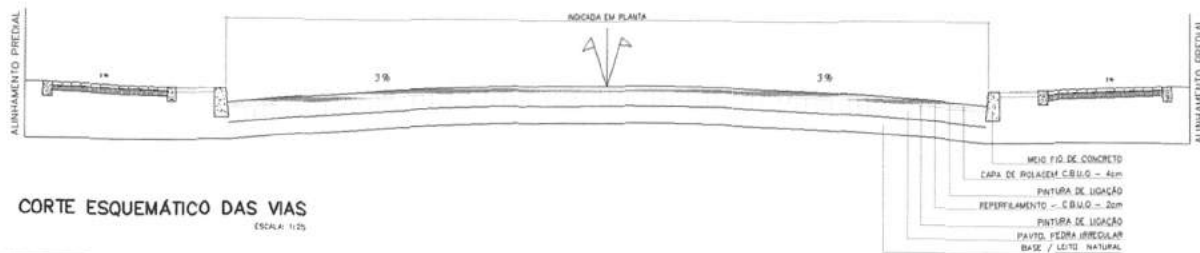

CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS
ESCALA: 1:25


 MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Praça Angelo Mazzoni, s/nº Coronel Vívda - Paraná (41) 3210-8020 - 3230-8938		
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Endereço da Obra: RUA LEOPOLDO SCHIAVINI		
Responsável Técnico:  LEOPOLDO SCHIAVINI Prefeito Municipal	Título dos projetos: - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Data: 21.06.2017 Assinatura: Indeciso
Responsável Técnico:  EUGÊNIO LUIZ WEBER Eng. Civil - CRP 10.180	ART: 20173948296 Descrição: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA Desenhista: Douglas Stragorotto	Data: 02/17





SITUAÇÃO

ESCALA: 1:500

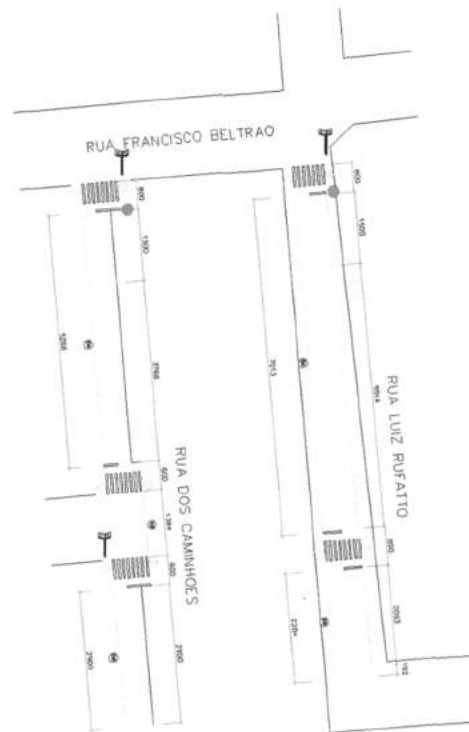


SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1:500

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°58'58.02" S	52°33'31.19" W
P2 25°59'01.55" S	52°33'30.67" W
P3 25°59'58.23" S	52°33'32.73" W
P4 25°59'01.71" S	52°33'32.48" W


- ▲ ENTRADA DE VEÍCULOS
- ▲ RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADÃO EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA
- CALÇADÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO


MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Projeto: Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Coronel Vívda - Paraná 18.033.012 - 33.34.004	
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Endereço da Obra: RUA DOS CAMINHOS E RUA LUIZ RUFATO	
Projeto: 20173948296 Assinatura: Engenheiro: FRANK ADEL SCHIAPIN Projeto Municipal	Assinatura: Arquiteto: FRANK ADEL SCHIAPIN Projeto Municipal
Assinatura: Desenhista: FRANK ADEL SCHIAPIN Projeto Municipal	Assinatura: Desenhista: FRANK ADEL SCHIAPIN Projeto Municipal
Assinatura: Desenhista: FRANK ADEL SCHIAPIN Projeto Municipal	Assinatura: Desenhista: FRANK ADEL SCHIAPIN Projeto Municipal

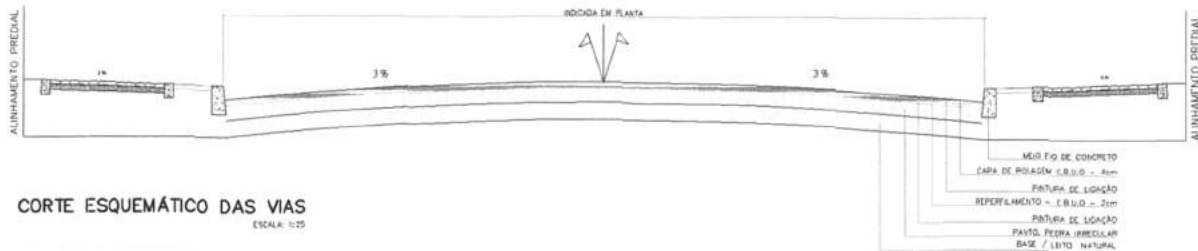

CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS

ESCALA: 1:25




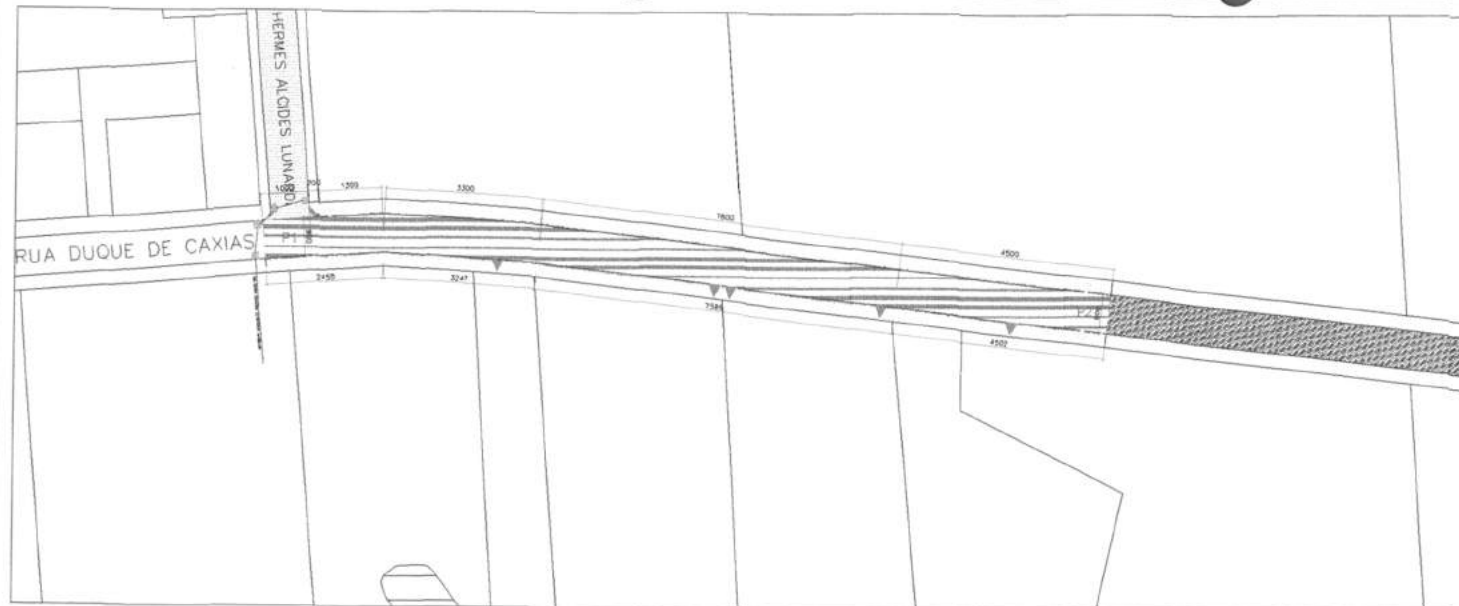

SITUAÇÃO

ESCALA: 1:500

COORDENADAS GEOGRÁFICAS		
	LATITUDE	LONGITUDE
P1	25°58'38.71" S	52°33'25.62" W
P2	25°58'39.30" S	52°33'19.22" W

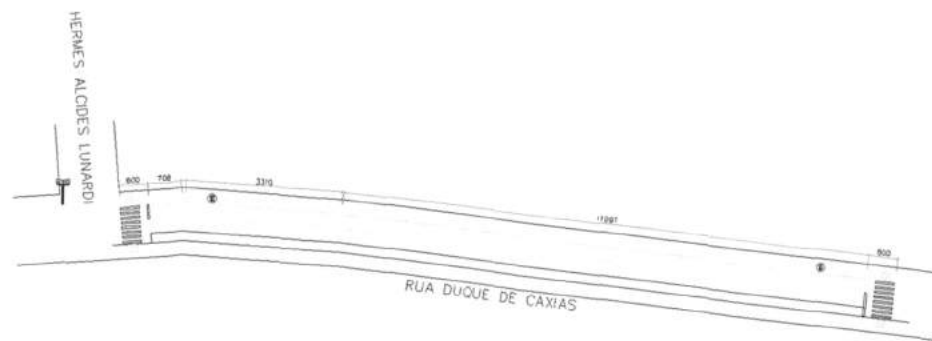


SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1:500

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULOS
- ▲ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRMICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADAS EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA
- CALÇADAS EXISTENTES
- PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRMICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Divisão de Engenharia e Projetos Rua do Engenheiro João de Deus, 100 Coronel Vivida - Paraná CEP: 83200-000 - Fone: (41) 3230-8100	
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Endereço do Obeto: RUA DUQUE DE CAXIAS	
Data da obra: - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - CORRETORETO DE SINALIZAÇÃO - COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Data: 31/06/2017 Elaboração: Engenheiro: ARCEL SCHIAVINI Projeto: Municipal
Responsável Técnico: Engenheiro: ELIUDS GOMES VAS CREA: 010/2017	ART: 20173948296 Especificação: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA Data: 31/06/2017

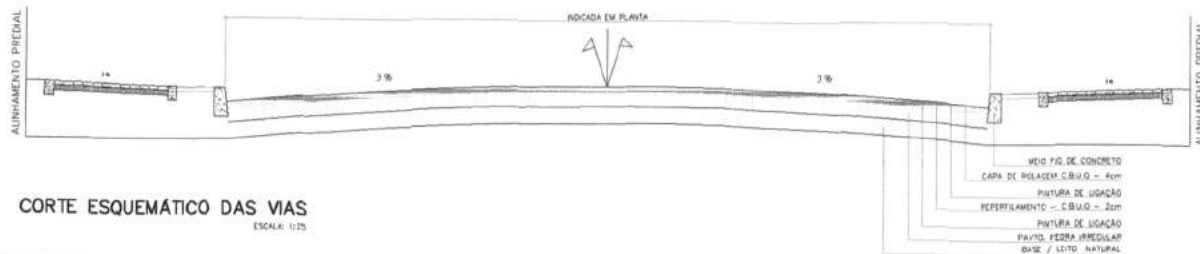

CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS

ESCALA: 1:20

MEIO FIO DE CONCRETO
 CAPA DE BOLADEN C.B.U.Q. = 4cm
 PINTURA DE LIGAZÃO
 REPERTEAMENTO - C.B.U.Q. = 2cm
 PINTURA DE LIGAZÃO
 PAVTO. PEDRA IRREGULAR
 BASE / LEITO NATURAL




SITUAÇÃO

ESCALA: 1:500



SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1:500



CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS

ESCALA: 1:25



COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°58'45.72" S	52°34'25.27" W
P2 25°58'46.19" S	52°34'30.70" W

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULOS
- ▲ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADAS EM LAJOTA PREFABRICADA
- CALÇADAS EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LOUÇO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO


MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Rua do Comércio, 100 - Centro - Coronel Vívda - Paraná CEP: 81.200-000	
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Endereço do Oito: RUA 15 DE NOVEMBRO	
Título dos documentos: - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Data: 21.06.2017
Assinatura: TIAGO APERT SCHIAVINI Prefeito Municipal	Assinatura: DOUGLAS STRASSMANN Engenheiro de Arquitetura
ART: 20173948296	Indicador: 05/17



SITUAÇÃO

ESCALA: 1:500


COORDENADAS GEOGRÁFICAS		
LATITUDE	LONGITUDE	
P1 25°59'44.29" S	52°33'57.66" W	0111
P2 25°59'45.75" S	52°34'17.30" W	0111

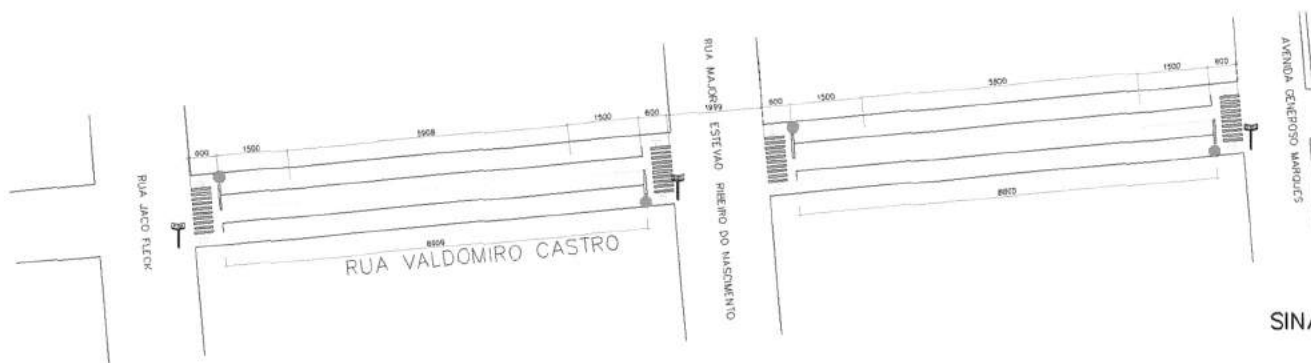

SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1:500

- ENTRADA DE VEÍCULOS
- RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO FOLDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CAIÇADAS EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA
- CAIÇADAS EXISTENTES
- PAVIMENTAÇÃO FOLDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BORDA DE LORO EXISTENTE
- GALEIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE NOVO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO




CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS

ESCALA: 1:25


- NOVO FIO DE CONCRETO
- CAPA DE POLIACETILENO - 4cm
- PINTURA DE LACAGEM
- REPERTEMENTO - C.B.U.Q. - 2cm
- PINTURA DE LACAGEM
- PAVIMENTO PEDRA IRREGULAR
- BASE / LITO NATURAL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Praça Angelo Mazzoni, nº 4 Coronel Vivida, Paraná CEP: 83200-000 - Fone: (41) 3232-0000	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Endereço da Obra: RUA VALDOMIRO CASTRO	
Responsável Técnico: ROBERTO SCHIAVINI Profissional M.º 01000	Data: 31.08.2017 Estado: Indicado Projeto: 06/17
Responsável Técnico: ROBERTO SCHIAVINI Profissional M.º 01000	ART: 20173948296 Classificação: PROVETO BÁSICO DE ARQUITETURA Desenhado: Douglas Strassman

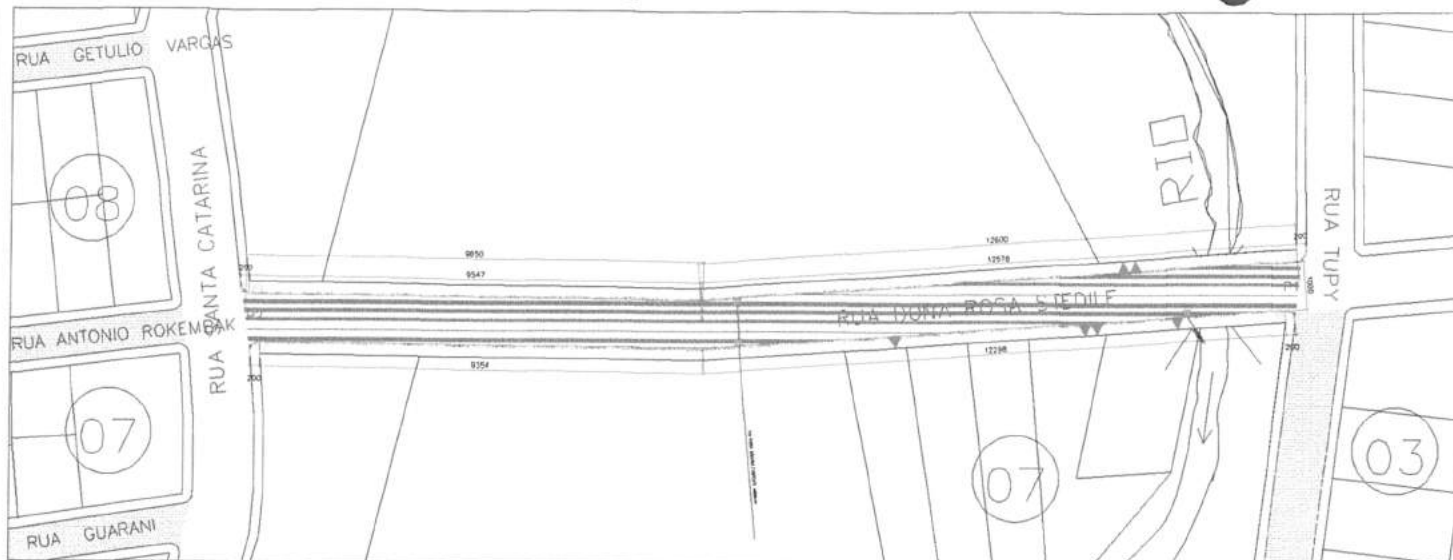


SITUAÇÃO
ESCALA: 1:500

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°59'04.72" S	52°34'13.35" W
P2 25°59'04.89" S	52°34'21.39" W

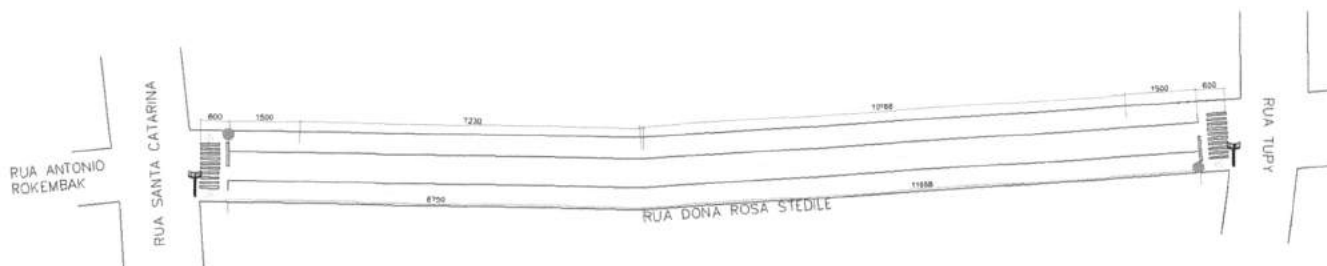

SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:500

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULO
- ▲ RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADA EM LAJOTA PRE-FABRICADA
- CALÇADA EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LODO EXISTENTE
- DALLA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

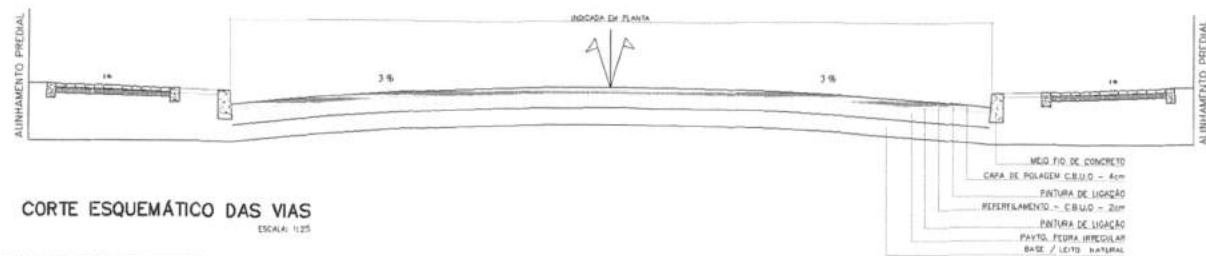

CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS
ESCALA: 1:25

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PARANÁ
Divisão de Estudos e Projetos
Projeto: Rua Dona Rosa Stedile, nº 1
Coronel Vídva - Paraná
14.02.2017 - 17.02.2017

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES
Código do Projeto: RUA DONA ROSA STEDILE


Elaborado por: **RICARDO LUIZ MARIANO**
Projeto Municipal

Responsável Técnico: **RICARDO LUIZ MARIANO**
Projeto Municipal

ART: 20173948296
Especificação: **PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA**
Desenho: **Augusto Strazzeron**

31.08.2017
Indicador: **07/17**




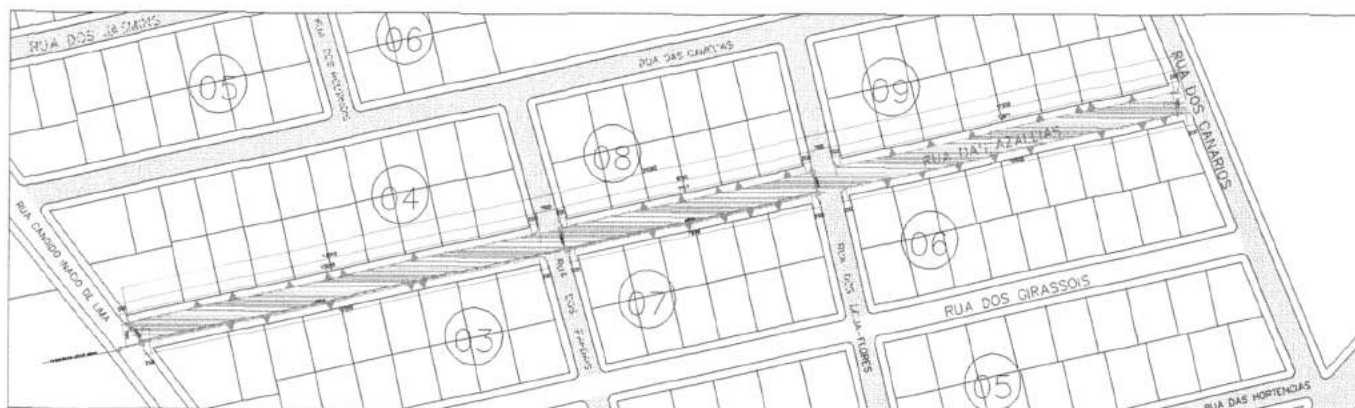

SITUAÇÃO

ESCALA: 1:750


COORDENADAS GEOGRÁFICAS		
LATITUDE	LONGITUDE	
P1 25°59'30.54" S	52°33'43.26" W	0"
P2 25°59'28.28" S	52°33'1.49" W	0"

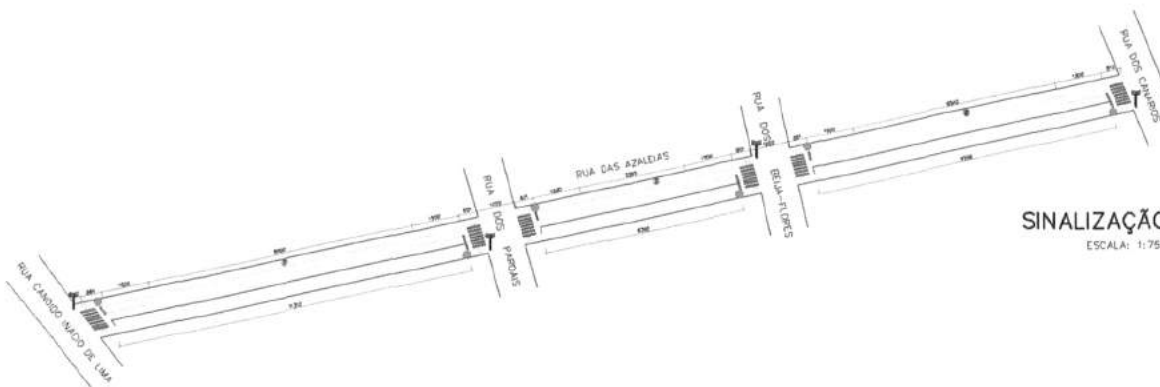

SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1:750

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULO
- ▲ RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADAS EM LAJOTA PRE-FABRICADA
- CALÇADAS EXISTENTES
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE REG.FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

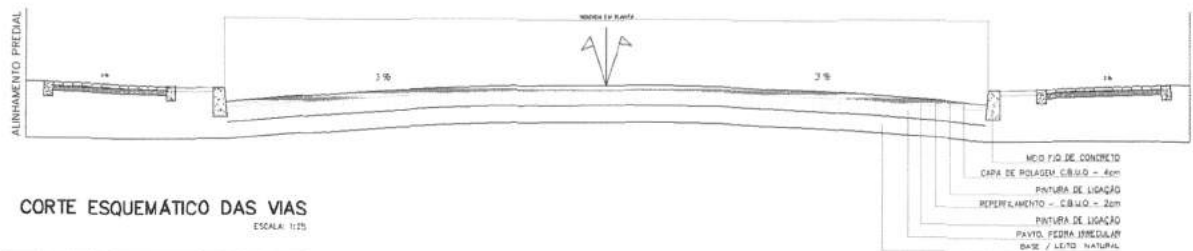


CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS

ESCALA: 1:25

MEIO FIO DE CONCRETO
CAPA DE PAVT. C.B.U.D. - 4cm
PINTURA DE LIGAÇÃO
REFORÇAMENTO - C.B.U.D. - 20cm
PINTURA DE LIGAÇÃO
PAVTO, PEDRA IRREGULAR
BASE / LEITO NATURAL


MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Rua dos Caracaras, 404 Coronel Vivida, Paraná (41) 3578-4000 - 3578-4001		PROPOSTA	
		RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	
Objeto do Estudo: RUA DAS AZALÉIAS		Trabalho de Projeto: - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
Responsável Técnico: FRANK ENEL SCHUBERT Profissional Municipal		ART: 20173948296	
Desenhista: JOSEFA LOPES DE OLIVEIRA Profissional Municipal		Desenho: Douglas Strassmann	
Assinatura do Projeto:		Data: 31.07.2017 Assinatura: [Assinatura] Data: 08/17	



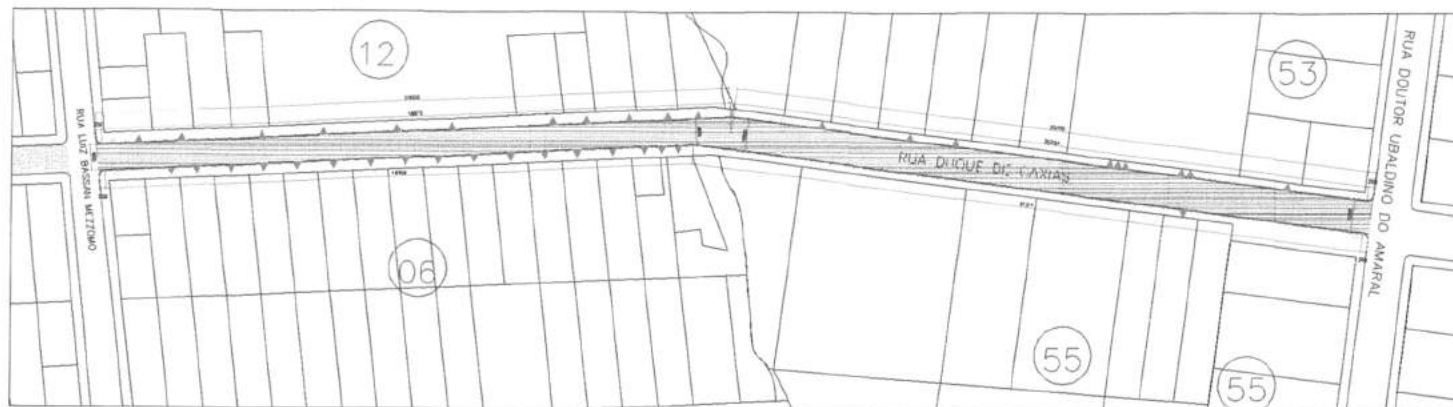


ESCALA: 1:750

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°59'46.37" S	52°33'39.35" W °
P2 25°59'54.95" S	52°33'38.32" W °



ESCALA: 1:750



Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângela Nicotri, 517
Cidade Velha - Paraná
(41) 3333-6000 - 3333-6006

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Endereço do Obra:

RUA DUQUE DE CAXIAS

	Traço dos pontos - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO DAS VAS - COORDENADAS GEODRÁFICAS
---	---

Date:	31 07 2017
-------	------------

14-00000

Responsive Story

ENCLOSURE

ART: 20173948296

Specification	
---------------	--


PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

Devin: Douglas Strickland



FRANCHE	
---------	--

09/17

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

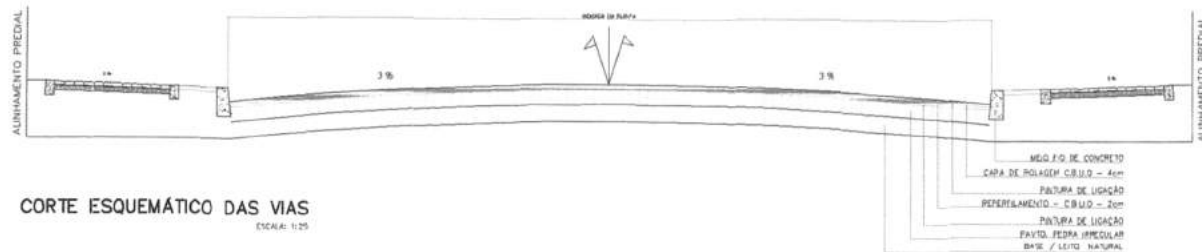


ESCALA: 1:25

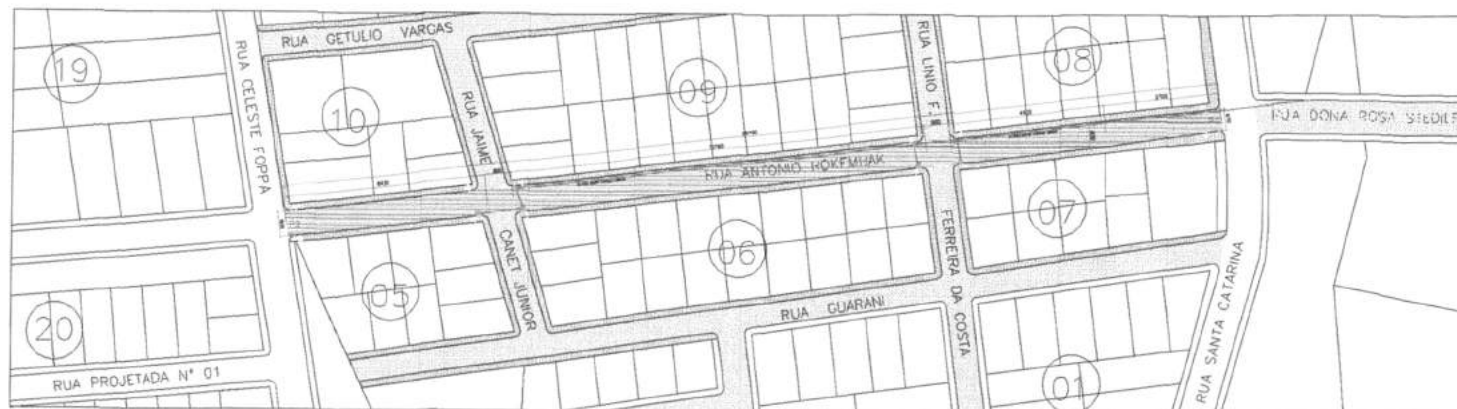


SITUAÇÃO
ESCALA: 1:750

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°59'04 93" S	52°34'22 16" W
P2 25°59'06 89" S	52°34'32 25" W

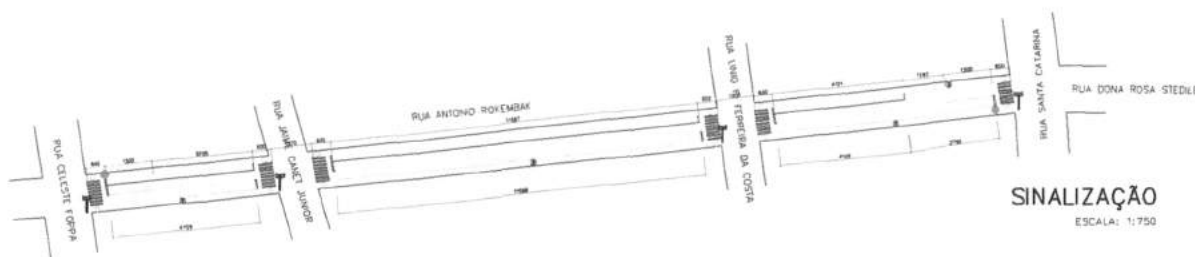

SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:750

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULOS
- ▲ RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADAS EM LAJOTA PRE-FABRICADA
- CALÇADAS EXISTENTES
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LAGO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIDADE

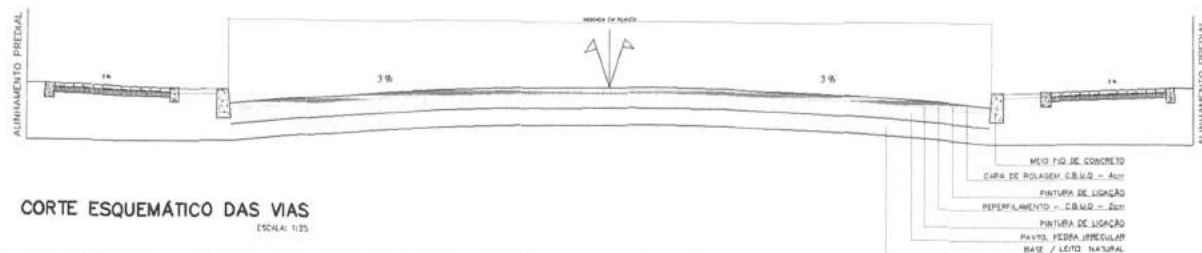

CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS
ESCALA: 1:25


 MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ Direção de Estudos e Projetos Praça Augusto Maccioni, 44 Coronel Vivida - Paraná (41) 3502-8000 - 3502-4008	
Empreendimento: RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	
Endereço do Obra: RUA ANTONIO ROQUEMBAU	
Autorização: VALDIR ANTONIO SCHIAVIN Prefeito Municipal	Data: 31.07.2017
Responsável Técnico: DOUGLAS STRASSIERO Engenheiro de Obras	Data: 31.07.2017
Descrição do Projeto: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA	Data: 10/17



SITUAÇÃO

ESCALA: 1:750


COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°50'55.40" S	52°34'42.47" W
P2 25°59'06.27" S	52°34'40.68" W

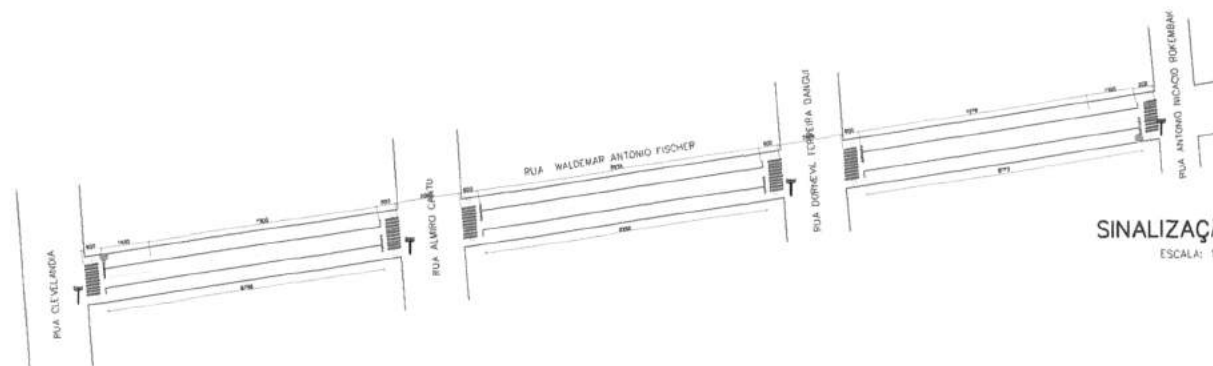

SINALIZAÇÃO

ESCALA: 1:750

- ENTRADA DE VEÍCULOS
- RAMPAS DE ACESSO/SAÍDA
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRMICA EM BASALTO EXISTENTE
- CAIÇADAS EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA
- CAIÇADAS EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRMICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BORDA DE LOBO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MDO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO



CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS

ESCALA: 1:25

MDO FIO DE CONCRETO
CAPA DE POLIESTER C.B.U.S. - 4cm
PINTURA DE LIGAÇÃO
REPERTEMENTO - C.B.U.S. - 2cm
PINTURA DE LIGAÇÃO
PAVTO. PEDRA IRREGULAR
BASE / LEITO NATURAL

SITUAÇÃO


ESCALA: 1:750

		MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Praça Angelo Medeiros, 404 Centro - Coronel Vivida - Paraná (41) 3231-4121 - 3231-4034	
Empreendimento: RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES			
Endereço da Obra: RUA WALDEMAR ANTONIO FISCHER			
Responsável Técnico: ENG. MARCELO SCHIAVINI Engenheiro Civil	Título dos pontos: - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - DORT. ESQUEMÁTICO DAS VIAS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Data: 31.07.2017	Estor: Indefinido
Responsável Técnico: ENG. LUIZ VITOR Engenheiro Civil	ART: 20173948296 Especialização: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA Desenhado: Douglas Romagnolo	Folha: 11/17	






SITUAÇÃO
ESCALA: 1:500

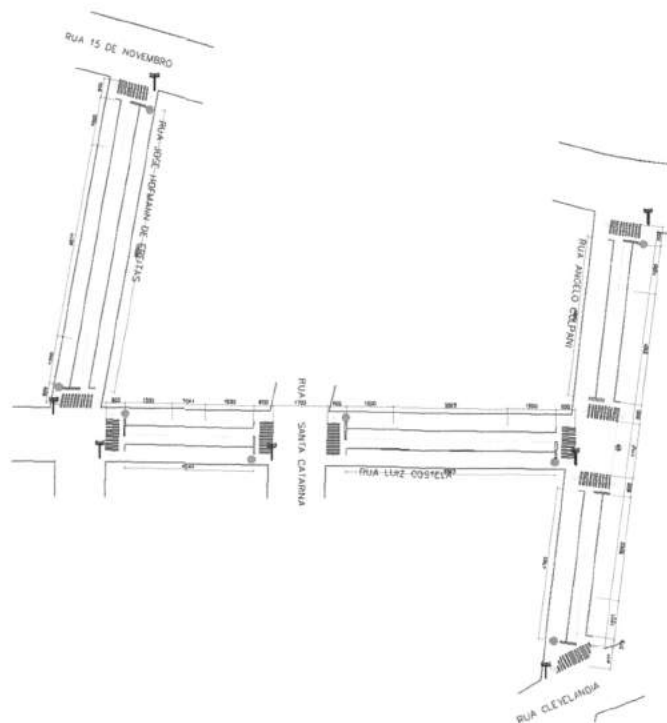

SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:750

COORDENADAS GEOGRÁFICAS		
	LATITUDE	LONGITUDE
P1	25°58'48.47" S	52°34'15.24" W
P2	25°58'53.07" S	52°34'15.86" W
P3	25°58'50.70" S	52°34'15.95" W
P4	25°58'50.62" S	52°34'18.73" W
P5	25°58'50.68" S	52°34'19.61" W
P6	25°58'50.59" S	52°34'21.15" W
P7	25°58'50.26" S	52°34'21.44" W
P8	25°58'47.26" S	52°34'20.67" W

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULOS
- ▲ RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADAS EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA
- CALÇADAS EXISTENTES
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO



CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS
ESCALA: 1:25


MEIO FIO DE CONCRETO
CAPA DE PISAGEM C.B.U.D. - 4cm
PINTURA DE LIGACÃO
REPERTEAMENTO - C.B.U.D. - 2cm
PINTURA DE LIGACÃO
PÁVITO, PEDRA IRREGULAR
BASE / LEITO NATURAL

 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Praça Angola Macaço, 404 Coronel Vivida - Paraná (41) 3120-4333 - 3332-4036		
RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Endereço do Obra: RUA JOSE HOFMANN DE FREITAS, RUA LUIZ COSTELA E RUA RUA ANIELLO COLPANI		
Responsável Técnico: FRANCISCO SCHIAVINI Profissional	Data de entrega: - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS ART. 20173948296 PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA Desenhado: Douglas Strassburg	Data: 31.07.2017 Assinatura: 12/17






SITUAÇÃO
ESCALA: 1:1000

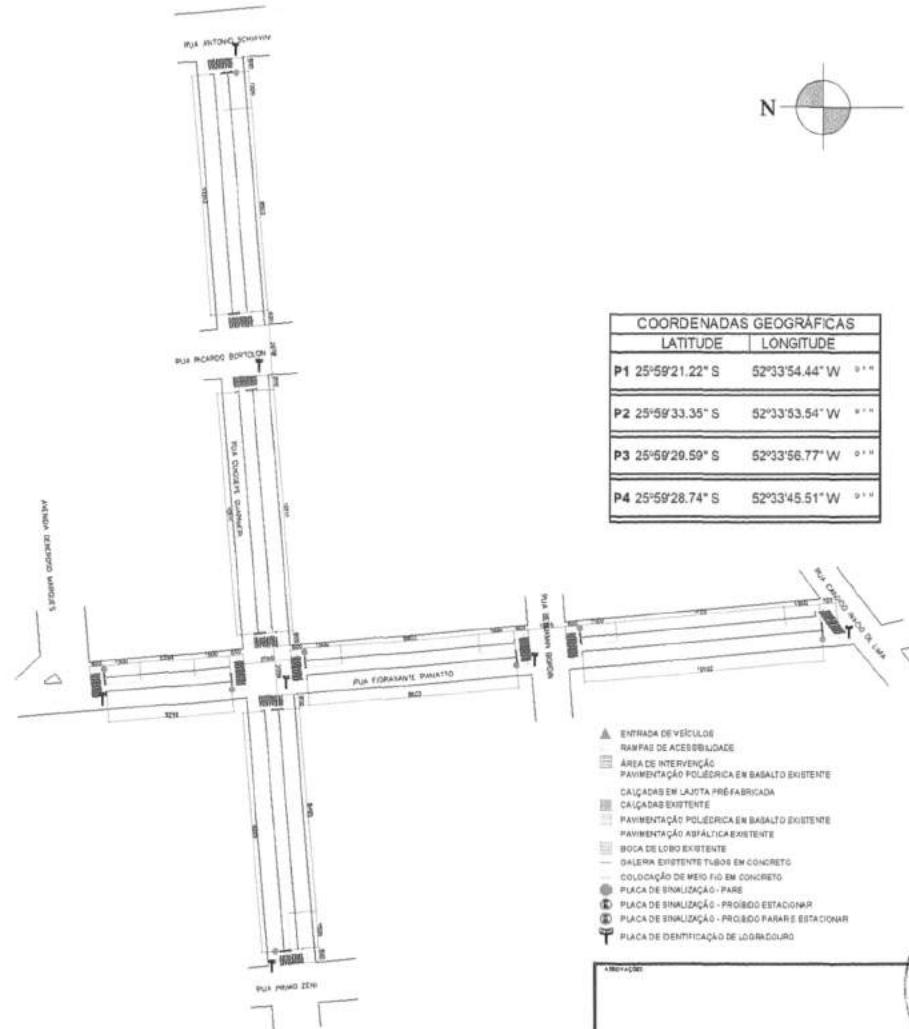

SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:1000

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°59'21.22" S	52°33'54.44" W
P2 25°59'33.35" S	52°33'53.54" W
P3 25°59'29.59" S	52°33'56.77" W
P4 25°59'28.74" S	52°33'45.51" W

- ▲ ENTRADA DE VEÍCULO
- ▲ RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- CALÇADA EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA
- CALÇADA EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM BASALTO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- GALERIA EXISTENTE TUBOS EM CONCRETO
- COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO ESTACIONAR
- PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR
- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO



CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS
ESCALA: 1:20

MEIO FIO DE CONCRETO
CADA DE POLARIZ. C.B.U.D. = 4cm
PINTURA DE SINALIZAÇÃO
REPERTEAMENTO = C.B.U.D. = 2cm
PINTURA DE SINALIZAÇÃO
PÁVIO: PEDRA IRREGULAR
BASE / LEITO: NATURAL

 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Praça Sérgio Mattoso, nº 4 Coronel Vivida - Paraná (41) 3370-9100 - 3370-9009	
Empreendimento: RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	
Endereço do Obra: RUA GUILHERME GUARNIERI E RUA EUGENIO PARATO	
Responsável Técnico: EDUARDO SCHIAVINI Profissional Registrado	Título dos documentos: - SITUAÇÃO - SINALIZAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO DAS VIAS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Data de Emissão: 21.07.2017	Data de Validade: 13/17
Assinatura do Responsável Técnico: 	Assinatura do Responsável Técnico: 





DETALHE EXECUÇÃO DE ENTRADAS DE VEÍCULOS

ESCALA: 1:25



ESCALA: 1:100




DETALHE EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

[SCALA: 1:25]




ESCALA: 1:25




DETALHE - MEIO FIO EM CONCRETO

ESCALA: 1:10




 MUNICÍPIO DE CORONEL VIDUA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Rua Argemiro Ribeiro, 947 Coronel Vidua - Paraná FONE: 0332-330.000		
Emprego nº: _____ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES Endereço do Obra: _____ DIVISÃO DE OBRAS DO PERÍMETRO URBANO DE CORONEL VIDUA - PR		
 MANOEL SCHIAVARI Prefeito Municipal	Título das obras: - DETALHES CALÇADAS - DETALH MEIO FIO - D. ENTRADA DE VEÍCULOS - D. RAMPA DE ACESSO/SAÍDA	Data: 31.08.2017 Escrito: Inocencio
Responsável Técnico:  EUSEBIO LUIZ WEISS Eng. Civil, CRP. 04.000.000	ART: 20173948296 Emissão: 2017 PROJETO BÁSICO DE ARGUMENTURA Desenho: 200x300x300mm	Prêmio: 15/17

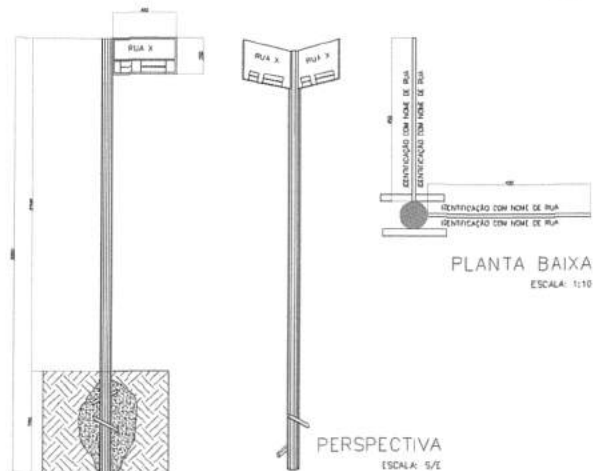


PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45X25CM, COM IDENTIFICAÇÃO EM TODOS OS LADOS, COM SUPORTE METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO COM 2,5" DE ESPESSURA COM TAMPA E ALETAS ANTIGIRRO H=3m FIXADA EM BASE DE CONCRETO;

CORTE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
ESCALA: 1:25

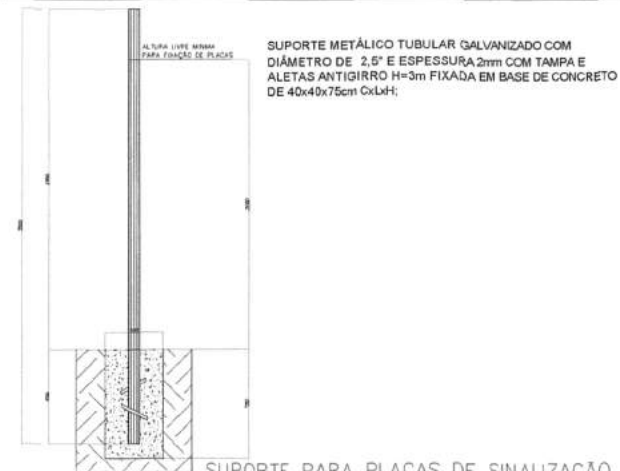


SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:25



PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, ESMALTADAS, PINTURA RETROREFLETIVAS;

PLACAS DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1:25

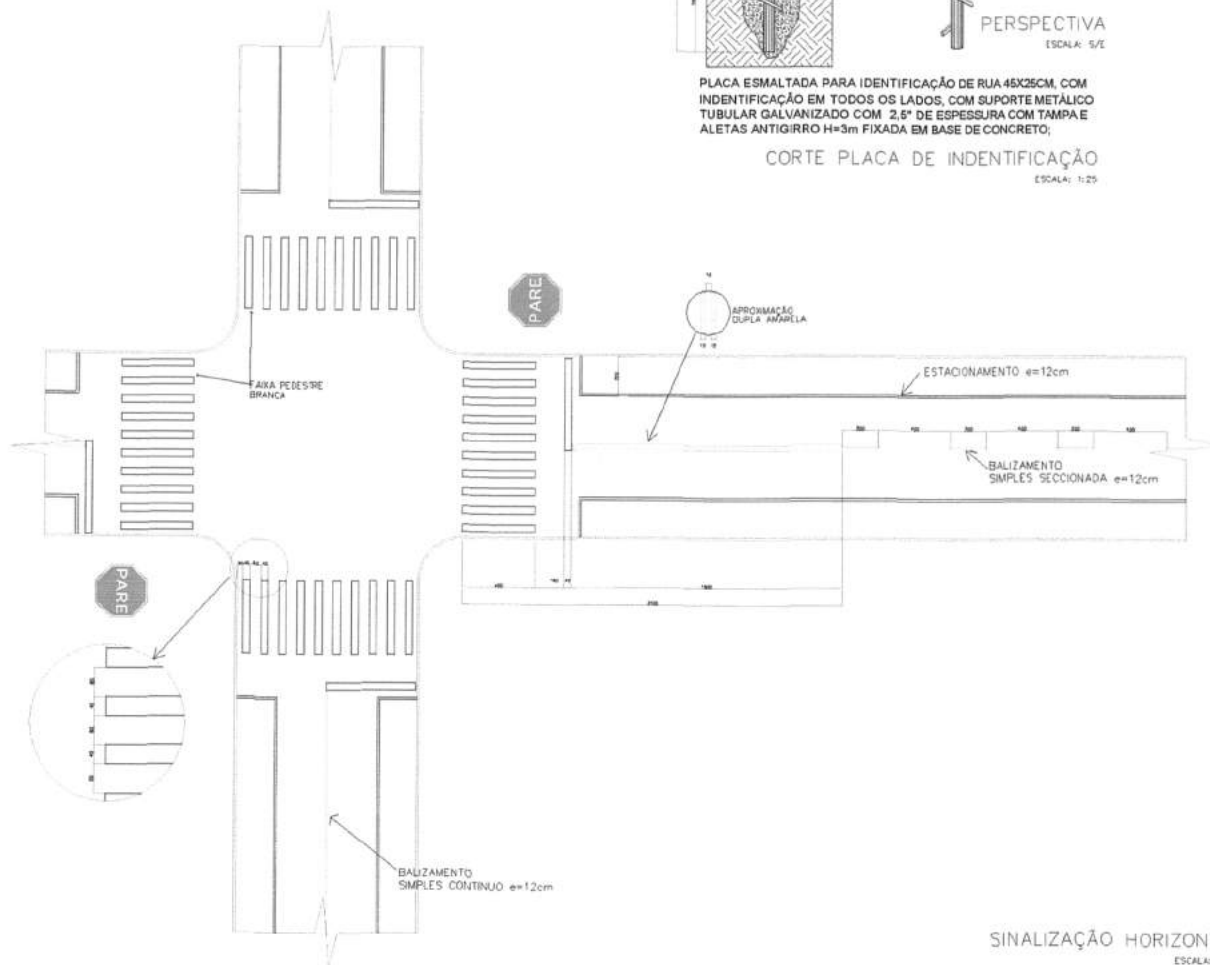

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESCALA: 1:200

APROVAÇÕES



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mazzoni, s/nº
Coronel Vivida - Paraná
(46) 3292-4223 - 3292-6034

Empreendimento:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Endereço da Obra:

DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE CORONEL VIVIDA - PR

Título das plantas:

- DETALHES SINALIZAÇÃO

Data:

31.08.2017

Responsável Técnico:

FRANK ABEL SCHIAVINI
Prefeito Municipal

Responsável Técnico:

EDUARDES LOIZ VIEIRA
Eng. Civil - CREA PR 68130

ART: 20173948296


Especificação:
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

Desenho: Douglas Strapazon

Prancha:

16/17



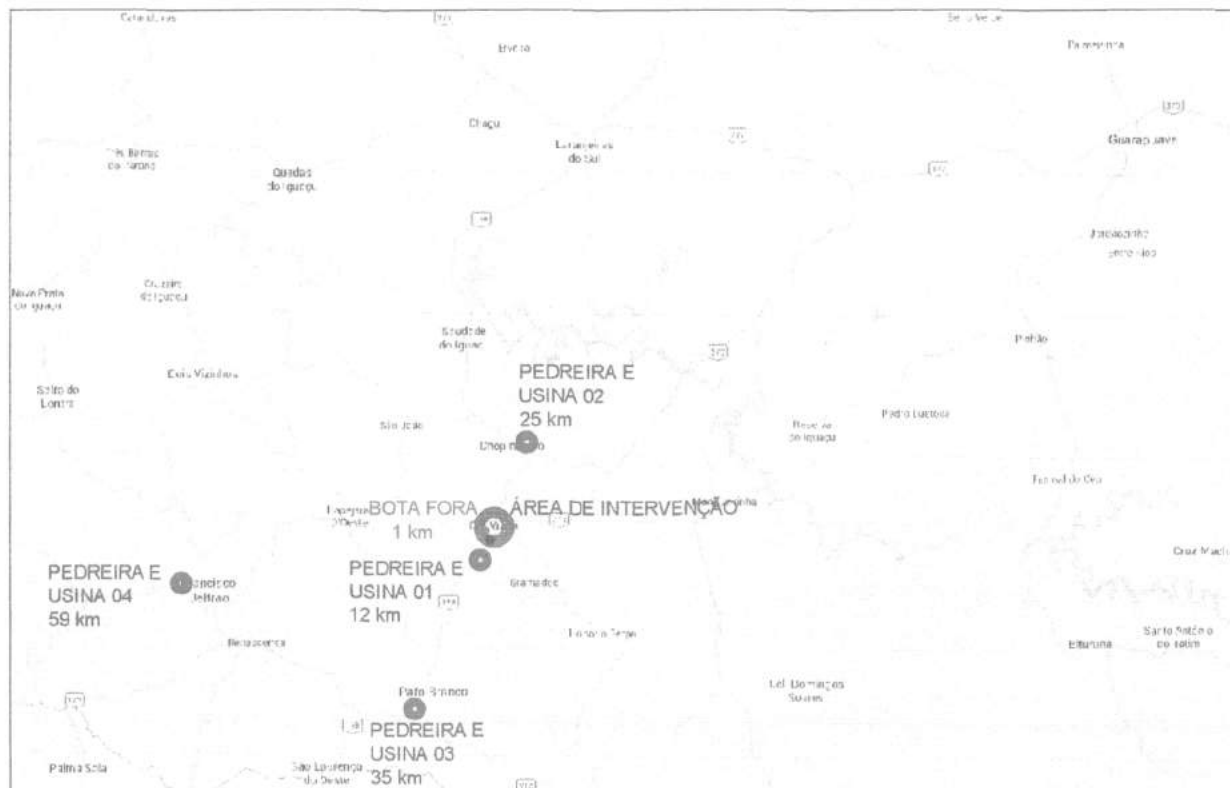

CROQUI DMT
5 / Escala

ÁREAS DE INTERVENÇÃO;

DMT C.B.U.Q - 12+25+35+59 / 4 =+ 33 Km;

DMT ARGILA = 5 Km;

BOTA FORA = 1 Km;

 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Divisão de Estudos e Projetos Praça Ângelo Mezzomo, s/nº Coronel Vivida - Paraná (41) 3232-6323 - 3232-6324		
Empreendimento: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES		
Endereço da Obra: DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE CORONEL VIVIDA - PR		
Responsável Técnico:  FRANK ARIEL SCHAVINI Prefeito Municipal	Título dos projetos: - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE ART: 20173948296 Especificação: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA Desenho: Douglas Strapazon	Data: 31.08.2017 Escala: Indicado Prancha: 17/17



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto :		RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº	
Local da Obra :		GLOBAL				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.019,75
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00	1,00	2.019,75	2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM				5.097,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	58,00	37,00	2.146,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	227,00	13,00	2.951,00	
4		REVESTIMENTO				2.017.520,66
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	34.160,41	0,30	10.248,12	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	68.320,82	1,63	111.362,94	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	1.708,03	370,00	631.971,10	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	3.416,05	370,00	1.263.938,50	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				129.468,76
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	5.202,80	12,58	65.451,22	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	1.488,78	43,00	64.017,54	
6		PAISAGISMO / URBANISMO				784.996,85
610250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	12.632,54	17,54	225.082,75	
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	7.610,49	1,91	14.536,04	
72961	SEIL	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	380,52	88,27	33.588,50	
516000	DER	Paver e=6cm - sem colchão	6.457,17	57,19	369.285,55	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	1.153,22	62,81	72.433,75	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	2.338,24	8,65	20.225,78	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	128,00	389,41	49.844,48	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				114.671,80
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	2.069,83	26,47	54.788,40	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	9,71	360,50	3.500,46	
821300	DER	Suporte metá. galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	43,00	495,90	21.323,70	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	23,00	579,19	13.321,37	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte	37,00	587,51	21.737,87	
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				17.437,17
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	47,00	126,24	5.933,28	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	47,00	75,74	3.559,78	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	47,00	61,72	2.900,84	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	47,00	41,76	1.962,72	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	1,00	3.080,55	3.080,55	
PREÇO GLOBAL					3.071.211,99	3.071.211,99
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					2.154.106,17	2.154.106,17
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					899.668,65	899.668,65
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (8)						
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11)					17.437,17	17.437,17
ÁREA ATUAL					m2	

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 189.816/DFPR

Praça Angelo Mazzoni, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Paraná
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.br

3.071.211,99 3.071.211,99



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM		
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº		
Local da Obra :	Rua 15 de Novembro (entre Rua Henrique Zanella e Rua Zefferino Poletto)					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2		TERRAPLENAGEM				39,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm		37,00		
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	3,00	13,00	39,00	
4		REVESTIMENTO				79.412,08
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	1.344,60	0,30	403,38	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	2.689,20	1,63	4.383,40	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	67,23	370,00	24.875,10	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	134,46	370,00	49.750,20	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				3.662,92
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	291,17	12,58	3.662,92	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00		
6		PAISAGISMO / URBANISMO				33.910,35
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	550,76	17,54	9.660,33	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	315,35	1,91	602,32	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	15,77	88,27	1.392,02	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	268,78	57,19	15.371,53	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	46,57	62,81	2.925,06	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	97,55	8,65	843,81	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	8,00	389,41	3.115,28	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				6.066,17
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	97,75	26,47	2.587,44	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,68	360,50	245,14	
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	3,00	495,90	1.487,70	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	579,19	1.158,38	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	1,00	587,51	587,51	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				610,92
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	2,00	126,24	252,48	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	2,00	75,74	151,48	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	2,00	61,72	123,44	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	2,00	41,76	83,52	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica		3.080,55		
PREÇO GLOBAL					123.701,44	123.701,44
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					83.114,00	83.114,00
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					39.976,52	39.976,52
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					610,92	610,92
AREA ATUAL			m2			

123.701,44 123.701,44

EUCLIDES LAIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1B 515/MPA



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM		
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE n°		
Local da Obra :	Rua Ângelo Colpani (entre Rua 15 de Novembro e Rua Clevelandia)					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2		TERRAPLENAGEM				293,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	3,00	37,00	111,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	14,00	13,00	182,00	
4		REVESTIMENTO				86.522,90
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	1.465,00	0,30	439,50	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	2.930,00	1,63	4.775,90	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	73,25	370,00	27.102,50	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	146,50	370,00	54.205,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				3.524,04
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	280,13	12,58	3.524,04	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00		
6		PAISAGISMO / URBANISMO				32.712,08
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	544,80	17,54	9.555,79	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	297,45	1,91	568,13	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	14,87	88,27	1.312,57	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	249,80	57,19	14.286,06	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	47,65	62,81	2.992,90	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	101,89	8,65	881,35	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	8,00	389,41	3.115,28	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				6.383,40
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	109,42	26,47	2.896,35	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,68	360,50	245,14	
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	3,00	495,90	1.487,70	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	1,00	579,19	579,19	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	587,51	1.175,02	
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				610,92
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	2,00	126,24	252,48	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	2,00	75,74	151,48	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	2,00	61,72	123,44	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	2,00	41,76	83,52	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica		3.080,55		
PREÇO GLOBAL					130.046,34	130.046,34
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					90.339,94	90.339,94
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					39.095,48	39.095,48
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (8)						
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					610,92	610,92
AREA ATUAL			m2			

130.046,34 130.046,34

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 13 515 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto :		RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS			LOTE n°	
Local da Obra :		Rua Antonio Inácio Rokemback (entre Rua Celeste Foppa e Rua Santa Catarina)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2		TERRAPLENAGEM				
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm		37,00		
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm		13,00		
4		REVESTIMENTO				139.334,18
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	2.359,15	0,30	707,75	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	4.718,30	1,63	7.690,83	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	117,96	370,00	43.645,20	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	235,92	370,00	87.290,40	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio		12,58		
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00		
6		PAISAGISMO / URBANISMO				4.672,92
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)		17,54		
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos		1,91		
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)		88,27		
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão		57,19		
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão		62,81		
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas		8,65		
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	12,00	389,41	4.672,92	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				10.107,29
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	162,73	26,47	4.307,46	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,90	360,50	324,45	
821300	DER	Suporte metálico galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m	4,00	495,90	1.983,60	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	4,00	579,19	2.316,76	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	587,51	1.175,02	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				916,38
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	3,00	126,24	378,72	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	3,00	75,74	227,22	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	3,00	61,72	185,16	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	3,00	41,76	125,28	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55		
PREÇO GLOBAL					155.030,77	155.030,77
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					139.334,18	139.334,18
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					14.780,21	14.780,21
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					916,38	916,38
ÁREA ATUAL			m2			

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913/D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE n°	
Local da Obra:	Rua das Azaleias (entre Rua Cândido Inácio de Lima e Rua dos Canários)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO		
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM (R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM			330,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	4,00	37,00	148,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	14,00	13,00	182,00
4		REVESTIMENTO			140.893,54
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	2.385,60	0,30	715,68
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	4.771,20	1,63	7.777,06
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	119,28	370,00	44.133,60
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	238,56	370,00	88.267,20
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
5		MEIO-FIO E SARJETA			28.082,01
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio		12,58	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	653,07	43,00	28.082,01
6		PAISAGISMO / URBANISMO			76.243,31
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	1.235,82	17,54	21.676,28
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	746,24	1,91	1.425,32
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	37,31	88,27	3.293,35
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	637,71	57,19	36.470,63
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	108,53	62,81	6.816,77
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	218,27	8,65	1.888,04
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	12,00	389,41	4.672,92
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			12.096,26
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	170,97	26,47	4.525,58
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,90	360,50	324,45
821300	DER	Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	4,00	495,90	1.983,60
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	3,00	579,19	1.737,57
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	6,00	587,51	3.525,06
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			916,38
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	3,00	126,24	378,72
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	3,00	75,74	227,22
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	3,00	61,72	185,16
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	3,00	41,76	125,28
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55	
PREÇO GLOBAL					258.561,50
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					169.305,55
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					88.339,57
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)					
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)					
TOTAL DE DRENAGEM (10)					
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					916,38
ÁREA ATUAL			m2		916,38

258.561,50 258.561,50

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913/D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº	
Local da Obra:	Rua Dona Rosa Stédile (entre Rua Santa Catarina e Rua Tupi)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO		
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM (R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM			
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm		37,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm		13,00	
4		REVESTIMENTO			131.408,50
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	2.225,00	0,30	667,50
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	4.450,00	1,63	7.253,50
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	111,25	370,00	41.162,50
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - capa	222,50	370,00	82.325,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
5		MEIO-FIO E SARJETA			19.167,25
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio		12,58	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	445,75	43,00	19.167,25
6		PAISAGISMO / URBANISMO			51.703,93
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	878,26	17,54	15.404,68
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	516,36	1,91	986,25
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	25,82	88,27	2.279,13
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	432,53	57,19	24.736,39
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	83,83	62,81	5.265,36
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	170,46	8,65	1.474,48
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	4,00	389,41	1.557,64
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			4.966,52
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	99,64	26,47	2.637,47
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,45	360,50	162,23
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	2,00	495,90	991,80
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO		579,19	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	587,51	1.175,02
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			916,38
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	3,00	126,24	378,72
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	3,00	75,74	227,22
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	3,00	61,72	185,16
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	3,00	41,76	125,28
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica		3.080,55	
PREÇO GLOBAL					208.162,58
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					150.575,75
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (6-7)					56.670,45
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)					
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)					
TOTAL DE DRENAGEM (10)					
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					916,38
AREA ATUAL			m2		

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.513 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	:CORONEL VIVIDA			SAM		
Projeto :	:RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº		
Local da Obra :	:Rua dos Caminhões (entre Prolongamento da Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2		TERRAPLENAGEM				330,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	4,00	37,00	148,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	14,00	13,00	182,00	
4		REVESTIMENTO				55.043,92
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	932,00	0,30	279,60	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	1.864,00	1,63	3.038,32	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	46,60	370,00	17.242,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	93,20	370,00	34.484,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				2.830,63
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	225,01	12,58	2.830,63	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00		
6		PAISAGISMO / URBANISMO				26.258,67
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	429,98	17,54	7.541,85	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	244,23	1,91	466,48	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	12,21	88,27	1.077,78	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	207,39	57,19	11.860,63	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	36,84	62,81	2.313,92	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	76,48	8,65	661,55	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	6,00	389,41	2.336,46	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				5.419,63
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	73,31	26,47	1.940,52	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,45	360,50	162,23	
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	2,00	495,90	991,80	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	3,00	579,19	1.737,57	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	1,00	587,51	587,51	
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				305,46
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	1,00	126,24	126,24	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	1,00	75,74	75,74	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	1,00	61,72	61,72	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	1,00	41,76	41,76	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55		
PREÇO GLOBAL					90.188,31	90.188,31
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					58.204,55	58.204,55
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					31.678,30	31.678,30
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (8)						
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					305,46	305,46
ÁREA ATUAL				m2		

90.188,31 90.188,31

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.513/D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto :		RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº	
Local da Obra :		Rua Duque de Caxias (entre Rua Hermes Alcides Lunardi até o final do calçamento da mesma Rua)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2		TERRAPLENAGEM				215,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	3,00	37,00	111,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	8,00	13,00	104,00	
4		REVESTIMENTO				84.573,92
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	1.432,00	0,30	429,60	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	2.864,00	1,63	4.668,32	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	71,60	370,00	26.492,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	143,20	370,00	52.984,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				4.363,88
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	346,89	12,58	4.363,88	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00		
6		PAISAGISMO / URBANISMO				40.275,49
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	680,02	17,54	11.927,55	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	398,25	1,91	760,66	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	19,91	88,27	1.757,46	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	333,61	57,19	19.079,16	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	64,64	62,81	4.060,04	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	130,98	8,65	1.132,98	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	4,00	389,41	1.557,64	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				3.732,24
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	75,37	26,47	1.995,04	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,23	360,50	82,92	
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	1,00	495,90	495,90	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	579,19	1.158,38	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO		587,51		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				610,92
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	2,00	126,24	252,48	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	2,00	75,74	151,48	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	2,00	61,72	123,44	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	2,00	41,76	83,52	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica		3.080,55		
PREÇO GLOBAL					133.771,45	133.771,45
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					89.152,80	89.152,80
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					44.007,73	44.007,73
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (8)						
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					610,92	610,92
ÁREA ATUAL					m2	

133.771,45 133.771,45

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.515 D/PB



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE n°	
Local da Obra:	Rua Duque de Caxias (entre Rua Luiz Bassan Mezzomo e Rua Doutor Ubaldino do Amaral)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO		
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM
					(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM			419,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	5,00	37,00	185,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	18,00	13,00	234,00
4		REVESTIMENTO			214.978,40
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	3.640,00	0,30	1.092,00
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	7.280,00	1,63	11.866,40
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	182,00	370,00	67.340,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	364,00	370,00	134.680,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
5		MEIO-FIO E SARJETA			10.170,93
806700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	808,50	12,58	10.170,93
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00	
6		PAISAGISMO / URBANISMO			94.467,92
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0.0171m3/m)	1.546,38	17,54	27.123,15
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	972,70	1,91	1.857,86
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	48,64	88,27	4.293,45
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	828,68	57,19	47.392,21
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	144,02	62,81	9.045,90
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	279,64	8,65	2.418,89
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	6,00	389,41	2.336,46
7		SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO			7.339,47
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	167,72	26,47	4.439,55
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,45	360,50	162,23
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	2,00	495,90	991,80
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	2,00	579,19	1.158,38
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	1,00	587,51	587,51
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			1.527,30
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	5,00	126,24	631,20
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	5,00	75,74	378,70
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	5,00	61,72	308,60
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	5,00	41,76	208,80
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55	
PREÇO GLOBAL					328.903,02
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					225.568,33
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					101.807,39
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)					
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)					
TOTAL DE DRENAGEM (10)					
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					
				1.527,30	1.527,30
			ÁREA ATUAL	m2	

328.903,02 328.903,02

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913 D/PR

Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Paraná
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.br



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE n°	
Local da Obra:	Rua Fioravante Panato (entre Av. Generoso Marques e Rua Candido Inácio de Lima)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO		
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM (R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM			178,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	2,00	37,00	74,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	8,00	13,00	104,00
4		REVESTIMENTO			188.094,29
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	3.184,80	0,30	955,44
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	6.369,60	1,63	10.382,45
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	159,24	370,00	58.918,80
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	318,48	370,00	117.837,60
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
5		MEIO-FIO E SARJETA			7.749,66
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	616,03	12,58	7.749,66
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00	
6		PAISAGISMO / URBANISMO			71.610,84
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	1.184,20	17,54	20.770,87
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	687,81	1,91	1.313,72
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	34,39	88,27	3.035,61
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	581,90	57,19	33.278,86
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	105,91	62,81	6.652,21
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	218,11	8,65	1.886,65
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	12,00	389,41	4.672,92
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			10.993,97
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	194,97	26,47	5.160,86
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,90	360,50	324,45
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	4,00	495,90	1.983,60
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO		579,19	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	6,00	587,51	3.525,06
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			1.221,84
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	4,00	126,24	504,96
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	4,00	75,74	302,96
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	4,00	61,72	246,88
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	4,00	41,76	167,04
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55	
PREÇO GLOBAL					279.848,60
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					196.021,95
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					82.604,81
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)					
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)					
TOTAL DE DRENAGEM (10)					
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					1.221,84
AREA ATUAL			m2		

279.848,60 279.848,60

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913.07/PB



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto:	RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS			LOTE n°	
Local da Obra:	Rua Giuseppe Guarnieri (entre Rua Antonio Schiavini e Rua Primo Zeni)				
Código	Origem		ORÇAMENTO APROVADO		
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM
					(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM			864,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	10,00	37,00	370,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	38,00	13,00	494,00
4		REVESTIMENTO			228.562,20
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	3.870,00	0,30	1.161,00
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	7.740,00	1,63	12.616,20
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	193,50	370,00	71.595,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	387,00	370,00	143.190,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
5		MEIO-FIO E SARJETA			9.133,08
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	726,00	12,58	9.133,08
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00	
6		PAISAGISMO / URBANISMO			84.578,32
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	1.392,32	17,54	24.421,29
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	827,72	1,91	1.580,95
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	41,39	88,27	3.653,50
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	701,56	57,19	40.122,22
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	126,16	62,81	7.924,11
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	254,72	8,65	2.203,33
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	12,00	389,41	4.672,92
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			8.316,74
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	204,34	26,47	5.408,88
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,68	360,50	245,14
821300	DER	Suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m	3,00	495,90	1.487,70
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO		579,19	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	587,51	1.175,02
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			1.832,76
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	6,00	126,24	757,44
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	6,00	75,74	454,44
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	6,00	61,72	370,32
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	6,00	41,76	250,56
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica		3.080,55	
PREÇO GLOBAL					333.287,10
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					238.559,28
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					92.895,06
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)					
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)					
TOTAL DE DRENAGEM (10)					
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					1.832,76
ÁREA ATUAL			m2		

333.287,10 333.287,10

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.914 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto:	RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS			LOTE n°	
Local da Obra:	Rua José Hofmann de Freitas (entre Rua 15 de Novembro e Rua Luiz Costella)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO		
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM (R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM			306,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	3,00	37,00	111,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	15,00	13,00	195,00
4		REVESTIMENTO			63.784,80
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	1.080,00	0,30	324,00
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	2.160,00	1,63	3.520,80
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - repavimentamento	54,00	370,00	19.980,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	108,00	370,00	39.960,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
5		MEIO-FIO E SARJETA			2.716,65
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	215,95	12,58	2.716,65
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00	
6		PAISAGISMO / URBANISMO			25.051,44
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	420,36	17,54	7.373,11
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	239,59	1,91	457,62
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	11,98	88,27	1.057,47
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	201,38	57,19	11.516,92
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	38,21	62,81	2.399,97
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	79,62	8,65	688,71
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	4,00	389,41	1.557,64
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			4.122,13
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	67,74	26,47	1.793,08
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,45	360,50	162,23
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	2,00	495,90	991,80
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO		579,19	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	587,51	1.175,02
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			610,92
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	2,00	126,24	252,48
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	2,00	75,74	151,48
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	2,00	61,72	123,44
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	2,00	41,76	83,52
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55	
PREÇO GLOBAL					96.591,94
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					66.807,45
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					29.173,57
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)					
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)					
TOTAL DE DRENAGEM (10)					
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					610,92
AREA ATUAL			m2		610,92

96.591,94 96.591,94

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15.913 D/PR

Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Paraná
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.br



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto :		RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº	
Local da Obra :		Rua Leopoldo Schiavini (entre Rua Armindo Bernardo Pick e Rua Armindo José Gregolin)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.019,75
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00	1,00	2.019,75	2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM				610,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	7,00	37,00	259,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	27,00	13,00	351,00	
4		REVESTIMENTO				130.628,77
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	2.211,76	0,30	663,53	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	4.423,52	1,63	7.210,34	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	110,59	370,00	40.918,30	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	221,18	370,00	81.836,60	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				16.580,56
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	204,59	12,58	2.573,74	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	325,74	43,00	14.006,82	
6		PAISAGISMO / URBANISMO				61.999,82
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	995,84	17,54	17.467,03	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	620,85	1,91	1.185,82	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	31,04	88,27	2.739,90	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	532,52	57,19	30.454,82	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	88,23	62,81	5.541,73	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	172,86	8,65	1.495,24	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	8,00	389,41	3.115,28	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				7.930,77
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	124,43	26,47	3.293,66	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,68	360,50	245,14	
821300	DER	Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	3,00	495,90	1.487,70	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	4,00	579,19	2.316,76	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	1,00	587,51	587,51	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				3.996,93
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	3,00	126,24	378,72	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	3,00	75,74	227,22	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	3,00	61,72	185,16	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	3,00	41,76	125,28	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	1,00	3.080,55	3.080,55	
PREÇO GLOBAL					223.766,60	223.766,60
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					149.839,08	149.839,08
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					69.930,59	69.930,59
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					3.996,93	3.996,93
ÁREA ATUAL			m2			

223.766,60 223.766,60

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913.0/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM		
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº		
Local da Obra :	Rua Luiz Costella (entre Rua Angelo Colpani e Rua José Henrique de Freitas)					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2		TERRAPLENAGEM				356,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	4,00	37,00	148,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	16,00	13,00	208,00	
4		REVESTIMENTO				83.865,20
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	1.420,00	0,30	426,00	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	2.840,00	1,63	4.629,20	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	71,00	370,00	26.270,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	142,00	370,00	52.540,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				3.540,64
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	281,45	12,58	3.540,64	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00		
6		PAISAGISMO / URBANISMO				32.633,10
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	543,44	17,54	9.531,94	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	296,63	1,91	566,56	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	14,83	88,27	1.309,04	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	249,12	57,19	14.247,17	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	47,51	62,81	2.984,10	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	101,62	8,65	879,01	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	8,00	389,41	3.115,28	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				6.541,24
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	114,74	26,47	3.037,17	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,45	360,50	162,23	
821300	DER	Suporte metálic galv.fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro h=3,00m	2,00	495,90	991,80	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO		579,19		
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	4,00	587,51	2.350,04	
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				610,92
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	2,00	126,24	252,48	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	2,00	75,74	151,48	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	2,00	61,72	123,44	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	2,00	41,76	83,52	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55		
PREÇO GLOBAL					127.547,10	127.547,10
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					87.761,84	87.761,84
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					39.174,34	39.174,34
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					610,92	610,92
ÁREA ATUAL					m2	

127.547,10 127.547,10

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 B/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto :		RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº	
Local da Obra :		Rua Luiz Ruffato (entre Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2		TERRAPLENAGEM				254,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	3,00	37,00	111,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	11,00	13,00	143,00	
4		REVESTIMENTO				47.102,20
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	797,50	0,30	239,25	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	1.595,00	1,63	2.599,85	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	39,88	370,00	14.755,60	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	79,75	370,00	29.507,50	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5		MEIO-FIO E SARJETA				4.373,34
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	128,13	12,58	1.611,88	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	64,22	43,00	2.761,46	
6		PAISAGISMO / URBANISMO				22.975,73
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	367,78	17,54	6.450,86	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	224,16	1,91	428,15	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	11,21	88,27	989,51	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	192,09	57,19	10.985,63	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	32,07	62,81	2.014,32	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	63,54	8,65	549,62	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	4,00	389,41	1.557,64	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				3.837,47
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	57,15	26,47	1.512,76	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,23	360,50	82,92	
821300	DER	Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	1,00	495,90	495,90	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	579,19	1.158,38	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	1,00	587,51	587,51	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				305,46
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	1,00	126,24	126,24	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	1,00	75,74	75,74	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	1,00	61,72	61,72	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	1,00	41,76	41,76	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55		
PREÇO GLOBAL					78.848,20	78.848,20
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					51.729,54	51.729,54
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					26.813,20	26.813,20
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					305,46	305,46
ÁREA ATUAL			m2			

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.943 D/PR

78.848,20 78.848,20



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº	
Local da Obra:	Rua Valdomiro Castro (entre Rua Jacó Fleck e Av. Generoso Marques)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO		
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM
					(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75	
2		TERRAPLENAGEM			267,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	3,00	37,00	111,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	12,00	13,00	156,00
4		REVESTIMENTO			143.870,16
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	2.436,00	0,30	730,80
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	4.872,00	1,63	7.941,36
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	121,80	370,00	45.066,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	243,60	370,00	90.132,00
170500	DER mat	CAP (Araucária)			
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Massa			
5		MEIO-FIO E SARJETA			5.329,01
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	423,61	12,58	5.329,01
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00	
6		PAISAGISMO / URBANISMO			49.581,00
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	808,64	17,54	14.183,55
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/ajotas/blocos	482,26	1,91	921,12
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	24,11	88,27	2.128,19
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	410,92	57,19	23.500,51
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	71,34	62,81	4.480,87
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	144,68	8,65	1.251,48
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	8,00	389,41	3.115,28
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			8.192,08
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	155,24	26,47	4.109,20
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,68	360,50	245,14
821300	DER	Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	3,00	495,90	1.487,70
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO		579,19	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	4,00	587,51	2.350,04
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			916,38
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	3,00	126,24	378,72
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	3,00	75,74	227,22
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	3,00	61,72	185,16
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	3,00	41,76	125,28
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica		3.080,55	
PREÇO GLOBAL					208.155,63
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)					149.466,17
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)					57.773,08
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)					
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)					
TOTAL DE DRENAGEM (10)					
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					916,38
AREA ATUAL			m2		

208.155,63 208.155,63

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	
Projeto :		RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS			LOTE nº	
Local da Obra :		Rua Waldemar Antonio Fischer (entre Rua Clevelândia e Rua Antonio Inácio Rokemback)				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO APROVADO			
			QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00		2.019,75		
2 TERRAPLENAGEM			636,00			
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	7,00	37,00	259,00	
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm	29,00	13,00	377,00	
4 REVESTIMENTO			199.445,62			
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	3.377,00	0,30	1.013,10	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	6.754,00	1,63	11.009,02	
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	168,85	370,00	62.474,50	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	337,70	370,00	124.949,00	
170500	DER mat	CAP (Araucária)				
transporte		Areia				
transporte		Cal Hidratada CH-1				
transporte		Brita (usina)				
transporte		Massa				
5 MEIO-FIO E SARJETA			8.244,18			
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	655,34	12,58	8.244,18	
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado		43,00		
6 PAISAGISMO / URBANISMO			76.321,95			
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	1.253,96	17,54	21.994,46	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	740,89	1,91	1.415,10	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	37,04	88,27	3.269,52	
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	629,18	57,19	35.982,80	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	111,71	62,81	7.016,51	
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	227,82	8,65	1.970,64	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	12,00	389,41	4.672,92	
7 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			8.626,46			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	194,31	26,47	5.143,39	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	0,90	360,50	324,45	
821300	DER	Suporte metálg.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	4,00	495,90	1.983,60	
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO		579,19		
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO	2,00	587,51	1.175,02	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			1.527,30			
11						
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	5,00	126,24	631,20	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	5,00	75,74	378,70	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	5,00	61,72	308,60	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	5,00	41,76	208,80	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		3.080,55		
PREÇO GLOBAL			294.801,51 294.801,51			
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)			208.325,80 208.325,80			
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)			84.948,41 84.948,41			
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)						
TOTAL DE DRENAGEM (10)						
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)			1.527,30 1.527,30			
ÁREA ATUAL			m2			

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.945 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

P.A.M

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	38	F.P.	97,68%
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO	LOTE nº	01	C.P.M.	2,32%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)											TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100											2.019,75	0,07
311.02	TERRAPLENAGEM	20	20	20	20	20							5.097,00	0,17
311.04	REVESTIMENTO							20	20	20	20	20	2.017.520,66	65,69
311.05	MEIO-FIO E SARJETA	20	20	20	20	20							129.468,76	4,22
311.06	PAISAGISMO / URBANSMO	15	15	15	15	15	15	10					784.996,85	25,56
311.07	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									30	30	40	114.671,80	3,73
311.11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							20	20	20	20	20	17.437,17	0,57
TOTALS													3.071.211,99	100,00

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO

ITEM		PARCELAS											TOTAL ITEM	% S/ ITEM
		1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8		
SUB-	FINANCIAMENTO	143.281,31	141.308,40	141.308,40	141.308,40	141.308,40	115.019,28	474.234,20	397.554,68	431.158,55	431.158,55	442.359,84	3.000.000,00	97,68%
TOTAL	CONTRAPARTIDA	3.401,12	3.354,28	3.354,28	3.354,28	3.354,28	2.730,25	11.257,05	9.436,89	10.234,55	10.234,55	10.500,44	71.211,99	2,32%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		146.682,43	144.662,68	144.662,68	144.662,68	144.662,68	117.749,53	485.491,25	406.991,57	441.393,11	441.393,11	452.860,29	3.071.211,99	97,68%
MENSAL PREVISTO EM %		4,78%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	3,83%	15,81%	13,25%	14,37%	14,37%	14,75%	100,00%	100,00%
Resp. Técnico:							Assinatura:			data:				

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.513 D/PR

Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Paraná
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.br






MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 3,50
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	6,15
ADMINISTR.	10,00
EVENTUAIS	5,00
LUCRO	6,00
BDI	29,959
BDI= $1,0615 \times 1,10 \times 1,05 \times 1,06$	
BDI arredond.	30%

Coronel Vivida, 27 de Setembro de 2017.


EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil
CREA-PR 18.913/D



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
 Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20173948296
Retificação de ART
 ART Principal



O valor de R\$ 81,53 referente a esta ART foi pago em 12/09/2017 com a guia nº 100020173948296

Profissional Contratado: EUCLIDES LUIZ WEISS (CPF:232.615.369-34)

Nº Carteira: PR-18913/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CPF/CNPJ: 76.995.455/0001-56

Endereço: PRAÇA ANGÉLO MEZZOMO S/N CENTRO

CEP: 85550000 CORONEL VIVIDA PR Fone: 3232-8300

Local da Obra/Serviço: RUA > VARIAS RUAS S/N

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO - CORONEL VIVIDA PR

Quadra:*

Lote:*

CEP: 85550000

Tipo de Contrato	5	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	Dimensão	34160,41 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.		1103 PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS		
Tipo Obra/Serv		045 ARRUEAMENTO		
Serviços contratados	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
	130	OUTROS		
	169	FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)		
	301	VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO		
		Dados Compl.		0
		Data Início		11/09/2017
		Data Conclusão		0

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO EM UM TOTAL DE 35.352,41 M².

COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, SINALIZAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, TESTE DE CARGA, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDENDO A TESTE DE CARGA NO PAVIMENTO EXISTENTE EM PEDRAS IRREGULARES E COMPOSIÇÃO DAS MISTURAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ.

Insp.: 4610
 02/10/2017
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Matrícula: 18913

Assinatura do Profissional

EUCLIDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR

Por tratar-se de **ART RETIFICADA**, não há cobrança de taxa. O valor constante da taxa já foi registrado na ART inicial.

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



OFÍCIO Nº 798/2017

PROTOCOLO Nº 171/2017

DE: Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal

PARA: Ademir Antonio Aziliero
Contabilista

Ademir Antonio Aziliero
Presidente da Comissão de Licitação

Pricila Gregolin Gugik
Advogada

DATA: 13.10.2017

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ofício nº 093/2017, expedido pelo Sr. Inério Krambeck, Diretor do Departamento de Obras e Viação, o qual requer à contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa da obra, totalizando 34.160,41 m²; conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo. Após análise aos documentos apresentados, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1. À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa;
2. À elaboração da minuta do processo de licitação e minuta de contrato;
3. Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 2 acima.

Cordialmente,


Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



OFÍCIO Nº 151/2017

PROTOCOLO Nº 171/2017

DE: Ademir Antonio Aziliero
Contabilista

PARA: Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal

DATA: 13.10.2017

Informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calcadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa da obra, totalizando 34.160,41 m²; conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo; nas dotações orçamentárias indicadas:

Órgão/ unidade	Unidade	Funcional Programática	Elemento	Fonte	Código Reduzido
08/01	Depto de Obras e Serviços Urbanos	08.001.26.451.0029.1.052	4.4.90.51.02.02	10097	3306
08/01	Depto de Obras e Serviços Urbanos	08.001.26.451.0029.1.052	4.4.90.51.02.02	501	951

Cordialmente,


Ademir Antonio Aziliero
Contabilista
CRC PR nº 025.365/0-7



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



OFÍCIO Nº 170/2017

PROTOCOLO Nº 171/2017

DE: Ademir Antonio Aziliero
Presidente da CML

PARA: Pricila Gregolin Gugik
Advogada

DATA: 16.10.2017

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação e minuta de contrato referente à contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa da obra, totalizando 34.160,41 m²; conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo; conforme previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Cordialmente,


Ademir Antonio Aziliero
Presidente da CML



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº xx/2017

I - PREÂMBULO

01. OBJETIVO

O Estado do Paraná, por meio do Sistema de Financiamento de Ações está financiando ao Município abaixo identificado s) objeto (s) abaixo descrito (s).

O Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios – SFM, foi instituído pelo Decreto Estadual n.º 5631/2002, é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU, por meio do seu ente de cooperação Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO

O MUNICÍPIO de CORONEL VIVIDA, ora denominado licitador, torna público que às horas do dia de do ano de 2017, na rua Praça Angelo Mezzomo nº s/n - Centro em Coronel Vivida, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as propostas para execução da(s) obra(s) objeto da Concorrência n.º xx - 2017. Esta licitação, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, Lei Complementar Federal n.º 123/2006; Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, **por escrito**, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), sendo que as respostas serão enviadas **por escrito** a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE GRANDES ITENS

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Perímetro Urbano.

Objeto: Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trecho:

- Rua Leopoldo Schiavini (entre Rua Armindo Bernardo Pick e Rua Armindo José Gregolin)
- Rua Luiz Ruffato (entre Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)
- Rua dos Caminhos (entre Prolongamento da Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)
- Rua Duque de Caxias (entre Rua Hermes Alcides Lunardi até o final do Lote 19A da mesma Rua)
- Rua 15 de Novembro (entre Rua Henrique Zanella e Rua Zefferino Poletto)
- Rua Valdomiro Castro (entre Rua Jacó Fleck e Av. Generoso Marques)
- Rua Dona Rosa Stédile (entre Rua Santa Catarina e Rua Tupi)
- Rua das Azaleias (entre Rua Candido Inácio de Lima e Rua dos Canários)
- Rua Duque de Caxias (entre Rua Luiz Bassan Mezzomo e Rua Doutor Ubaldino do Amaral)
- Rua Antonio Inácio Rokemback (entre Rua Celeste Foppa e Rua Santa Catarina)
- Rua Waldemar Antonio Fischer (entre Rua Clevelândia e Rua Antonio Inácio Rokemback)
- Rua José Henrique de Freitas (entre Rua 15 de Novembro e Rua Luiz Costella)
- Rua Luiz Costella (entre Rua Ângelo Colpani e Rua José Henrique de Freitas)
- Rua Ângelo Colpani (entre Rua 15 de Novembro e Rua Clevelândia)
- Rua Fioravante Panato (entre Av. Generoso Marques e Rua Candido Inácio de Lima)
- Rua Giuseppe Guarnieri (entre Rua Antonio Schiavini e Rua Primo Zeni)

Área de Recape 34.160,41 m²

Colocação de placas de comunicação visual.

Prazo de execução: 330 (trezentos e trinta) dias;

Capital social mínimo: R\$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais);

Preço máximo: R\$ 3.071.211,99 (três milhões, setenta e um mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos).

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.

SAM 38

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:

Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ

04.3 O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em até 20%. O valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do cronograma físico-financeiro.

ITEM	DESCRIÇÃO – GRANDES ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%
2	TERRAPLENAGEM	0,17%
4	REVESTIMENTO	65,69%
5	MEIO-FIO E SARJETA	4,22%
6	PAISAGISMO / URBANISMO	25,56%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	3,73%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	0,57%

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o **Preço Máximo** estabelecido no **item 04.1**, sob pena de desclassificação.

04.5 O prazo de execução e a data de início da (s) obra (s) será contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12 / I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n.º 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que))	(SG) (valor maior que)
1	1	1

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.



06. RECURSOS FINANCEIROS.

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas das seguintes fontes: R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) serão financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM, a serem creditados em conta específica indicada pelo Município e R\$ 71.211,99 (setenta e um mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos) a título de contrapartida municipal, através das dotações orçamentárias Orgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 10097 Código Reduzido: 3306 e Orgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 501 Código Reduzido: 951, respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R\$ 3.071.211,99 (três milhões, setenta e um mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos). Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitarão pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento.

07. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no **item 02**, em horário comercial, ou solicitada por meio do e-mail iana@coronelvivida.pr.gov.br, ademir@coronelvivida.pr.gov.br, douglas@coronelvivida.pr.gov.br. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao **item 03.2**.

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

- a) carta-credencial (Modelo n. ° 01);
- b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02);
- c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaração formal de dispensa (Modelo n. ° 03.1);
- d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. ° 04);
- e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05);
- f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n. ° 06);
- g) carta-proposta de preços (Modelo n. ° 07);
- h) planilha de serviços (Modelo n. ° 08);
- i) cronograma físico-financeiro (Modelo n. ° 09);
- j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 10);
- k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11);
- l) declaração de que a proponente enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 (Modelo n. ° 12);

- m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n.º 13);
- n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n.º 14);
- o) anexo do Contrato – ensaios e declaração;
- p) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n.º 15);
- q) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n.º 16);
- r) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo I);
- s) especificações técnicas e memoriais (Anexo II);
- t) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III);
- u) modelo de placa (Anexo IV);
- v) planilha de Insumos (Anexo V);
- w) BDI - composição (Anexo VI).

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo n.º 08) em meio digital.

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderão participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, devidamente constituída.

08.2 Está impedido (a) de participar da licitação:

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (*cinco por cento*) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

5) consórcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.



09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste edital, os envelopes:

- a) **ENVELOPE N.º 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR;**
- b) **ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.**

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL CONCORRÊNCIA Nº __.201__ ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR DATA: __/__/201__
--

RAZÃO SOCIAL CONCORRÊNCIA Nº __.201__ ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS DATA: __/__/201__
--

09.3 A proposta (*envelopes n.º 01 e n.º 02*) poderá ser entregue diretamente pela proponente à Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (*envelopes n.º 01 e n.º 02*) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português.

09.5 No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s) proposta (s) (*envelopes nº01 e nº02*) será (ão) recebida (s).

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (*sessenta*) dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos **itens 10.2, 1 “d”, “e” e “f”, 3 “d” e “g”, 4 “b” e “d”**. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deverão estar inseridos no envelope n.º 01:

1) Quanto à Habilitação Jurídica:



a) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (*Modelo nº 13*).

b) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, (*Modelo nº 10*).

c) declaração de microempresa (*ME*), empresa de pequeno porte (*EPP*) ou empresa individual de responsabilidade limitada (*EIRELI*) para os fins da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 (*Modelo nº 12*), quando for o caso.

d) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

e) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual.

f) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas:

a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União.;

b) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa;

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado.

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRS);

2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;



OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) Quanto à Qualificação Técnica:

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

b) declaração de recebimento de documentos (*Modelo n.º 02*);

c) atestado de visita (*Modelo n.º 03*), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3232-8323 ou 3232-8349 data limite para o agendamento / /2017; ou declaração formal (*Modelo n.º 03.1*), assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante

d) atestado (s) e/ou declaração (ões), **em nome da proponente**, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANTIDADE MÍNIMA
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ	2.050,00 ton

OBS: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos serviços deverá ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaração (ões), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço com a apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações.

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (*Modelo n.º 04*) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2;

g) comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para



dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso não conste a relação mínima neste anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, n.º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (*Modelo n.º 15*);

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (*Modelo n.º 16*), devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n.º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira:

a) prova de capacidade financeira conforme *Modelo n.º 05*, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de:

- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência Geral (SG),

tais índices serão calculados como se segue:

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LC = (AC / PC)$$

$$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$$

sendo :

AC - ativo circulante

PC - passivo circulante

AP - ativo permanente

RLP - realizável a longo prazo

ELP - exigível a longo prazo

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ão) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.



c) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade;

d) comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. °1 e n. ° 2), por meio de índices oficiais específicos para o caso;

e) declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (*Modelo n. ° 06*), em anexo.

10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

10.4 O responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2, subitem 3, alíneas “e”, “f” e “g”, com expressa autorização do licitador.

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. ° 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n. ° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

1) Carta-proposta de Preços (*Modelo n. ° 07*), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá conter:

a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, e-mail, etc;

b) data;

c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

d) prazo de execução do objeto em dias;

e) prazo de validade da proposta (*mínimo de 60 dias*), contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n. ° 1 e n. ° 2*) pela Comissão de Licitação.

f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços.



2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme (*Modelo n. ° 08*), com nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura, conforme item 07.3. O licitante deverá apresentar a planilha, obrigatoriamente, contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.

3) Cronograma Físico-Financeiro (*Modelo n. ° 09*), devidamente preenchido, constando o nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa.

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS”.

12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “QUANTIDADES”.

12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “PREÇO UNITÁRIO”, e deverão ser apresentados para cada serviço, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “PREÇO PARCIAL” e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário.

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*) na coluna “PREÇO SUBTOTAL” e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da planilha de serviços.

12.8 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*) na coluna “PREÇO TOTAL” e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de serviços.



12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n.º 1 e n.º 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que assim o desejarem, o **envelope n.º 2** que contém as propostas de preços e procederá à abertura dos **envelopes n.º 1** que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n.º 1 e n.º 2 o representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (*com poderes legais para representar a proponente*) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (*Modelo n.º 01*) com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em cartório. **A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes.**

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos **envelopes n.º 1 e n.º 2**, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (*quarenta e oito*) horas, a partir do recebimento da solicitação.

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (*edital, e-mail e publicação na imprensa oficial*).

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o desejarem.

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do **item 13.2**, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos **envelopes n.º 2**, por meio dos meios usuais de comunicação (*editais, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial*).

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes n.º 2. Ato contínuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 Na data fixada para a sessão de abertura dos **envelopes n.º 2**, a Comissão de Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo **envelope n.º 2**, fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos meios convencionais, após a homologação da licitação.

14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos **envelopes n.º 2** das proponentes habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes.

14.3 Da reunião de abertura dos **envelopes n.º 2** será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.



14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, serão efetuadas as devidas correções.

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá, a não ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

14.11 Se o valor de um grande item (**item 04.3**) ultrapassar o percentual máximo admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro.

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no **item 04.3**. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.

14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

14.14 Será desclassificada a proposta:

- a) elaborada em desacordo com o presente edital;
- b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no **item 04.1**;
- c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
- d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
- e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
- f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;
- g) que venha a ser considerada inexecutável pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexecutáveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:



- a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
- b) preço global orçado pelo licitador.

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço.

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a que se referem as alíneas “a” e “b” do item 14.15, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante do item 14.15 e o preço global analisado.

14.18 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (*editais, e-mail e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (*item 10.2, 2.1 “a” e “b”*), **mesmo que apresente alguma restrição.**

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP ou EIRELI.

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (*dez por cento*) superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou EIRELI.



15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EIRELI melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de ME, EPP ou EIRELI ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (*edital, e-mail e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (*cinco*) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou EIRELI melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou EIRELI remanescentes que se enquadrem na hipótese do **item 15.4**, segundo a ordem de classificação.

15.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou EIRELI, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo PARANACIDADE.

16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Modelo n.º 14), dentro do prazo máximo de 5 (*cinco*) dias úteis, sob pena de decair o direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná.



16.4 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

17.1 A proponente vencedora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

17.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (*subitem 14.17*).

17.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei Federal n.º 8.666/1993.

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias deverão ser devidamente prorrogadas.

17.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

- a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada;
- b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador.

17.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

- a) termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

18. PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é do 11º (*décimo primeiro*) dias a contar da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir do 11º (*décimo primeiro*) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.



18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários conforme Anexo I do contrato, parte integrante deste edital.

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

21. PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo.

22. PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (*cinco*) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;



OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

g.1) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos referidos materiais;

g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (*Modelo n.º 11*);

g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaio – firmado pelo CONTRATANTE e pelo responsável da CONTRATADA –, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante no orçamento.

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

23.1 O recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula Décima Sexta da minuta do Contrato de Empreitada.

24. PENALIDADES



24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na Cláusula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada.

25. RESCISÃO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta de Contrato de Empreitada.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não acorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto.

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital.

26.4 Durante a fase licitatória a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas instalações das proponentes.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

26.8 8 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente.

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Coronel Vivida, de de 2017.


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Presidente da Comissão de Licitação







MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, __ de __ de 201__

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº __/____

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. S^{as} que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir onúmero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, **com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais (opcional)** a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal).

(Nome, RG nº e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsável legal



MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Local, ____ de ____ de 201__.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal) .



MODELO Nº 03

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU nº (inserir o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Local, ____ de ____ de 201 ____.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável pelo licitador).

(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente)



MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Concorrência Nacional nº xx/2017

Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ nº:

Endereço:

Fone:

Fax:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) *(inserir o nome do representante)*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Curitiba, de de 2017.

(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico)



MODELO N° 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência n° ____/____

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura do responsável técnico

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Local, __ de __ de 201__.

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal)



MODELO N° 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência n° ____/____

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$		
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$		
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$		

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, ____ de ____ de 201__.

Representante legal
(Nome, RG n° e assinatura)

Contador
(nome, n° CRC e assinatura,)



MODELO Nº 06

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

O signatário do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, ____ de ____ de 201 ____.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal)


28



MODELO Nº 07

(Razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ/MF).

PROPOSTA DE PREÇOS

Local, ____ de ____ de 201__.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de ____, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução) (inserir o prazo de execução por extenso) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal)



MODELO Nº 08

PLANILHA DE SERVIÇOS

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

MUNICÍPIO :

OBRA :

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO PARCIAL (R\$)	PREÇO SUBTOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL								

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CAU nº e assinatura Responsável Técnico habilitado)



MODELO 09 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº ____/200__ -

PROPONENTE :

MUNICÍPIO / LOCAL

ÁREA CONSTRUÍDA

OBJETO :

PRAZO DE EXECUÇÃO :

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							TOTAL		COF	
			30	60	90	120	150	180	210		SERVIÇO		ACUMULADO
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											
		%											
		R\$											

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, nº RG e CREA e assinatura do engenheiro)



MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

Eu, (inserir o nome), RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número), para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº (inserir o número), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Local, ____ de ____ de 201__.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal pela proponente)



MODELO Nº 11

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

Eu, (inserir o nome), RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número do CNPJ da proponente), declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, objeto do Contrato nº (inserir número), somente foram utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exótica), de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Local, ____ de ____ de 201__.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal pela proponente)

Obs.: Este modelo será utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do certame, conforme item 22.2 letra “g” deste edital.



MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Ref. : Edital de Concorrência nº ____/____

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Local, ____ de ____ de 201__.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal).



MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Concorrência nº ____/____

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local, de de 2017.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal).



MODELO Nº 14

CONTRATO Nº XX/2017

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA E A
, NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir nº), a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu (inserir nome do representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir nº), inscrito no CPF sob n.º (inserir nº), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir nº), localizada na (inserir endereço), a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por (inserir nome do representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir nº), inscrito no CPF sob n.º (inserir nº), residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n.º (inserir nº) conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de (inserir objeto), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º xx/2017, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ (inserir valor) (inserir valor por extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas das seguintes fontes : R\$ serão financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM, a serem creditados em conta específica indicada pelo Município e R\$ a título de contrapartida municipal, através das dotações orçamentárias Órgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 10097 Código Reduzido: 3306 e Órgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 501 Código Reduzido: 951, respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R\$. Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitarão pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até (inserir prazo de execução) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 11º (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

- a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
- c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- g) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 660 (seiscentos e sessenta) dias, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
- b) manutenção e conservação da placa de obra até o recebimento definitivo da obra;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
- m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE.
- n) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula sétima; e
- o) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.
- p) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Parágrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- f) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.
- g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata.



h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro.

Parágrafo Único

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do “Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (*cinco*) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;



- e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;
- e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
- f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
- f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);
 - f.2) do Termo de Recebimento Provisório;
 - f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
 - f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra.
- g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:
- g.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;
 - g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (*Modelo n.º 11*) em anexo;
 - g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
 - g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.
- h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaio – firmado pelo CONTRATANTE e pelo responsável da CONTRATADA –, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do (inserir no de contratante) – CNPJ n.º (inserir nº)

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:



$$SR = S (I12 / I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.



CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro

Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Mari de Jesus Reis Lazzari, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Parágrafo Segundo

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Euclides Luiz Weiss, e ao fiscal substituto Sr. (a) Douglas Cristian Strapazzon, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

Parágrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

Parágrafo Quarto

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parágrafo Quinto

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Sétimo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Nono

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

Parágrafo Décimo

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta.

Parágrafo Décimo Terceiro

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo Quarto

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.



Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.



Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA

assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá

obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
- c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
- d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:
 - e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
 - e.2) não mantiver sua proposta;
 - e.3) abandonar a execução do contrato;
 - e 4) incorrer em inexecução contratual.



f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:

- f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
- f.2) apresentar documento falso;
- f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
- f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
- f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
- f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;
- f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.

Parágrafo Primeiro

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do valor da garantia contratual.

Parágrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f" da Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa e prévia do PARANACIDADE.

Parágrafo único



Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Único

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de *(inserir nome da comarca)*, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

(Inserir local), de de 2017.

CONTRATANTE
Frank Ariel Schiavini

CONTRATADA

Assinatura do Responsável
CREA/CAU nº

Testemunhas:

RG

RG







ANEXO DO CONTRATO/ DECLARAÇÃO

RECAPES EM CBUQ – PMF – TRATAMENTOS (TST

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Revestimento em CBUQ / PMF

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos

Programa

SAM

Lote

Medição nº

SIT nº

Empresa Contratada

CNPJ

Nº Contrato Empreitada

Valor do Contrato

Valor Medido Acumulado

Percentual Executado

Serviços:

(%) executado

Terraplanagem:

Reforço do Subleito:

Regularização e compactação do subleito:

Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do contrato de empreitada, conforme normas técnicas vigentes, atestando que as espessuras médias das camadas estão de acordo com o projeto, bem como, atestando a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informação prestada.

Local

data.

Nome

Formação - CREA/CAU

Responsável pela Fiscalização da Obra



MODELO 15
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° (inserir o número) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador)

PROPONENTE : (inserir o nome da proponente)

MUNICÍPIO / LOCAL :

OBJETO :

ÁREA CONSTRUÍDA :

LOTE :

PRAZO DE EXECUÇÃO :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
01	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
02	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
03	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
04	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
05	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
06	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
07	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
08	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
09	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
10	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
11	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
12	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
13	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
14	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
15	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
16	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								

EXEMPLO:

NN	NONONONONONONO	UTILIZAÇÃO									
		QUANTIDADE		2	4	3	2	2			

—(inserir o local), (inserir a data) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, RG n°, CREA n° e assinatura do engenheiro habilitado)

57



ANEXO I

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____.

MUNICÍPIO:

OBRA:

I - ELEMENTOS GRÁFICOS



ANEXO II

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____.

MUNICÍPIO:

OBRA:

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS



ANEXO III

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____.

MUNICÍPIO:

OBRA:

I - RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - ORÇAMENTO



ANEXO IV

MODELO DE PLACA (CD)



(ANEXO V)
PLANILHA DE INSUMOS

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA	SAM	38		
Projeto:		RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	LOTE	01		
Local da Obra:	PERIMETRO URBANO					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	UD	ORÇAMENTO APROVADO
			km	(ton)		QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00			un	1,00
2		TERRAPLENAGEM				
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm			un	58,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm			un	227,00
4		REVESTIMENTO				
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)			m2	34.160,41
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	410,00	0,0005	m2	68.320,82
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento			ton	1.708,03
170500	DER mat	CAP (Araucária)	410,00	0,0570		
transporte		Areia	250,00	0,1000		
transporte		Cal Hidratada CH-1	410,00	0,0150		
transporte		Brita (usina)		0,8280		
transporte		Massa	10,00	1,0000		
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - capa			ton	3.416,05
170500	DER mat	CAP (Araucária)	410,00	0,0570		
transporte		Areia	250,00	0,1000		
transporte		Cal Hidratada CH-1	410,00	0,0150		
transporte		Brita (usina)		0,8280		
transporte		Massa	10,00	1,0000		
5		MEIO-FIO E SARJETA				
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio			m	5.202,80
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	10,00	0,0982	m	1.488,78
6		PAISAGISMO / URBANISMO				
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)			m	12.832,54
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos			m2	7.610,49
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	20,00	1,5000	m3	380,52
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	19,00	0,1200	m2	6.457,17
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem	19,00	0,1200	m2	1.153,22



		colchão			
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas		m2	2.338,24
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2		un	128,00
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		m2	2.069,83
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE		m2	9,71
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m		ud	43,00
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO		ud	23,00
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO		ud	37,00
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas		un	47,00
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica		un	47,00
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso		un	47,00
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa		un	47,00
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	5,0000	gb	1,00



ANEXO VI
BDI (composição)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 3,50
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	6,15
ADMINISTR.	10,00
EVENTUAIS	5,00
LUCRO	6,00
BDI	29,959
BDI= 1,0615x1,10x1,05x1,06	
BDI arredond.	30%

lana



De: Adriana de Fátima Schweiger <adrianaf@paranacidade.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de outubro de 2017 10:20
Para: lana
Assunto: RES: DÚVIDAS MINUTA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA SAM 38
Anexos: coronel vivida sam 38 concorrência sfm.doc

Boa dia lana!

- Referente ao cabeçalho (pág. 1) e ao valor (pág. 4), já estão corrigidos. (arquivo anexo)
- Os demais itens, consultei a Dra. Nayana, que me enviou a seguinte resposta:
 - 1) A observação que constam abaixo da alínea "f" refere-se às alíneas "e" e "f", pois esses são os documentos que podem ser substituídos pela certidão simplificada da Junta Comercial.
 - 2) A alínea "a" do item 3 diz respeito à prova de registro da proponente, pois os documentos relativos ao responsável técnico estão tratados nas alíneas "e", "f," e "g".

Atenciosamente,

Adriana de Fátima Schweiger

Procuradoria jurídica

Assistente de Suporte Técnico Administrativo

Fone: 41 3350-3401



De: lana [mailto:iana@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 17:35
Para: Adriana de Fátima Schweiger <adrianaf@paranacidade.org.br>
Assunto: DÚVIDAS MINUTA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA SAM 38

Boa tarde Adriana!!

Conforme contato telefônico, ao ler a minuta do edital de Concorrência recebida, verifiquei que:

- 1) na página nº 01 – cabeçalho, o nome do município está como "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIVA" e o correto é "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA"
- 2) na página nº 04 – item 06.recursos financeiros, o valor total em números esta "3.71.211,99" e o correto é "3.071.211,99".

Tenho umas dúvidas também:

1) na página nº 07 – OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

São quais esses documentos?

Todos os documentos da 1) Quanto à Habilitação Jurídica?

Letras A a F? ou seriam apenas as letras E e F?



2) na página 08 - letra a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

É da pessoa física ou jurídica?

Geralmente, nos nossos editais consta os dois tipos de registro

a) **Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente)** no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritos no CREA ou CAU de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA ou CAU do Estado licitante, por força do disposto na Lei Federal nº 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a Resolução nº 265/79, de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;

b) **Certidão de Inscrição de Pessoa Física** expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro do prazo de validade, do profissional que tenha formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços.

Aguardo retorno.

Muito obrigada!

Att, Iana Schmid

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8304

iana@coronelvivida.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ



PARECER JURÍDICO

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Concorrência. Recapeamento Asfáltico. Análise jurídica prévia. Aprovação Condicionada.

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1. Trata-se de solicitação para Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas.
2. O procedimento se encontra devidamente autuado e numerado, nos termos do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93.
3. Destaca-se que os autos se encontra instruído com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:
 - a) Ofício nº 093/2017, Projetos, orçamentos, projetos, memorial descritivo, quantitativos e outros - fls. 02/54;
 - b) Ofício nº 798/2017 do Prefeito Municipal determinando os encaminhamentos para o setor contábil para indicar a dotação orçamentária; para elaboração das minutas do edital e contrato e exame e aprovação de modalidade das referidas minutas - fl. 54;
 - c) Ofício nº 151/2017 - indicação de dotação orçamentária - fl. 55;
 - d) Ofício nº 170/2017 - Remessa da Comissão de Licitação para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 - fl. 56
 - e) Minuta do Edital e anexos - fls. 57/122.
4. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação.

ANÁLISE JURÍDICA

I. DO OBJETO E DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

5. A concorrência é a modalidade de licitação que se realiza, com ampla publicidade, para assegurar a participação de quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos no edital, consoante previsto no art. 22, inciso I, e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
6. Configura-se como a espécie apropriada para os contratos de grande vulto e valor, não se exigindo registro prévio ou cadastro dos interessados, cumprindo que satisfaçam as condições prescritas em edital, que deve ser publicado com, no mínimo, trinta dias de intervalo entre a publicação e o recebimento das propostas. Caso seja adotado um certame de acordo com os tipos, como os de menor preço, técnica e preço e melhor técnica, esse intervalo mínimo é dilatado para quarenta e cinco dias (art. 21, §2º inciso I, alínea “b” e inciso II, alínea “a” da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.)
7. Isto posto, ante o objeto do certame e valor estimado para a licitação (R\$ 3.071.211,99), deverá ser na modalidade concorrência.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA

8. Jessé Torres Pereira Júnior elenca as características que integram a essência da concorrência, veja-se:

“Conformam o perfil da concorrência: a) ausência de pré-requisito para o interessado participar da licitação; b) exigência de habilitação preliminar; c) cabimento para objeto de valor elevado (art. 23, I, c e II, c, bem como nas hipóteses determinadas (art. 23, § 3º) ou autorizadas (art. 23, § 4º) em lei; d) convocação mediante edital, com prazo mínimo de quarenta e cinco (art. 21, § 2º, I, b) ou trinta dias (art. 21, § 2º, II, a); e) processo e julgamento segundo rito comum (art. 43), com as ressalvas do art. 46”. Pereira Júnior, Jessé Torres. In Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 6. ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 236.)

9. Lucas Rocha Furtado leciona que:

“A concorrência tem como principais características a “ampla publicidade” e a “universalidade”, conforme bem afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro. A ampla publicidade é demonstrada pela necessidade de publicação do aviso da licitação, nos termos do art. 21 da Lei de Licitações. A universalidade, a seu turno, caracteriza-se pela existência de uma fase inicial no procedimento da licitação, denominada habilitação, em que quaisquer interessados que demonstrem o preenchimento dos requisitos de qualificação (art. 27) poderão apresentar propostas”. (Furtado, Lucas Rocha. In Curso de licitações e Contratos Administrativos, Teoria, Prática e Jurisprudência, São Paulo, Atlas, 2001, p. 109.)

Da justificativa da contratação

10. O Ofício nº 93/2017 (fls. 02/03) justifica a aquisição, bem como consigna que se trata de projeto aprovado de operação de crédito autorizado pela Lei Municipal nº 2.760/2017.
11. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que não agreguem valor

ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente.

12. Desse modo, entende-se o a justificativa apresentada é apta para ensejar a abertura do certame.

Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

13. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

14. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve consignar a justificativa nos autos.

15. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

16. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

17. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à contratação desejada (Acórdão nº 1.782/2010-Plenário) e que não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão nº 4.561/2010-1ª Câmara).

18. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:

- a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1);
- b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);
- c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);
- d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-1).

19. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.

20. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da participação no certame¹, uma vez que o valor contratual estimado é determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

21. Neste caso as Planilhas de Serviços se basearam em tabelas preexistentes, o que se entende válido.

Da previsão de existência de recursos orçamentários

¹ Art. 18, I da LC nº 123/2006; Art. 6º do Decreto nº 6.204/2007 e art. 34 da Lei nº 11.488/2007.





22. A Lei nº 8.666/93, estabelece que a realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços. A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e suficiente, cumpre com o presente requisito.

Autorização para a abertura da licitação

23. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação.

Designação de Comissão de Licitação

24. Para a realização da licitação, a autoridade competente deve designar Comissão de Licitação, dentre os servidores do Município, cujas atribuições incluem o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Anote-se que o servidor designado deve ter realizado capacitação específica para exercer a atribuição.

25. Nos autos não consta a designação de Comissão de Licitação e a publicação deste ato, razão pela qual sugere sejam anexados tais documentos.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

26. A Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos pregões, estabelece que a realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços comuns. A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e suficiente, cumpre com o presente requisito.

CONCLUSÃO

27. Ante o exposto, entende esta Assessoria Jurídica:

- a) Seja justificado pelo órgão solicitante se a contratação de fato é necessária neste ano, face o disposto no Decreto nº 6.278/2017, que dispõe sobre a contenção de gastos para manter o equilíbrio entre receita e despesa das finanças municipais, bem como seja solicitada a declaração contábil se haverá custos imediatos com a obra ou ela será inteiramente financiada, em havendo tais custos, a fim de atestar se tais despesas não terão impacto percentual constitucional mínimo que deve ser investido em saúde e educação, esclarecendo se eventual investimento terá risco em desequilibrar das contas públicas;
- b) Seja o objeto da contratação aprovada pelo Chefe do Executivo;
- c) Seja realizada a juntada de ato da Comissão de Licitação;

32. Entende-se que o Edital do certame cumpre o disposto no art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.

33. Registre-se, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do parágrafo único do art.




38 da Lei nº 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e pela autoridade competente do Município.

34. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as providências cabíveis.

Após, à consideração superior.

Coronel Vivida, 20 de outubro de 2017.



Priscila G. Gugik

OAB/Pr nº 51.356



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



OFÍCIO Nº 824/2017

PROTOCOLO Nº 171/2017

DE: Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal

PARA: Ademir Antonio Aziliero
Presidente da CML

DATA: 24.10.2017

Considerando os autos e após análise dos apontamentos contidos no parecer anexo ao presente processo AUTORIZO a licitação, que tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa da obra, totalizando 34.160,41 m²; conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo; nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações subsequentes.

Anexo ao presente, Portaria nº 02/2017, de 04 de Janeiro de 2017, designando a Comissão Permanente de Licitação, publicada no diário Oficial do Município em 06.01.2017.

Encaminhe-se à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PORTARIA Nº 02/2017, de 04 de janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida, para o período de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, composto pelos seguintes membros:


NOME	CARGO	CPF Nº	IDENTIDADE Nº
Ademir Antonio Aziliero	Presidente	472.871.799-20	3.934.749-0/PR
Fernando de Quadros Abatti	Membro Efetivo	044.650.189-16	8.178.961-4/PR
Iana Roberta Schmid	Membro Efetivo	050.669.369-47	8.407.675-9/PR
Leila Marcolina Gruntowski	Secretária	031.467.799-27	7.403.644-9/PR
Dinara Mazzucatto	Membro Suplente	032.434.999-84	8.613.696-1/PR
Douglas Cristian Strapazzon	Membro Suplente	041.032.719-06	8.907.764-8/PR
Sidnei Ghisolfi	Membro Suplente	017.880.249-23	5.777.872-5/PR

Art. 2º DELEGAR poderes para, ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Presidente da Comissão, para assinar editais, avisos e ofícios decorrentes de licitações.


Art. 3º No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2017.


FRANK ARIEL SCHIAVINI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Contabilista – CRC 25.365

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017

O município de Coronel Vívda, torna público para conhecimento dos interessados que está aberto a inscrição ao processo de Seleção de entidade (s) executora (s) (organização da sociedade civil, entidades sem fins lucrativos, visando a formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução do (s) Plano (s) de Trabalho: com a finalidade de auxílio financeiro, visando atender no método da Pedagogia de Alternância sendo uma metodologia de ensino, com formação no ensino médio em Técnico Profissionalizante em alimentos, utilizada para a formação do indivíduo do meio rural, se estrutura na ação conjunta entre escola e família. Com objetivo de possibilitar aos jovens do campo o conhecimento teórico e prático, para que tenham condições de trabalhar em sua propriedade rural e, assim, permanecer no campo, como finalidade de permanência do jovem na sua própria região, criando alternativas de trabalho e renda, numa perspectiva da Economia Solidária. Os interessados deverão apresentar todos os documentos até as 14:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2017 junto ao setor de protocolo da administração municipal, na Praça Ângelo Mezomo, s/n. O edital está disponível para retirada na sede do Município de Coronel Vívda, sito a Praça Ângelo Mezomo, s/n, Coronel Vívda, Paraná ou através do site www.coronelviva.pr.gov.br e informações (46) 3232-8300. Coronel Vívda, 05 de janeiro de 2017. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da Comissão de Seleção.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2017

O Prefeito de Pato Branco, no uso de suas atribuições legais, com base no Decreto nº 22, de 22 de maio de 2017, da Lei Complementar nº 001 de 17 de dezembro de 1998 (Código Tributário Municipal), e no art. 142 do Código Tributário Nacional, faz saber aos contribuintes do IBSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, que pelo decreto nº 8.060 de 08 de dezembro de 2016, foram fixadas as datas de vencimento das parcelas do recolhimento do IBSQN, correspondente ao ano fiscal de 2017.

1ª Parcela	01/12	Vencimento em 20 de fevereiro de 2017
2ª Parcela	02/12	Vencimento em 20 de março de 2017
3ª Parcela	03/12	Vencimento em 20 de abril de 2017
4ª Parcela	04/12	Vencimento em 22 de maio de 2017
5ª Parcela	05/12	Vencimento em 20 de junho de 2017
6ª Parcela	06/12	Vencimento em 20 de julho de 2017
7ª Parcela	07/12	Vencimento em 21 de agosto de 2017
8ª Parcela	08/12	Vencimento em 20 de setembro de 2017
9ª Parcela	09/12	Vencimento em 20 de outubro de 2017
10ª Parcela	10/12	Vencimento em 20 de novembro de 2017
11ª Parcela	11/12	Vencimento em 20 de dezembro de 2017
12ª Parcela	12/12	Vencimento em 20 de janeiro de 2018

Ficam assim, NOTIFICADOS do lançamento do IBSQN para o ano de 2017, os contribuintes inscritos no cadastro municipal, cujo valor vem fixado pela Lei Complementar 001/98 e suas alterações, tendo os mesmos o prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento da primeira parcela para impugnação.

Finalmente, NOTIFICA os referidos contribuintes, que os cartões relativos ao lançamento do IBSQN deverão ser impressos no site do Município, www.pato Branco.pr.gov.br através do link Portal do Cidadão. Na impossibilidade de emissão on-line, as guias deverão ser retiradas junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pato Branco.

Gabinete do Prefeito, 4 de janeiro de 2017.

AUGUSTINO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2017

O Prefeito de Pato Branco, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Decreto 8.060 de 08 de dezembro de 2016 NOTIFICA os contribuintes que foram fixadas as respectivas datas de vencimento do recolhimento das taxas a seguir, relativas ao ano fiscal de 2017.

- 30/06/2017 - Taxa de Verificação e Regular Funcionamento
- 31/07/2017 - Taxa de Vigilância Sanitária

Ficam NOTIFICADOS do lançamento das referidas taxas para o ano de 2017, esses com seu valor fixado pela Lei Complementar nº 001/98, de 17 de dezembro de 1998 em seus anexos III e IV, e ainda que os mesmos tenham o prazo de 30 (trinta) dias anteriores a data de vencimento da parcela, para querendo, apresentar impugnação.

NOTIFICA os referidos contribuintes, que os cartões relativos ao lançamento das taxas acima mencionadas, deverão ser impressos através do site www.pato Branco.pr.gov.br ou retirados junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pato Branco.

Gabinete do Prefeito, 4 de janeiro de 2017.

AUGUSTINO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA

Nº PORTARIA	NOME	ASSUNTO	DATA
001	RAQUEL CALEFFI	GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO POR	03/01/2017
002	NELCIO RENATO ALVES FERREIRA	LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA	03/01/2017
003	JOSE NILTON SANGUININI	EXONERA COMMISSIONADO DE CARGO	03/01/2017
004	JOSE NILTON SANGUININI	NOMEIA EM CARGO COMMISSIONADO	03/01/2017
005	ENIO RUARO	NOMEIA EM CARGO COMMISSIONADO	03/01/2017
006	PREFEITO MUNICIPAL	ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	03/01/2017
010	ELIANE LAUTERIO DAS DORES E OUTROS	REMOÇÃO	03/01/2017
012	DIOGO GASPERIN	CANCELA AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E ALTERA FG	03/01/2017
013	RODRIGO JOSE CORREIA	LICENÇA PARA MANDATO ELEITIVO	03/01/2017

A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (ela) no seguinte endereço eletrônico: amsp.dioens.com.br - Edição do dia 06 de janeiro de 2017, respectivamente, conforme Lei Complementar Autorizativa nº 51, de 21 de dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS - PR

Decreto Nº 001/2017 - Data: 05/01/2017

Súmula: Estabelece as quotas bimestrais da Receita e Despesa, Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal para o Exercício de 2017.

A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: amsp.dioens.com.br, edição do dia 06/01/2017, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 06/2012 de 25/01/2012.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Aditivo nº 05 - Ata de Registro de Preços nº 33/2016 - Pregão Presencial nº 23/2016. Contratante: Município de Coronel Vívda juntamente com o Fundo Municipal de Saúde - Detentora: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/ME nº 04.217.590/0001-60. Considerando a solicitação da DETENTORA, bem como declaração da farmacêutica, responsável técnica pela farmácia municipal e análise jurídica, fica de comum acordo entre as partes, concedido a SUBSTITUIÇÃO DO LABORATÓRIO do medicamento: Item 10 - citalopran 20 mg, compr do laboratório TEUTO, por citalopran 20 mg, compr do laboratório AUROBINDO; O mesmo possui registro da ANVISA e o valor continua inalterado, sendo compatível a troca, sem prejuízo para os usuários. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 12 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

PORTAL DO SUDOESTE

Decreto Nº 002/2017

ADEMIR JOSÉ SHELTER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob nº. 35.008 e o parecer xerado pelo Departamento Jurídico. DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida licença especial e servidora LORENI BOLICO FLIZIKOWSKI.

Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 30/12/2016 e findará em 30/03/2017, sendo de 03 (três) meses, referente ao período de 2003 a 2008.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 05 DE JANEIRO DE 2017.

ADEMIR JOSÉ SHELTER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECARA D'OESTE - PR

Decreto Nº 003/2017

DATA: 02.01.2017

SÚMULA: Nomear a Sra. Rejane Arisi Venturin para ocupar o Cargo em Comissão de Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social.

O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IX do art. 65 da Lei Orgânica do Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná de 02/04/90 e Lei Municipal nº 468/93 de 22/01/93, artigos 4º, 5º, Parágrafo Único, 6º, 7º e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º e Lei Municipal nº 568/97 de 11/03/97, tabela "A" e "B" da Lei Municipal nº 1637/2016 de 15.03.2016 e Lei Municipal nº 1679/2016 de 30.09.2016.

DECRETA:

Art. 1º A designação a partir da data de 02.01.2017 para ocupar o Cargo de Provisório em Comissão de Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social a Sra. REJANE ARISI VENTURIN, portadora do CPF nº 032.795.209-16 e RG nº 7.546.419-3 SSP/PR, lotada no Departamento Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Fica o servidor referido no "caput" do Art. 1º (primeiro), com plenos poderes para movimentação bancária do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto, correrão por conta das Dotações do Orçamento Geral do Município.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02.01.2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2017.

Registre-se e Publique-se.

Agilberto Lucindo Perin,
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA

Nº PORTARIA	NOME	ASSUNTO	DATA
001	RAQUEL CALEFFI	GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO POR	03/01/2017
002	NELCIO RENATO ALVES FERREIRA	LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA	03/01/2017
003	JOSE NILTON SANGUININI	EXONERA COMMISSIONADO DE CARGO	03/01/2017
004	JOSE NILTON SANGUININI	NOMEIA EM CARGO COMMISSIONADO	03/01/2017
005	ENIO RUARO	NOMEIA EM CARGO COMMISSIONADO	03/01/2017
006	PREFEITO MUNICIPAL	ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	03/01/2017
010	ELIANE LAUTERIO DAS DORES E OUTROS	REMOÇÃO	03/01/2017
012	DIOGO GASPERIN	CANCELA AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E ALTERA FG	03/01/2017
013	RODRIGO JOSE CORREIA	LICENÇA PARA MANDATO ELEITIVO	03/01/2017

A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (ela) no seguinte endereço eletrônico: amsp.dioens.com.br - Edição do dia 06 de janeiro de 2017, respectivamente, conforme Lei Complementar Autorizativa nº 51, de 21 de dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS - PR

Decreto Nº 001/2017 - Data: 05/01/2017

Súmula: Estabelece as quotas bimestrais da Receita e Despesa, Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal para o Exercício de 2017.

A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: amsp.dioens.com.br, edição do dia 06/01/2017, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 06/2012 de 25/01/2012.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 01/2017, de 04 de janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" inciso II RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissão Permanente para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, para fins de participação em licitações públicas promovidas pelo Município de Coronel Vívda, para o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, composta pelos seguintes membros:

NOME	CARGO	CPF Nº	IDENTIDADE Nº
Isaac Delmar Faria	Presidente	920.288.098-03	5.902.350-9
Luana Meneses	Membro	080.416.859-74	9.328.116-2
Olga de Fátima Matias	Membro	757.576.729-00	6.170.461-2

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista - CRC 25.365

PORTARIA Nº 02/2017, de 04 de janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" inciso II RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização das licitações do Município de Coronel Vívda e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vívda, para o período de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, composta pelos seguintes membros:

NOME	CARGO	CPF Nº	IDENTIDADE Nº
Ademir Antonio Aziliero	Presidente	472.671.799-30	3.954.746-0PR
Fernando de Quadros Abatti	Membro Efetivo	544.055.189-16	6.178.351-4PR
Isana Roberta Schmidt	Membro Efetivo	550.665.389-47	6.407.875-9PR
Luiz Marcelino Gontowski	Secretaria	031.487.799-37	7.403.844-3PR
Elina Mazzaletto	Membro Suplente	032.434.999-84	8.613.595-1PR
Douglas Cristian Strapazzon	Membro Suplente	041.032.719-06	8.907.764-8PR
Sidnei Ghislini	Membro Suplente	017.880.249-23	5.777.872-5PR

Art. 2º DELEGAR poderes para, ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Presidente da Comissão, para assinar editais, avisos e ofícios decorrentes das licitações.

Art. 3º No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista - CRC 25.365

PORTARIA Nº 03/2017, de 04 de janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 1708/2003 de 18/03/03, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 16.520/2002, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS ABATTI, portador do CPF nº 044.656.189-16, para assessorar e auxiliar o Município de Coronel Vívda e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vívda, para o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, e a equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 2º O pregoeiro, fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do Município, técnicos de área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista - CRC 25.365

PORTARIA Nº 04/2017, de 04 de janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 1708/2003 de 18/03/03, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 16.520/2002, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a Servidora IANA ROBERTA SCHMID, portadora do CPF nº 050.889.369-47, para desempenhar a função de suplente de Pregoeiro do Itel FERNANDO DE QUADROS ABATTI, portador do CPF nº 044.656.189-16, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de Coronel Vívda e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vívda, para o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

§ 1º A suplente exercerá a função de Pregoeira nas ausências do titular, devendo isto constar no procedimento licitatório.

§ 2º A equipe de apoio de licitação na modalidade Pregão é composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 2º A pregoeira, fica autorizada a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do Município, técnicos de área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista - CRC 25.365

Câmara Municipal de Vitorino

Estado do Paraná

CNPJ 17.776.645/0001-84

DECRETO Nº 01/2017

MARCIO ROBERTO TIBES, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de seu cargo, no exercício do art. 72, § 1º e suas alterações posteriores, da Lei Federal 4.320/64 (Art. 76 e 80) e artigo 74 da Constituição Federal, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer curricularmente a função de Controlador Interno do Poder Legislativo Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, o servidor público efetivo, LUIZ FERNANDO TURRA, portador do RG: 519.626-2 e CPF: 040.925.239-55, nos termos das Resoluções nº 05/2013 e 03/2016, no período de 02 de janeiro de 2017 até a data do 31 de dezembro de 2018.

Art. 2º - Fica revogado o Decreto Legislativo nº 14/2018.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 05 de janeiro de 2017.

MARCIO ROBERTO TIBES
Presidente da Câmara Municipal

Rua Barão de Capanema, 273 - Fone/Fax: (41) 3321-1137 - 85.500-000 - Vitorino - Paraná
e-mail: marcio@vitorino.pr.gov.br - <http://www.vitorino.pr.gov.br>

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná



Sexta-Feira, 06 de Janeiro de 2017

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano VI - Edição Nº 1268

Página 38 de 58

Aditivo nº 05 – Ata de Registro de Preços nº 33/2016 – Pregão Presencial nº 23/2016.

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde-Donatária: ANAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF nº 04.217.590/0001-80. Considerando a solicitação da DETENTORA, bem como declaração da farmacêutica, responsável técnica pela farmácia municipal e análise jurídica, fica de comum acordo entre as partes, concedido a SUBSTITUIÇÃO DO LABORATÓRIO DO medicamento: Item 10-citalopran 20 mg, compr do laboratório TEUTO, por citalopran 20 mg, compr do laboratório AUROBINDO; O mesmo possui registro da ANVISA e o valor continua inalterado, sendo compatível a troca, sem prejuízo para os usuários. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 12 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod2017-447

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017

O município de Coronel Vivida, torna público para conhecimento dos interessados que está aberto a inscrição ao processo de Seleção de entidade (s) executora (s) (organização da sociedade civil, entidades sem fins lucrativos, visando a formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução do (s) Plano (s) de Trabalho: com a finalidade de auxílio financeiro, visando atender no método da Pedagogia de Alternância sendo uma metodologia de ensino, com formação no ensino médio em Técnico Profissionalizante em alimentos, utilizada para a formação do indivíduo do meio rural, se estrutura na ação conjunta entre escola e família. Com objetivo de possibilitar aos jovens do campo o conhecimento teórico e prático, para que tenham condições de trabalhar em sua propriedade rural e, assim, permanecer no campo, coma finalidade de permanência do jovem na sua própria região, criando alternativas de trabalho e renda, numa perspectiva da Economia Solidária. Os interessados deverão apresentar todos os documentos até as 14:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2017 junto ao setor de protocolo da administração municipal, na Praça Ângelo Mezzomo, s/n. O edital está disponível para retirada na sede do Município de Coronel Vivida, sito a Praça Ângelo Mezzomo, s/n, Coronel Vivida, Paraná ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br e informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 05 de janeiro de 2017. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da Comissão de Seleção.

Cod2017-499

Termo de Rescisão ao Contrato nº 113/2015-Pregão Presencial nº 81/2015

Cujo objeto é a prestação de serviços especializados complementares de saúde, onde firmam, de um lado, o Município de Coronel Vivida juntamente com Fundo Municipal de Saúde, como CONTRATANTE e do outro, a empresa CLINICA MÉDICA SIQUEIRA & LUCIANO LTDA, CNPJ nº 17.559.335/0001-47, como CONTRATADA; as quais, RESOLVEM: Rescindir amigavelmente o contrato nº 113/2015, a partir de 20.12.2016, dando-se o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes. Coronel Vivida, 19 de dezembro de 2016. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod2017-499

PORTARIA Nº 01/2017, de 04 de Janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR Comissão Permanente para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, para fins de participação em licitações públicas promovidas pelo Município de Coronel Vivida, para o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, composto pelos seguintes membros:

NOME	CARGO	CPF Nº	IDENTIDADE Nº
Ines Delmira Poletto	Presidente	020.289.009-03	5.902.558-9
Luana Marcolina	Membro	090.416.889-74	9.325.715-2
Olga de Fátima Matias	Membro	757.576.729-00	5.170.461-2

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias de mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista – CRC 25.365

PORTARIA Nº 02/2017, de 04 de Janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida, para o período de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, composto pelos seguintes membros:

NOME	CARGO	CPF Nº	IDENTIDADE Nº
Ademir Antonio Aziliero	Presidente	472.871.799-20	3.934.749-0/PR
Fernando de Quadros Abatti	Membro Efetivo	044.650.189-16	8.178.961-4/PR
Iana Roberta Schmid	Membro Efetivo	050.669.369-47	8.407.875-9/PR
Leila Marcolina Giuntowski	Secretária	031.467.799-27	7.403.644-9/PR
Dinara Mazzucatto	Membro Suplente	032.434.999-84	8.613.696-1/PR
Douglas Cristian Strapazzon	Membro Suplente	041.032.719-06	8.907.764-8/PR
Sidnei Ghisolfi	Membro Suplente	017.880.249-23	5.777.872-5/PR

Art. 2º DELEGAR poderes para, ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Presidente da Comissão, para assinar editais, avisos e ofícios decorrentes de licitações.

Art. 3º No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista – CRC 25.365

PORTARIA Nº 03/2017, de 04 de Janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 1708/2003 de 18/03/03, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS ABATTI, portador do CPF nº 044.650.189-16, para desempenhar a função de Pregoeiro, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, e a equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 2º O pregoeiro, fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do Município, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias de mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal - Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista – CRC 25.365

PORTARIA Nº 04/2017, de 04 de Janeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 1708/2003 de 18/03/03, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a Servidora IANA ROBERTA SCHMID, portadora do CPF nº 050.669.369-47, para desempenhar a função de suplente de Pregoeiro do titular FERNANDO DE QUADROS ABATTI, portador do CPF nº 044.650.189-16, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

§ 1º. A suplente exercerá a função de Pregoeira nas ausências do titular, devendo isto constar no procedimento licitatório.

§ 2º. A equipe de apoio de licitações na modalidade Pregão é composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 2º A pregoeira, fica autorizada a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do Município, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias de mês de janeiro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista – CRC 25.365

Cod2017-500



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificação Padrão ICP-Brasil. AMSP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

83331935



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2017

I - PREÂMBULO

01. OBJETIVO

O Estado do Paraná, por meio do Sistema de Financiamento de Ações está financiando ao Município abaixo identificado(s) objeto(s) abaixo descrito(s).

O Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios – SFM, foi instituído pelo Decreto Estadual n.º 5631/2002, é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU, por meio do seu ente de cooperação Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO

O MUNICÍPIO de CORONEL VIVIDA, ora denominado licitador, torna público que às 09:00 horas do dia 24 de novembro do ano de 2017, na rua Praça Angelo Mezzomo nº s/n - Centro em Coronel Vivida, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as propostas para execução da(s) obra(s) objeto da Concorrência n.º 04 - 2017. Esta licitação, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, Lei Complementar Federal n.º 123/2006; Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, **por escrito**, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), sendo que as respostas serão enviadas **por escrito** a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE GRANDES ITENS

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Perímetro Urbano.

ITEM	DESCRIÇÃO – GRANDES ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%
2	TERRAPLENAGEM	0,17%
4	REVESTIMENTO	65,69%
5	MEIO-FIO E SARJETA	4,22%
6	PAISAGISMO / URBANISMO	25,56%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	3,73%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	0,57%

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o **Preço Máximo** estabelecido no **item 04.1**, sob pena de desclassificação.

04.5 O prazo de execução e a data de início da (s) obra (s) será contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12 / I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n.º 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que))	(SG) (valor maior que)
1	1	1

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

06. RECURSOS FINANCEIROS.

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas das seguintes fontes: R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) serão financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM, a serem creditados em conta específica indicada pelo Município e R\$ 71.211,99 (setenta e um mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos) a título de contrapartida municipal, através das dotações orçamentárias Orgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 10097 Código Reduzido: 3306 e Orgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 501 Código Reduzido: 951, respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R\$ 3.071.211,99 (três milhões, setenta e um mil, duzentos e onze reais e noventa e nove centavos). Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitarão pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento.

07. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no **item 02**, em horário comercial, ou solicitada por meio do e-mail iana@coronelvivida.pr.gov.br, ademir@coronelvivida.pr.gov.br, douglas@coronelvivida.pr.gov.br. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao **item 03.2**.

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

- a) carta-credencial (Modelo n. ° 01);
- b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02);
- c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declaração formal de dispensa (Modelo n. ° 03.1);
- d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. ° 04);
- e) capacidade financeira (Modelo n. ° 05);
- f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n. ° 06);
- g) carta-proposta de preços (Modelo n. ° 07);
- h) planilha de serviços (Modelo n. ° 08);
- i) cronograma físico-financeiro (Modelo n. ° 09);
- j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 10);
- k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11);
- l) declaração de que a proponente enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006 (Modelo n° 12);

- m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n.º 13);
- n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n.º 14);
- o) anexo do Contrato – ensaios e declaração;
- p) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n.º 15);
- q) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n.º 16);
- r) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo I);
- s) especificações técnicas e memoriais (Anexo II);
- t) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III);
- u) modelo de placa (Anexo IV);
- v) planilha de Insumos (Anexo V);
- w) BDI - composição (Anexo VI).

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo n.º 08) em meio digital.

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderão participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, devidamente constituída.

08.2 Está impedido (a) de participar da licitação:

- 1) o autor do projeto básico ou executivo da obra;
- 2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (*cinco por cento*) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;
- 3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o licitador.
- 4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;
- 5) consórcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.

09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste edital, os envelopes:

- a) **ENVELOPE N.º 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR;**
- b) **ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.**

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL CONCORRÊNCIA Nº __.201__ ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR DATA: __ / __ /201__

RAZÃO SOCIAL CONCORRÊNCIA Nº __.201__ ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS DATA: __ / __ /201__

09.3 A proposta (*envelopes n.º 01 e n.º 02*) poderá ser entregue diretamente pela proponente à Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta (*envelopes n.º 01 e n.º 02*) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português.

09.5 No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s) proposta (s) (*envelopes n.º 01 e n.º 02*) será (ão) recebida (s).

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (*sessenta*) dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos **itens 10.2, 1 “d”, “e” e “f”, 3 “d” e “g”, 4 “b” e “d”**. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deverão estar inseridos no envelope n.º 01:

1) Quanto à Habilitação Jurídica:

a) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (*Modelo nº 13*).

b) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, (*Modelo nº 10*).

c) declaração de microempresa (*ME*), empresa de pequeno porte (*EPP*) ou empresa individual de responsabilidade limitada (*EIRELI*) para os fins da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 (*Modelo nº 12*), quando for o caso.

d) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

e) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual.

f) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas:

a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União;

b) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa;

OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado.

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRS);

2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) Quanto à Qualificação Técnica:

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

b) declaração de recebimento de documentos (*Modelo n.º 02*);

c) atestado de visita (*Modelo n.º 03*), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3232-8323 ou 3232-8349 data limite para o agendamento 21/11/2017; ou declaração formal (*Modelo n.º 03.1*), assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante

d) atestado (*s*) e/ou declaração (*ões*), **em nome da proponente**, expedido (*s*) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANTIDADE MÍNIMA
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ	2.050,00 ton

OBS: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos serviços deverá ser atendida em um do (*s*) atestado (*s*) ou declaração (*ões*), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço com a apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações.

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (*Modelo n.º 04*) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do responsável (*eis*) técnico (*s*) indicado (*s*), emitido (*s*) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2;

g) comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para

dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

h) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso não conste a relação mínima neste anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, n.º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (*Modelo n.º 15*);

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (*Modelo n.º 16*), devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n.º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira:

a) prova de capacidade financeira conforme *Modelo n.º 05*, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de:

- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência Geral (SG),

tais índices serão calculados como se segue:

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LC = (AC / PC)$$

$$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$$

sendo :

AC - ativo circulante

PC - passivo circulante

AP - ativo permanente

RLP - realizável a longo prazo

ELP - exigível a longo prazo

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ão) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade;

d) comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° 1 e n. ° 2), por meio de índices oficiais específicos para o caso;

e) declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (*Modelo n. ° 06*), em anexo.

10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

10.4 O responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 10.2, subitem 3, alíneas “e”, “f” e “g”, com expressa autorização do licitador.

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. ° 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n. ° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

1) Carta-proposta de Preços (*Modelo n. ° 07*), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá conter:

- a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, e-mail, etc;
- b) data;
- c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
- d) prazo de execução do objeto em dias;
- e) prazo de validade da proposta (*mínimo de 60 dias*), contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n. ° 1 e n. ° 2*) pela Comissão de Licitação.
- f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços.

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme (*Modelo n. ° 08*), com nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura, conforme item 07.3. O licitante deverá apresentar a planilha, obrigatoriamente, contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.

3) Cronograma Físico-Financeiro (*Modelo n. ° 09*), devidamente preenchido, constando o nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa.

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS”.

12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “QUANTIDADES”.

12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “PREÇO UNITÁRIO”, e deverão ser apresentados para cada serviço, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*), na coluna “PREÇO PARCIAL” e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário.

12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*) na coluna “PREÇO SUBTOTAL” e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da planilha de serviços.

12.8 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (*Modelo n. ° 08*) na coluna “PREÇO TOTAL” e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de serviços.

12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n.º 1 e n.º 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que assim o desejarem, o **envelope n.º 2** que contém as propostas de preços e procederá à abertura dos **envelopes n.º 1** que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n.º 1 e n.º 2 o representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (*com poderes legais para representar a proponente*) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (*Modelo n.º 01*) com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em cartório. **A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes.**

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos **envelopes n.º 1 e n.º 2**, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (*quarenta e oito*) horas, a partir do recebimento da solicitação.

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (*edital, e-mail e publicação na imprensa oficial*).

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o desejarem.

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do **item 13.2**, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos **envelopes n.º 2**, por meio dos meios usuais de comunicação (*edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial*).

13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes n.º 2. Ato contínuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 Na data fixada para a sessão de abertura dos **envelopes n.º 2**, a Comissão de Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo **envelope n.º 2**, fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos meios convencionais, após a homologação da licitação.

14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos **envelopes n.º 2** das proponentes habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes.

14.3 Da reunião de abertura dos **envelopes n.º 2** será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, serão efetuadas as devidas correções.

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá, a não ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

14.11 Se o valor de um grande item (**item 04.3**) ultrapassar o percentual máximo admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro.

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no **item 04.3**. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.

14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

14.14 Será desclassificada a proposta:

- a) elaborada em desacordo com o presente edital;
- b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no **item 04.1**;
- c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
- d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
- e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
- f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;
- g) que venha a ser considerada inexecutável pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexecutáveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
- b) preço global orçado pelo licitador.

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da inexecutabilidade da proposta de preço.

14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a que se referem as alíneas **“a” e “b” do item 14.15**, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante do **item 14.15** e o preço global analisado.

14.18 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no **item 15**.

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (*edital, e-mail e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (**item 10.2, 2.1 “a” e “b”**), **mesmo que apresente alguma restrição**.

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP ou EIRELI.

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (*dez por cento*) superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou EIRELI.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EIRELI melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de ME, EPP ou EIRELI ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio dos meios usuais de comunicação (*edital, e-mail e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (*cinco*) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou EIRELI melhor classificada, serão convocadas as ME, EPP ou EIRELI remanescentes que se enquadrem na hipótese do **item 15.4**, segundo a ordem de classificação.

15.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou EIRELI, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo PARANACIDADE.

16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Modelo n.º 14), dentro do prazo máximo de 5 (*cinco*) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná.



16.4 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

17.1 A proponente vencedora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

17.2 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (*subitem 14.17*).

17.3 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei Federal n.º 8.666/1993.

17.4 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as garantias deverão ser devidamente prorrogadas.

17.5 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

- a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada;
- b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador.

17.6 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

- a) termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

18. PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é do 11º (*décimo primeiro*) dias a contar da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir do 11º (*décimo primeiro*) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários conforme Anexo I do contrato, parte integrante deste edital.

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

21. PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo.

22. PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (*cinco*) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município e a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

g.1) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos referidos materiais;

g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (*Modelo n.º 11*);

g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios – firmado pelo CONTRATANTE e pelo responsável da CONTRATADA –, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante no orçamento.

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

23.1 O recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula Décima Sexta da minuta do Contrato de Empreitada.

24. PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na Cláusula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada.

25. RESCISÃO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta de Contrato de Empreitada.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não ocorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto.

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital.

26.4 Durante a fase licitatória a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas instalações das proponentes.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

26.8 8 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente.

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Coronel Vivida, 24 de outubro de 2017.


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Presidente da Comissão de Licitação





MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, __ de __ de 201__

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº __/____

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. S^{as} que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, **com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais (opcional)** a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal).

(Nome, RG nº e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsável legal



MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Local, ____ de ____ de 201 ____.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal) .



MODELO Nº 03

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU nº (inserir o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Local, ____ de ____ de 201 ____.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável pelo licitador).

(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente)



MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Concorrência Nacional nº 04/2017

Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ nº:

Endereço:

Fone:

Fax:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) *(inserir o nome do representante)*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Curitiba, de de 2017.

(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico)



MODELO N° 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência n° ____/____

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura do responsável técnico

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Local, ____ de ____ de 201 ____.

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal)

MODELO N° 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência n° ____/____

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$		
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$		
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$		

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
 AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
 PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, ____ de ____ de 201__.

Representante legal
(Nome, RG n° e assinatura)

Contador
(nome, n° CRC e assinatura,)



MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

O signatário do presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, ____ de ____ de 201__.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal)



MODELO Nº 07

(Razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ/MF).

PROPOSTA DE PREÇOS

Local, __ de __ de 201__.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº __/__

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de ____, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução) (inserir o prazo de execução por extenso) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal)



MODELO Nº 08

PLANILHA DE SERVIÇOS

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

MUNICÍPIO :

OBRA :

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO PARCIAL (R\$)	PREÇO SUBTOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL								

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CAU nº e assinatura Responsável Técnico habilitado)



MODELO 09 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N° ____/200__ -

PROPONENTE :

MUNICÍPIO / LOCAL

ÁREA CONSTRUÍDA

OBJETO :

PRAZO DE EXECUÇÃO :

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)								TOTAL		COE INFL
		30	60	90	120	150	180	210		SERVIÇO	ACUMULADO	
		R\$										
		%										
		R\$										
		%										
		R\$										
		%										
		R\$										
		%										
		R\$										
		%										
		R\$										
		%										
		R\$										
		%										
		R\$										
		%										
	TOTAL DA PARCELA	R\$										
		%										
	TOTAL ACUMULADO	R\$										
		%										

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, nº RG e CREA e assinatura do engenheiro)



MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

Eu, (inserir o nome), RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número), para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº (inserir o número), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Local, ____ de ____ de 201__.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal pela proponente)



MODELO Nº 11

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____

Eu, (inserir o nome), RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número do CNPJ da proponente), declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, objeto do Contrato nº (inserir número), somente foram utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exótica), de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Local, ____ de ____ de 201__.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal pela proponente)

Obs.: Este modelo será utilizado posteriormente somente pela proponente vencedora do certame, conforme item 22.2 letra "g" deste edital.



MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Ref. : Edital de Concorrência nº ____/____

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Local, ____ de ____ de 201 ____.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal).



MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Concorrência nº ____/____

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local, de de 2017.

(Nome, RG nº e assinatura do responsável legal).



MODELO Nº 14

CONTRATO Nº XX/2017

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA E A
, NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir nº), a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu (inserir nome do representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir nº), inscrito no CPF sob n.º (inserir nº), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir nº), localizada na (inserir endereço), a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por (inserir nome do representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir nº), inscrito no CPF sob n.º (inserir nº), residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n.º (inserir nº) conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de (inserir objeto), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 04/2017, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ (inserir valor) (inserir valor por extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas das seguintes fontes : R\$
serão financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM, a serem creditados em conta específica indicada pelo Município e R\$ a título de contrapartida municipal, através das dotações orçamentárias
Orgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 10097 Código Reduzido: 3306 e Orgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 501 Código Reduzido: 951, respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R\$
. Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitarão pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até (inserir prazo de execução) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 11º (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

- a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
- c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- g) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 660 (seiscentos e sessenta) dias, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
- b) manutenção e conservação da placa de obra até o recebimento definitivo da obra;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
- m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaio emitida pela CONTRATANTE.
- n) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula sétima; e
- o) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.
- p) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

Parágrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- f) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.
- g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata.

h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro.

Parágrafo Único

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do “Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (*cinco*) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

- a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;
- b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
 - b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.
- c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
- e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
 - e.1) da ART pela CONTRATADA;



- e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;
- e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
- f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
- f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);
 - f.2) do Termo de Recebimento Provisório;
 - f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
 - f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra.
- g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:
- g.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;
 - g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (*Modelo n.º 11*) em anexo;
 - g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
 - g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.
- h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaio – firmado pelo CONTRATANTE e pelo responsável da CONTRATADA –, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do (inserir no de contratante) – CNPJ n.º (inserir n.º)

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12 / I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.



CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro

Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Mari de Jesus Reis Lazzari, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Parágrafo Segundo

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Euclides Luiz Weiss, e ao fiscal substituto Sr. (a) Douglas Cristian Strapazzon, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

Parágrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

Parágrafo Quarto

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parágrafo Quinto

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Sétimo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Nono

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

Parágrafo Décimo

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta.

Parágrafo Décimo Terceiro

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo Quarto

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA

assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá

obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
- c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
- d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:
 - e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
 - e.2) não mantiver sua proposta;
 - e.3) abandonar a execução do contrato;
 - e.4) incorrer em inexecução contratual.



f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:

- f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
- f.2) apresentar documento falso;
- f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
- f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
- f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
- f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;
- f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.

Parágrafo Primeiro

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do valor da garantia contratual.

Parágrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f" da Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa e prévia do PARANACIDADE.

Parágrafo único





Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Único

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de *(inserir nome da comarca)*, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

(Inserir local), de de 2017.

CONTRATANTE
Frank Ariel Schiavini

CONTRATADA

Assinatura do Responsável
CREA/CAU nº

Testemunhas:

RG

RG





ANEXO DO CONTRATO/ DECLARAÇÃO

RECAPES EM CBUQ – PMF – TRATAMENTOS (TST

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Revestimento em CBUQ / PMF

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista.



MODELO 15
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº (inserir o número) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador)

PROPOSITANTE : (inserir o nome da proponente)

MUNICÍPIO / LOCAL :

OBJETO :

ÁREA CONSTRUÍDA :

LOTE :

PRAZO DE EXECUÇÃO :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
01	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
02	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
03	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
04	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
05	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
06	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
07	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
08	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
09	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
10	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
11	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
12	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
13	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
14	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
15	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
16	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								

EXEMPLO:

NN	NONONONONONONONO	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE		2	4	3	2	2	

—(inserir o local), (inserir a data) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, RG nº, CREA nº e assinatura do engenheiro habilitado)

8
57



ANEXO I

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____.

MUNICÍPIO:

OBRA:

I - ELEMENTOS GRÁFICOS



ANEXO II

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____.

MUNICÍPIO:

OBRA:

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS



ANEXO III

Ref.: Edital de Concorrência nº ____/____.

MUNICÍPIO:

OBRA:

I - RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - ORÇAMENTO



ANEXO IV

MODELO DE PLACA (CD)



(ANEXO V)
PLANILHA DE INSUMOS

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		CORONEL VIVIDA	SAM	38		
Projeto:		RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	LOTE	01		
Local da Obra:		PERIMETRO URBANO				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	UD	ORÇAMENTO APROVADO
			km	(ton)		QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/1	SEIL	Placa de Obra 2,00 x 1,00			un	1,00
2		TERRAPLENAGEM				
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm			un	58,00
400300	DER	Destocamento árvores diam. < 30cm			un	227,00
4		REVESTIMENTO				
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)			m2	34.160,41
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	410,00	0,0005	m2	68.320,82
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento			ton	1.708,03
170500	DER mat	CAP (Araucária)	410,00	0,0570		
transporte		Areia	250,00	0,1000		
transporte		Cal Hidratada CH-1	410,00	0,0150		
transporte		Brita (usina)		0,8280		
transporte		Massa	10,00	1,0000		
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - capa			ton	3.416,05
170500	DER mat	CAP (Araucária)	410,00	0,0570		
transporte		Areia	250,00	0,1000		
transporte		Cal Hidratada CH-1	410,00	0,0150		
transporte		Brita (usina)		0,8280		
transporte		Massa	10,00	1,0000		
5		MEIO-FIO E SARJETA				
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio			m	5.202,80
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	10,00	0,0982	m	1.488,78
6		PAISAGISMO / URBANISMO				
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)			m	12.832,54
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos			m2	7.610,49
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	20,00	1,5000	m3	380,52
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	19,00	0,1200	m2	6.457,17
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem	19,00	0,1200	m2	1.153,22



		colchão			
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas		m2	2.338,24
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2		un	128,00
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		m2	2.069,83
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE		m2	9,71
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m		ud	43,00
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO		ud	23,00
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO		ud	37,00
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas		un	47,00
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica		un	47,00
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso		un	47,00
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa		un	47,00
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	5,0000	gb	1,00



ANEXO VI
BDI (composição)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 3,50
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	6,15
ADMINISTR.	10,00
EVENTUAIS	5,00
LUCRO	6,00
BDI	29,959
BDI= 1,0615x1,10x1,05x1,06	
BDI arredond.	30%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2017 – PMCV

O Município de Coronel Vivida torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 24 de novembro do ano de 2017, na Praça Angelo Mezzomo nº s/n em Coronel Vivida, Paraná, Brasil, **CONCORRÊNCIA**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Perímetro Urbano	Recape em CBUQ	34.160,41 m²	330

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail ademir@coronelvivida.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (46) 3232-8300.

Coronel Vivida, 24 de outubro de 2017.

Ademir Antonio Aziliero, Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2017
PREÇO ELETRÔNICO Nº 40/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2017
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
(de 20/10/2017 a 19/10/2018)
CONTRATADA: PRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 08.058.798/0001-78
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o item como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, que faz parte do programa de qualificação da Atenção Básica - APSU, conforme resolução 23/2015, destinados a equipar as ambulâncias de Unidade Básica de Saúde e ambulâncias que transportam pacientes, de acordo com as especificações e especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 40/2017, que faz parte do presente instrumento, independentemente de transcrição e conforme especificações.

Item	Qtd	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor total
1	3	Kit Industrial com prensa em polietileno - com capa zipada - conteúdo: - 01 Prensa em Polietileno; - 01 Conjunto de Cintos com 3 Papeas; - 01 Capa para Kit Industrial; - 01 Jogo de Tala Amarrada EVA 4 papeas; - 01 Bandeira Triangular M; - 01 Jogo de Colar Cervical Resgate P/P/M; - 01 Manta Aluminizada; - 05 Compressas de Gaze Estéril 7,5cm x 7,5cm; - 03 Parede de Luvas Cirúrgicas Estéril; - 01 Soro Fisiológico (litro de sódio) 250 ml; - 02 Ataduras de Crepe 10cm; - 02 Ataduras de Crepe 15cm; - 02 Ataduras de Crepe 30cm; - 01 Espalhador 10m x 4,5cm; - 01 Curativo Antisséptico (Tipo Band-Aid); -	RESGATE SP/KIT CIIPA	1.049,38	3.148,14
2	6	Cilindro de oxigênio de 5 ou 7 litros. Material Cilindro: Alumínio; Pressão do serviço: 130bar; Altura: 412,8mm; Diâmetro: 111,1mm; Roca de rosca: 3/4" - 140 - 1/2" - 1/4" - 1/8" - 1/16" - 1/32" - 1/64" - 1/128" - 1/256" - 1/512" - 1/1024" - 1/2048" - 1/4096" - 1/8192" - 1/16384" - 1/32768" - 1/65536" - 1/131072" - 1/262144" - 1/524288" - 1/1048576" - 1/2097152" - 1/4194304" - 1/8388608" - 1/16777216" - 1/33554432" - 1/67108864" - 1/134217728" - 1/268435456" - 1/536870912" - 1/1073741824" - 1/2147483648" - 1/4294967296" - 1/8589934592" - 1/17179869184" - 1/34359738368" - 1/68719476736" - 1/137438953472" - 1/274877906944" - 1/549755813888" - 1/1099511627776" - 1/2199023255552" - 1/4398046511104" - 1/8796093022208" - 1/17592186044416" - 1/35184372088832" - 1/70368744177664" - 1/140737488355328" - 1/281474976710656" - 1/562949953421312" - 1/1125899906842624" - 1/2251799813685248" - 1/4503599627370496" - 1/9007199254740992" - 1/18014398509481984" - 1/36028797018963968" - 1/72057594037927936" - 1/144115188075855872" - 1/288230376151711744" - 1/576460752303423488" - 1/1152921504606846976" - 1/2305843009213693952" - 1/4611686018427387904" - 1/9223372036854775808" - 1/18446744073709551616" - 1/36893488147419103232" - 1/73786976294838206464" - 1/147573952593676412928" - 1/295147905187352825856" - 1/590295810374705651712" - 1/1180591620749411303424" - 1/2361183241498822606848" - 1/4722366482997645213696" - 1/9444732965995290427392" - 1/18889465931990580854784" - 1/37778931863981161709568" - 1/75557863727962323419136" - 1/15111572745592464683832" - 1/30223145491184929367664" - 1/60446290982369858735328" - 1/120892581964739717470656" - 1/241785163929479434941312" - 1/483570327858958869882624" - 1/967140655717917739765248" - 1/1934281311435835479530496" - 1/3868562622871670959060992" - 1/7737125245743341918121984" - 1/15474250491486683836243968" - 1/30948500982973367672487936" - 1/61897001965946735344975872" - 1/123794003931893470689951648" - 1/247588007863786941379903296" - 1/495176015727573882759806592" - 1/990352031455147765519613184" - 1/1980704062910295311039226368" - 1/3961408125820590622078452736" - 1/7922816251641181244156905472" - 1/15845632503282362488318110944" - 1/31691265006564724976636221888" - 1/63382530013129449953272443776" - 1/126765060026258899906548887552" - 1/253530120052517799813097775104" - 1/507060240105035599626195550208" - 1/1014120480210071199252391100416" - 1/2028240960420142398504782200832" - 1/4056481920840284797009564401664" - 1/8112963841680569594019128803328" - 1/16225927683361139180392517606656" - 1/32451855366722278360785035213312" - 1/64903710733444556721570070426624" - 1/129807421466889113443140140853248" - 1/259614842933778226886280281706496" - 1/519229685867556453772560563412992" - 1/1038459371735112907545121126825984" - 1/2076918743470225815090242253651968" - 1/4153837486940451630180484507303936" - 1/8307674973880903260360969014607872" - 1/16615349947761806520721938029215744" - 1/33230699895523613041443876058431488" - 1/66461399791047226082887752116862976" - 1/132922799582094452165775504233725952" - 1/265845599164188904331551008467451904" - 1/531691198328377808663102016934903808" - 1/106338239665675561732620403386987616" - 1/212676479331351123465240806773975232" - 1/425352958662702246930481613547950464" - 1/850705917325404493860963227095900928" - 1/1701411834650808987721926454191801856" - 1/3402823669301617975443852908383603712" - 1/6805647338603235950887705816767207424" - 1/13611294677206471901775411633454414848" - 1/27222589354412943803550823266908829792" - 1/54445178708825887607101646533817659584" - 1/108890357417651775214203293067635319168" - 1/217780714835303550428406586135270638336" - 1/435561429670607100856813172270541276672" - 1/871122859341214201713626344541082553344" - 1/1742245718682428403427252689082106688" - 1/3484491437364856806854505378164213376" - 1/6968982874729713613709010756328426752" - 1/13937965749459427227418021512656853504" - 1/27875931498918854454836043025313707008" - 1/55751862997837708909672086050627414112" - 1/1115037259956754178193441721012548282224" - 1/2230074519913508356386883442025096564448" - 1/4460149039827016712773766884050193128896" - 1/8920298079654033425547533768100386257792" - 1/17840596159308066851095067536200772515584" - 1/35681192318616133702190135072401545131168" - 1/71362384637232267404380270144803090262336" - 1/142724769274464534808760540289606180524672" - 1/285449538548929069617521080579212301049344" - 1/570899077097858139235042161158424602008888" - 1/1141798154195716274700844322316849204017776" - 1/2283596308391432549401688644633698408035552" - 1/4567192616782865098803377289267396816071104" - 1/9134385233565730197606754578534793632142208" - 1/18268770471131460395213509157069587264284512" - 1/36537540942262920790427018314139174528569024" - 1/7307508188452584158085403662827834905713856" - 1/14615016376905168316170807325655679811427712" - 1/29230032753810336632341614651311359824555424" - 1/58460065507620673264683229302622719649110464" - 1/116920131015241346529366458605245439298220928" - 1/23384026203048269305873291721049087859644176" - 1/46768052406096538611754583442098175199288352" - 1/93536104812193077223509166884196350398576704" - 1/187072209624386144447018333768392700797153984" - 1/374144419248772288894036667536785401594307872" - 1/748288838497544577788073335073570803188615744" - 1/149657767695508915557714667014714163723131488" - 1/299315535391017831115429334029428327446262976" - 1/598631070782035662230858668058856654892525952" - 1/1197262141564071324461717336117712918770511904" - 1/2394524283128142648923434672235451735541023808" - 1/4789048566256285297846869344470903471082047616" - 1/9578097132512570595693738688941806942164095328" - 1/19156194265025141191387477777883683884328190656" - 1/38312388530050282382774955555767367768656381312" - 1/76624777060100564765549911111534735537312762624" - 1/153249554120201129331099822223074671074625525248" - 1/306499108240402258662199644446149342149251051488" - 1/612998216480804517324399288892298684298502010304" - 1/1225996432961609034648798577784597368597004020608" - 1/245199286592321806929759715556919473719400804121216" - 1/490398573184643613859519531113838947438801608242432" - 1/9807971463692872277190390622276778948776032164848" - 1/19615942927385744554380781244535578997552064329696" - 1/3923188585477148910876156248907115995104012879392" - 1/7846377170954297821753312497814231990208051575984" - 1/15692754341908595643506624995628463980416031151968" - 1/31385508683817191287013249991256927960832062303936" - 1/62771017367634382574026499982513855921664124607872" - 1/125542034753268765148052999965027711843328249215744" - 1/251084069506537530296105999930055423686656494431488" - 1/502168139013075060592211999860110847373312988862976" - 1/100433627802615012118442399972022169474662597772592" - 1/200867255605230024236884799944044338949325195545184" - 1/401734511210460048473769599888088677898650391090368" - 1/803469022420920096947539199776177355797300782180736" - 1/1606938044841840193895078399552354711594601563761472" - 1/3213876089683680387790156799104709423189203127522944" - 1/6427752179367360775580313598209418846378406255045888" - 1/12855504358734721551160627196418376892756812500911776" - 1/25711008717469443102321254392836753785513625001823552" - 1/51422017434938886204642508785673507571027250036447104" - 1/102844034869877772409285017571347015142055000728894208" - 1/2056880697397555448185700351426940302841100014577792" - 1/4113761394795110896371400702853880605682200029155584" - 1/8227522789590221792742801405707761211364400058311168" - 1/1645504577918044358548562811415522422272880011662336" - 1/3291009155836088717097112522831044844545760023324672" - 1/6582018311672177434194225245662089689091520046649344" - 1/13164036623344354868388450491324179378183040093298688" - 1/26328073246688709736776900982648358756366080186597376" - 1/52656146493377419473553801965296717512732160373194752" - 1/10531229296675483894710760393059343022546320074638944" - 1/2106245859335096778942152078611868604509264014927888" - 1/42124917186701935578843041573237372090185280298557776" - 1/84249834373403871157686083146474744180370560597115552" - 1/16849966866800774231537216629294948836074112119421088" - 1/33699933733601548463074433258589896672148224238842176" - 1/67399867467203096926148866517179793344296444477684352" - 1/134799734934406193852297733034359586688592889555368704" - 1/269599469868812387704595466068719173377185779110737408" - 1/539198939737624775409190932137438346754371558221474816" - 1/10783978794752495488181818642748766935087431164429312" - 1/21567957589504990976363637285497533870174822328858624" - 1/43135915179009981952727274570995067740349644657717248" - 1/86271830358019963905454549141990134880699289315434496" - 1/172543660716039927810909098283980269761398578630868992" - 1/345087321432079855621818196567960539522797157261737936" - 1/690174642864159711243636393135921079045594314523467872" - 1/1380349285728319422487272786271822158091188629046935744" - 1/276069857145663884497454552454364431618237725809387168" - 1/55213971429132776899490910490872883233647545161877376" - 1/110427942858265553798981820981745764667291090323554752" - 1/220855885716531107597963641963491533334582180647111504" - 1/441711771433062215195927283926983066669164361282223008" - 1/883423542866124430391854567853966133338328722564444608" - 1/176684708573224886078370913570793226667665744528889216" - 1/35336941714644977215674182714158645333533148855777936" - 1/70673883429289954431348365428317290667066297711555872" - 1/141347766858579908862696728556634581334132595423111744" - 1/28269553371715981772539345711326916266826519084622368" - 1/56539106743431963545078691422653832533653038169244736" - 1/113078213486863927090157382845307665067306763338489472" - 1/226156426973727854180314765690615330134613526676978848" - 1/452312853947455708360629531381230660269227053353977792" - 1/904625707894911416721259062762461320538454106707955584" - 1/180925141578982283344251812552492264107690821340151168" - 1/36185028315796456668850362510498452821538164268030336" - 1/72370056631592913337700725020996905643076328536060672" - 1/144740113263185826675401500411993811286152577072121344" - 1/28948022652637165335080300082398762573230515414424288" - 1/57896045305274330670160600164797531446460302828848576" - 1/115792090610548661340321200329595062892920605657697152" - 1/23158418122109732268064240065919012578584121131539424" - 1/46316836244219464536128480131838025157168242262678464" - 1/92633672488438929072256960263676050314336484525356928" - 1/185267344976877858144513920527352100628672889050713856" - 1/370534689953755716289027841054704201257345778101427712" - 1/741069379907511432578055682109408402514689556202855424" - 1/14821387598150228651561113642188164050293791124057088" - 1/296427751963004573031222272843763281005878222481141472" - 1/59285550392600914606244454568752656201175644496228448" - 1/118571100785201829212488909137505312402351288992456896" - 1/23714220157040365842497781827501062480470257798491392" - 1/47428440314080731684995563655002124960940515596982784" - 1/9485688062816146336999112731000424992188103111937568" - 1/18971376125632292673998225462000849963762062223875136" - 1/379427522512645853479964509240016999275241244477504" - 1/758855045025291706959929018480033998550482488955008" - 1/1517710090050583413919858036960067997100964977910016" - 1/3035420180101166827839716739200135994201929955820032" - 1/6070840360202333655679433478400271988403859911640064" - 1/12141680720404667311359866956800543976807719823280128" - 1/24283361440809336226719733913601087953615439646560256" - 1/48566722881618672453439467827202175873230879293120512" - 1/97133445763237344906878935654404351754641758586241024" - 1/19426689146474689813775787130808703509288317173248048			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná



Quarta-Feira, 25 de Outubro de 2017

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano VI – Edição Nº 1469

Página 25/046

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ

Resolução nº 60/2017, de 18/10/2017

Ato do Gestor

Súmula: Dispõe sobre a Estimativa da Receita e Fixa a Despesa do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhaís do Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2018, e sobre o Plano de Ações Conjuntas de Interesse Comum – PLACIC do Consórcio.

O Conselho de Prefeitos do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhaís do Estado do Paraná, Aprovou e eu Frank Ariel Schiavini, Presidente do Consórcio, Sanciono a Seguinte Resolução.

Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para a elaboração do plano de aplicação do exercício 2018, as diretrizes gerais de que trata este Capítulo, com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Complementar nº 82/98, no que couber na Lei Federal nº 4.320 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101/00, nas portarias nº 42, 90, 163, 180, 211, 300, 325, 326, 327, 328, 339, 519, 589, 447, 448, 516, 517, e 248 e alterações posteriores, da Secretaria de Orçamento e Finanças do Tesouro Nacional, na Lei Federal nº 11.107 de 11 abril de 2005.

Art. 2º. O Plano de Aplicação Anual, que não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e fixação das despesas, face à Constituição Federal, à Lei Complementar nº 101/00, e Lei Federal 11.107/05, atenderá a um processo de planejamento permanente com a participação dos Municípios filiados.

Art. 3º. O plano de aplicação anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anuidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem à previsão da receita para o exercício, além do superávit financeiro do exercício de 2018.

Art. 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de Caixa.

Art. 5º. O Orçamento Geral do Consórcio Público Intermunicipal Para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhaís do Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, discriminado pelos anexos integrantes desta Resolução, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 2.484.000,00 (dois milhões, e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais).

Art. 6º. A receita será realizada mediante a arrecadação de contribuições dos Municípios filiados, vendas de serviços, aplicações financeiras, recursos de multas e juros e outras receitas diversas, bem como repasses de Convênios, na forma da legislação vigente, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS	
Receita Tributária	12.000,00
Receita Patrimonial	80.000,00
Transferências Correntes	2.135.000,00
Outras Receitas Correntes	26.000,00
Transferências de Capital	231.000,00
TOTAL DA RECEITA	2.484.000,00

Art. 7º. A despesa será realizada segundo as discriminações constantes no Anexo nº 2, da Lei nº 4.320/64, que integra esta resolução, de conformidade com o seguinte desdobramento:

DESPESAS	
Administração Geral	211.000,00
Administração de Infra-Estrutura	2.273.000,00
TOTAL DA RECEITA	2.484.000,00

Art. 8º. Nos termos dos Incisos I, II e III, Parágrafo 1º, Art. 7º art 43º, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 março de 1964, fica o Presidente do Consórcio autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o total das despesas autorizadas, inclusive das provenientes do Excesso de Arrecadação;

II – Abrir Créditos Suplementares Especiais até o limite do Excesso de Arrecadação por Alínea da receita;

III – Abrir Créditos Suplementares e Especiais até o limite indicado no cálculo global do provável Excesso de arrecadação.

IV – Abrir Créditos Suplementares e Especiais Até o limite do Superávit financeiro do exercício anterior.

V – Transpor, remanejar ou transferir recursos, independente de sua categoria de programação e seu projeto e/ou atividade sem previa autorização, nos termos do Inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, até o limite de 30% (trinta por cento);

Art. 9º. Fica o presidente autorizado a criar e suplementar fontes de recursos no orçamento geral do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhaís do Estado do Paraná, para atender as necessidades da mesma.

Art. 10º. Fica o presidente autorizado a proceder a alteração das fontes de recursos das receitas e despesas orçamentárias, de modo a se adequar às mudanças efetuadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 11º. Durante a execução orçamentária o Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhaís do Estado do Paraná, fica autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento das receitas nos termos do título VI, capítulo I, da Lei Federal nº 4.320/94, de 17 de março de 1964.

Art. 12º. Para atender o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 o presidente do Consórcio Público Sudoeste Pinhaís se incumbirá do seguinte:

a) Estabelecer programação orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 13º. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade de gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas.

Art. 14º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhaís do Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2017.

Frank Ariel Schiavini-PRESIDENTE

Registre-se e Publique-se

Ademir Antonio Aziliero-Contabilista – CRC 25.365

Cod251030

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2017 – PMC V

O Município de Coronel Vívda torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 24 de novembro do ano de 2017, na Praça Angelo Mezzomo nº s/n em Coronel Vívda, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Perímetro Urbano	Recapê em CBUQ	34.160,41 m²	330

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail ademir@coronelviva.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (46) 3232-8300.

Coronel Vívda, 24 de outubro de 2017.

Ademir Antonio Aziliero, Presidente da CPL

Cod250980

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA – NATAL DE LUZ 2017. LOCAL E HORÁRIO: Praça Angelo Mezzomo, s/n, às 09:00 horas do dia 09 de novembro de 2017. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 17.596,87. Prazo de execução: 60 (sessenta) dias. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívda, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelviva.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300. Coronel Vívda, 24 de outubro de 2017. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod251014

AUTORIZAÇÃO DE USO

O MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.995.455/0001-56, com sede na Praça Angelo Mezzomo, cidade de Coronel Vívda, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FRANK ARIEL SCHIAVINI, denominado AUTORIZANTE e ASSOCIAÇÃO EXPOVÍVDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.271.067/0001-40, com sede na Rua Brigadeiro Rocha Loures, em Coronel Vívda/PR., denominada AUTORIZADA neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Vilmar Rodrigues, CPF nº 546.512.049-53, celebram, pelo presente, um termo de AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, os quais respondem pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas através deste instrumento Considerando o pedido da Associação;

Considerando que o terreno está ocioso, não sendo utilizado para outras finalidades no momento;

Considerando o relevante interesse Público na medida, que irá proporcionar diversão, lazer e entretenimento para os Municípios, resolve permitir o uso de terreno público a Associação requerente.

Cláusula Primeira–Fica autorizado o uso da área, constante da matrícula imobiliária nº 16161 à Associação Expovívda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.271.067/0001-40, com sede na Rua Brigadeiro Rocha Loures na cidade de Coronel Vívda Paraná.

Cláusula Segunda–O bem público descrito acima deverá ser utilizado pela autorizada, única e exclusivamente, para realização de um rodeio entre os dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2017, sendo vedada sua utilização, a qualquer título, bem como a sua cessão ou transferência, para pessoa estranha a este Termo.

Cláusula Terceira–Fica vedada, a qualquer título, a utilização dos bens públicos ora cedidos, para fins diversos do estabelecido neste termo.

Cláusula Quarta–A autorizada terá a obrigação de manter limpos as dependências do local disponibilizado.

Cláusula Quinta – A responsabilidade sobre toda a realização e execução do evento e da autorizada, bem como fica responsável sobre todos os possíveis danos decorrentes da festividade.

Cláusula Sexta–Fica a presente autorização é outorgada para atividade específica citada acima, pelo prazo de trinta dias, sendo de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2017, período necessário para a preparação do evento bem como sua finalização.

Cláusula Sétima – O autorizante poderá revogar a presente autorização de uso, independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, em caso de

DIOEMS

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON

Observatório Nacional

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

3916983093

<http://dioems.com.br/>

Cascavel**MUNICÍPIO DE CASCAVEL****AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 366/2017**

Objeto: Aquisição de veículos leves, em atendimento as Unidades Saúde da Família da SESA. Abertura: 10/11/2017 às 09h00min. Critério de Julgamento: Menor Preço por item. Valor máximo: R\$ 197.038,85. O edital e informações poderão ser obtidos no Departamento de Compras - Tel: (45) 3321-2300. Site: cascavel.atende.net (licitações). Cascavel/PR, 24 de outubro de 2017. Edson Zorek, Diretor do Departamento de Compras.

102093/2017

MUNICÍPIO DE CASCAVEL**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2017**

Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de solução de software para data discovery e business discovery 100% in memory, contemplando o fornecimento de licenças perpétuas de software, serviços de implantação, suporte para o produto, atualização de versão, treinamento e suporte técnico no uso da ferramenta. Abertura: 10/11/2017 às 09h00min. Critério de julgamento: Menor Preço por item. Valor máximo: R\$ 254.994,67. O edital e informações poderão ser obtidos no Departamento de Compras - Tel: (45) 3321-2300. Site: cascavel.atende.net (licitações). Cascavel/PR, 23 de outubro de 2017. Edson Zorek, Diretor Depto de Compras.

102202/2017

MUNICÍPIO DE CASCAVEL**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 370/2017**

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de formação em língua espanhola para professores da rede municipal de ensino, com carga horária de 320 horas. Abertura: 10/11/2017 às 09h00min. Critério de julgamento: Menor Preço por item. Valor máximo: R\$ 63.088,00. O edital e informações poderão ser obtidos no Departamento de Compras - Tel: (45) 3321-2300. Site: cascavel.atende.net (licitações). Cascavel/PR, 23 de outubro de 2017. Edson Zorek, Diretor Depto de Compras.

102203/2017

MUNICÍPIO DE CASCAVEL**CONCORRÊNCIA n.º 13/2017 - Extrato do Comunicado I**

Objeto: Execução de 19.153,56m2 de recapeamento asfáltico no bairro Periolo. Encontra-se a disposição no site do município a íntegra do Comunicado I. Informações: alexandrab@cascavel.pr.gov.br ou no fone 0xx45 3321-2228. Cascavel/PR, 24 de outubro de 2017. Emerson Marcante, Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação.

102151/2017

Céu Azul**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR****AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 114/2017 - M.C.A.**

Objeto: Locação de decoração natalina (portal de entrada, kit arranjo de velas, kit arranjo árvore de natal, Noel iluminado, árvore de natal com 7,5 de altura e outros) e aquisição de um presépio para decoração do Natal 2017, que será realizado na Praça Luis Carlos Ruaro. Abertura dia 09/11/2017 às 09:00 horas. Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI localizadas nas seguintes Micro Regiões Geográficas do IBGE: 024 (Foz do Iguaçu) e/ou 023 (Cascavel) e/ou 022 (Toledo). O texto do Edital poderá ser obtido no site www.ceuazul.pr.gov.br ou no Paço Municipal de Céu Azul, Tel. 45-3266-1122, e-mail: pref.compras@netceu.com.br. Céu Azul/PR, 23/10/2017. Germano Bonamigo - Prefeito Municipal.

101943/2017

Colombo**Aviso de Licitação**

Edital - Concorrência Pública nº. 009/2017

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das seguintes vias públicas: Rua Odhonis Bighi e Rua Luiz Gulia do município de Colombo, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial descritivo e especificações contidas no edital.

Data: 27 de novembro de 2017 às 09:00 horas.

Local de Abertura: Sala de Licitações da Prefeitura.

Endereço: Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - PR.

Preço Mínimo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro, nº 105 - Centro - Colombo / Paraná ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br. Colombo, 24 de outubro de 2017.

Izabete Cristina Pavin

Prefeita Municipal

102315/2017

Aviso de Licitação

Edital - Pregão Presencial Nº. 109/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de uma Balança Rodoviária Eletrônica para Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Colombo - PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.

Data: 16 de novembro de 2017 às 09:00 horas.

Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br. Colombo, 24 de outubro de 2017.

Izabete Cristina Pavin

Prefeita Municipal

102268/2017

Aviso de Licitação

Edital - Pregão Presencial Nº. 107/2017

Objeto: Contratação de empresa através de Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços na execução de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais, sem o fornecimento de material (tubos e artefatos de concreto), para manutenção e melhorias em vias do Município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII) que integra o edital.

Data: 10 de novembro de 2017 às 09:00 horas.

Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor preço.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br. Colombo, 24 de outubro de 2017.

Izabete Cristina Pavin

Prefeita Municipal

102123/2017

Coronel Domingos Soares**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES-PR**

Extrato de Edital de Licitação - Pregão 107/2017 - Presencial

Objeto: fornecimento de carimbos. Propostas e habilitação: protocolo até as 12 horas do dia 07 de novembro de 2017 no setor de protocolo da municipalidade. Credenciamento de representantes e início da etapa de lances a partir das 14 horas do dia 07 de novembro de 2017 no Centro Administrativo Adão Reis. Edital e anexos no site <http://www.pmcds.pr.gov.br> ou direto na Av Araucária, 3120, setor de licitações. Não serão reconhecidos documentos enviados via e-mail. Anderson Matias - Pregoeiro.

101824/2017

Coronel Vivida**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
AVISO DE LICITAÇÃO****EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2017 - PMCV**

O Município de Coronel Vivida torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 24 de novembro do ano de 2017, na Praça Angelo Mezzomo nº s/n em Coronel Vivida, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Perímetro Urbano	Recape em CBUQ	34.160,41 m²	330

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail ademir@coronelvivida.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone (46) 3232-8300.

Coronel Vivida, 24 de outubro de 2017.

Ademir Antonio Azilero, Presidente da CPL

102114/2017



ARAUCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 127/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: FREDERICO REFEIÇÕES LTDA - ME.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 11774/2017, Contrato de Prestação de Serviços Nº 110/2013, Processo de Licitação 8302/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 540.037,80 (quinhentos e quarenta mil, trinta e sete reais e oitenta centavos), conforme justificativa constante no Processo Administrativo nº 11774/2017.

É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência 12 (doze) meses.

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo importam na quantia de R\$ 60.004,20 (sessenta mil, quatro reais e vinte centavos).

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária:

SMSA - 12.01.10.302.0005.2022.3.3.90.39 - Fonte 1.000 - Desdobramento 4100

SMSA - 12.01.10.302.0005.2022.3.3.90.39 - Fonte 1.303 - Desdobramento 4100

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de outubro de 2017.

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE

Secretário Municipal de Saúde



COLOMBO

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação

Edital - Pregão Presencial Nº. 107/2017

Objeto: Contratação de empresa através de Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços na execução de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais, sem o fornecimento de material (tubos e artefatos de concreto), para manutenção e melhorias em vias do Município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII) que integra o Edital.

Data: 10 de novembro de 2017 às 09:00 horas.

Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 24 de outubro de 2017.

Izabela Cristina Pavin

Prefeita Municipal



COLOMBO

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação

Edital - Pregão Presencial Nº. 109/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de uma Balança Rodoviária Eletrônica para Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Colombo - PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.

Data: 16 de novembro de 2017 às 09:00 horas.

Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 24 de outubro de 2017.

Izabela Cristina Pavin

Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2017 - INEXIBILIDADE Nº. 011/2017 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017.

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO para credenciamento de empresas de entidade Filantrópicas e/ou privados e/ou pessoas jurídicas, de Direito Privado, com ou sem finalidade, lucrativa, para Prestação de Serviços Médicos, em plantões de 12 horas, realizados nas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas, localizados nos balneários Praia de Leste e Shangri-lá, no Município de Pontal do Paraná/PR. O descritivo completo deste objeto consta no Termo de Referência - Anexo I. Período de divulgação: 24/10/2017 a 20/11/2017, no departamento de licitações situado a Rodovia PR 407, Km 19 - Balneário Praia de Leste - Pontal do Paraná.

Edital: Estará à disposição dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br, link licitação / licitações2017 / editais.

Pontal do Paraná, 23 de outubro de 2017.

Aurea Munhoz - Comissão Permanente de Licitação.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CERÂMICA TABORDA LTDA., torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Extração de Argila a ser implantada na localidade de Colônia Lima, Município de Mandrituba/PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2017 - PMCV

O Município de Coronel Vívda torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 24 de novembro do ano de 2017, na Praça Angelo Mezzomo nº s/n em Coronel Vívda, Paraná, Brasil, **CONCORRÊNCIA**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Perímetro Urbano	Recapte em CBUQ	34.160,41 m²	330

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail admir@coronelviva.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone (46) 3232-8300. Coronel Vívda, 24 de outubro de 2017.

Ademir Antonio Azilero, Presidente da CPL



AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 - COHAB-C

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA, sociedade de economia mista criada nos termos da Lei nº 2.345/65, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.495.696/0001-36, com sede nesta cidade de Curitiba - PR, na Rua Barão do Rio Branco nº 45, pelo que dispõe neste Edital e especificações anexas, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 24/11/2017 às 14h30min em sua sede, em sessão pública, estará procedendo ao recebimento das Propostas de Preços para a Licitação na modalidade "Concorrência", tipo maior oferta, para a alienação de 01 (hum) bem imóvel (terreno com benfeitorias), de propriedade da COHAB-C, localizada na Avenida Vicente Machado nº 1456, Bairro Batel, nesta Capital, sob indicação fiscal nº 23.006.020.000, sendo o terreno com área de 1.181,00m², conforme especificações constantes no Anexo 01 do Edital. O valor arrecadado com a alienação em apreço terá por escopo sustentar operacionalmente a política habitacional e a manutenção administrativa da Companhia. O valor mínimo de venda do imóvel corresponde a R\$ 3.830.000,00, com entrada mínima de 20% do valor ofertado e o saldo parcelado em até 12 (doze) meses. A documentação completa do Edital poderá ser examinada e adquirida até o dia 23/11/2017, por meio do site www.cohab.com.br, informações pelo telefone (41) 3221-8277, em horário comercial.

Curitiba, 20 de outubro de 2017.

João Lupion Neto - Presidente

AGRO POSTO PIONEIRO LTDA-ME, CNPJ 03.568.023/0001-85, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba a licença Ambiental de Operação LO 15000891com data de validade até 30/12/2015 para as atividades de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, situada à Av. Marechal Floriano Paixoto nº 8829, bairro Boqueirão, Curitiba, PR.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

1-º TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL-EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017-Processo Administrativo nº 20/2017. Pregão nº 05/2017. Partes: Câmara Municipal de Araucária, CNPJ nº 78.134.012/0001-04 e a Empresa Naturágua Distribuidora de Bebidas LTDA-ME, CNPJ nº 01.227.755/0001-96. Objeto: acréscimo ao valor total originário do item 02 de 25% (vinte e cinco por cento), referente ao aditamento de quantitativo para atendimento das necessidades da contratante. Valor Total do item: 1.937,50 (mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Valor Total Geral da Ata: 5.967,50 (cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

EXTRATO DA PORTARIA Nº 363/2017

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas Atribuições Legais e Regimentais, e conforme a Lei Municipal nº 1.803/2007, art. 41, inciso II e Processo Administrativo nº 177/2017, **RESOLVE**: I - Conceder Progressão Vertical por Habilitação ou Titulação ao(a) Servidor(a) Márcia Elisabete Dammski, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, do Quadro Próprio de Cargos de Provimento Efetivo da Câmara Municipal de Araucária, passando da Referência R7 Nível 4 para a Referência R7 Nível 6 da Tabela de Vencimentos C, a partir de 1º de novembro de 2017.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 368/2017

A COMISSÃO EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com a Lei Municipal nº 1.703/2006, artigo 36, **RESOLVE**: I - Exonerar a pedido o(a) Servidor(a) Igor Ville Lubian, portador(a) do RG nº 12.917.448-0 SSP/PR, lotado(a) no(a) Setor de Compras da Diretoria Administrativa, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, do Quadro Próprio de Cargos de Provimento Efetivo da Câmara Municipal de Araucária, a partir de 27 de outubro de 2017. II - A presente Portaria, ressalvado o disposto no inciso I, entra em vigor nesta data. Publique-se, Registre-se e, Cumpra-se. Araucária, 24 de outubro de 2017. Ben Hur Custodio de Oliveira- PRESIDENTE; Amanda Maria Brunatto Silva Nassar- 1ª SECRETÁRIA; Francisco Carlos Cabrin- 2ª SECRETÁRIA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA

LUIZ FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES

Oficial

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417, 6º andar, Centro - (41) 3610-1117 - CEP: 80410-180 - Curitiba - PR
E-mail: titular@1rcuritiba.com.br

EDITAL

Luiz Flávio Fidelis Gonçalves, Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Câmara da Capital

Faz saber aos que o presente edital vierem, que lhe foi apresentado pela Rimbarron Administradora de Consórcio Ltda. um requerimento firmado em 05 de setembro de 2017, solicitando a inscrição por Edital de LUIZ GUILHERME DE CASTRO (Idem. nº 3.448.286-1-PR e CPF/MF nº 550.309.639-87) e sua mulher MIRIAM CRISTINE BORTOLOTTI DE CASTRO (Idem. nº 3.685.908-3-PR e CPF/MF nº 586.863.359-00), para que as parcelas em anexo referentes ao instrumento particular de compra e venda garantido por alienação fiduciária, registrado no matrícula nº 3.262 do Registro Geral desta Serventia, referente ao imóvel situado na Rua Martins Afonso nº 378, Mercê, nesta cidade. Informo que as obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, posicionados em 22/09/2017 correspondem a R\$104.596,18 (cento e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezcentos centavos), sujeito à atualização monetária, juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação.

Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de Vossa(s) Senhoria(s), para que compareça(m), no prazo de 15 dias, contados a partir da data de terceira publicação deste edital, ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, situado na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 417, 6º andar, Centro, Curitiba-PR, de segunda a sexta-feira das 08:30 horas às 17:00 horas, onde deverá(o) efetuar o pagamento do débito acima discriminado.

Nesta oportunidade, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) ciente(s) de que o não comparecimento de referência obrigação no prazo mencionado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária EMBRAON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - nos termos da Lei 9.514/1997.

Curitiba, 22 de setembro de 2017.

LUIZ FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES

Oficial do Registro

OBSERVAÇÃO: SENHOR INTERESSADO ESTE EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03 TRÊS DIAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA CIDADE.

BEMPARANÁ

PUBLICIDADE LEGAL

3350.6620

WWW.BEMPARANA.COM.BR/PUBLICIDADE_LEGAL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017 **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2017**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, MEIO FIO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALCADAS EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DA OBRA, TOTALIZANDO 34.160,41 M²; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.

DATA DE ABERTURA: 24/11/2017 as 09h00min.

LOCAL: Sala de Licitação do Município de Coronel Vivida – Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Coronel Vivida – PR

VALOR TOTAL MÁXIMO: 3.071.211,99 (três milhões e setenta e um mil e duzentos e onze reais e noventa e nove centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 (trezentos e trinta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 660 (seiscentos e sessenta) dias.

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: Município de Coronel Vivida – Comissão Permanente de Licitação – Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Fone: (046) 3232-8300 ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br

Coronel Vivida, 24 de outubro de 2017.

Ademir Antonio Aziliero
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A. 27/10/17

Iana

De: Iana <iana@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de outubro de 2017 11:18
Para: HILTON-ACIVI (hiltonacivi@gmail.com)
Assunto: AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA
E LAVAGEM DA PISTA,
Anexos: 04. Edital - Mural CP nº 04-2017.doc



Att, Iana Schmid
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8304
iana@coronelvivida.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017 **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2017**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, MEIO FIO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALCADAS EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DA OBRA, TOTALIZANDO 34.160,41 M²; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.

DATA DE ABERTURA: 24/11/2017 as 09h00min.

LOCAL: Sala de Licitação do Município de Coronel Vivida – Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Coronel Vivida – PR

VALOR TOTAL MÁXIMO: 3.071.211,99 (três milhões e setenta e um mil e duzentos e onze reais e noventa e nove centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 (trezentos e trinta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 660 (seiscentos e sessenta) dias.

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: Município de Coronel Vivida – Comissão Permanente de Licitação – Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Fone: (046) 3232-8300 ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br


Coronel Vivida, 24 de outubro de 2017.

Ademir Antonio Aziliero
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Certifico que foi afixado no Saguão
desta Prefeitura de Coronel Vivida no
período de

24/10/17 a 24/11/17

FUNCIONÁRIO



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0013240-1

CNPJ

77.744.134/0001-41

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

11/09/1979

Data de Início de Atividade

01/11/1979

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RUA 13 DE MAIO, S/N, SAO MIGUEL, CHOPINZINHO, PR, 85.560-000

Objeto Social

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEDRA BRITADA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E CALÇADAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, PREPARAÇÃO DE TERRENOS, ATERROS; SERVIÇOS DE SANEAMENTO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SECAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE CONCRETO E ASFALTO USINADO; REALIZAÇÃO DE PESQUISA, LAVRA, ESTUDOS GEOLÓGICOS, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO.

Capital: R\$ 6.000.000,00
(SEIS MILHOES DE REAIS)

Capital Integralizado: R\$ 6.000.000,00
(SEIS MILHOES DE REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(Lei nº 123/2006)

Não

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ

Participação no capital (R\$)

Espécie de Sócio

Administrador

Término do Mandato

MOISES DE GASPERIN
518.634.809-00

5.940.000,00 SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

MARCELO SILVESTRI
025.056.959-03

60.000,00 SOCIO

XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 06/10/2014

Número: 20144246490

Ato: COMUNICACAO EXTRA-JUDICIAL

Evento (s): OUTROS

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
COM IMPEDIMENTO EXTRAJUDICIAL

Observações:

BLOQUEIO(S)

EXTRA-JUDICIAL: PROCEDER A AVERBAÇÃO NOS REGISTROS DA EMPRESA SUPRA DE QUE FORAM ARQUIVADAS A 12ª E 13ª ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, DATADAS DE 20/01/2012 E 26/12/2013, RESPECTIVAMENTE, SEM O ATO DE ASSENTIMENTO PRÉVIO DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL. OFÍCIO Nº 383/2014/DREI/SRS/SMPE EM 30/07/2014. DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI. PROTOCOLO: 14/424649-0 EM 26/08/2014.

CHOPINZINHO - PR, 01 de novembro de 2017

17/774581-9



Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL


90

19

7



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
21 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERRI - TABELIÃO



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



CARTA-CREDENCIAL

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Moisés de Gasperin, carteira de identidade nº 3.519.935-7 SSP/PR, na qualidade de responsável legal pela proponente PEDREIRA SANTIAGO LTDA, vem, pela presente, informar a V. S^{as} que o senhor Moisés de Gasperin, carteira de identidade nº 3.519.935-7, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MOISES DE GASPERIN

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3519935-7 SESP PR

CPF
518.634.809-00

DATA NASCIMENTO
19/12/1964

FILIAÇÃO
OSVALDO JOSE DE GASPERIN
ANNA EUFRAZIA DE GASPERIN

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
E

Nº REGISTRO
02454031068

VALIDADE
11/02/2020

1ª HABILITAÇÃO
20/07/1983

OBSERVAÇÕES

LOCAL
CHOPINZINHO, PR

DATA EMISSÃO
12/02/2015

ASSINATURA DO EMISSOR
80604128200
PR908719053

DETRAN, PR (PARANÁ)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1062654845

PROIBIDO PLASTIFICAR
1062654845

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24/11/17
7

9

7 19

10

2



Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	77744134000141
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Tipo de Sanção:	Todos ▼

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 24/11/2017 09:02:40

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca: ✓

CNPJ/CPF: 77744134000141

Nome, Razão Social ou Nome Fantasia: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Página 1/1

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

**TCEPR**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor	Tipo documento	CNPJ ▼	Número documento	77744134000141 ✓
	Nome			

Período publicação : de até Data de Início Impedimento: de até Data de Fim Impedimento: de até

NENHUM ITEM ENCONTRADO! ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

CONCORRÊNCIA 04/2017

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Handwritten signatures and marks: a large '98' at the top right, a stylized signature below it, a small '2' below that, and a larger signature at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 15

Data de emissão:	10/08/2017	Validade:	10/08/2018 ✓
------------------	------------	-----------	--------------

DADOS GERAIS:

RAZÃO SOCIAL:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA – COD: 706		
ENDEREÇO:	RUA 13 DE MAIO, – Bairro: SAO MIGUEL		
CIDADE:	CHOPINZINHO - PR, PAÍS: Brasil, CEP: 85560-000		
CNPJ:	77.744.134/0001-41	Inscr. Estadual:	Inscr. Municipal: 4545
RESPONSÁVEL:	MOISES DE GASPERIN		Identificação: 518.634.809-00

RAMO DE ATIVIDADE:

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEDRA BRITADA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E CALÇADAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, PRESTAÇÃO DE TERRENOS, ATÉRIOS; SERVIÇOS DE SANEAMENTO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SECAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE CONCRETO E ASFALTO USINADO; REALIZAÇÃO DE PESQUISA, LAVRA, ESTUDOS GEOLÓGICOS, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO.

DOCUMENTAÇÃO:


Descrição Do Documento	Numero do documento	Data Emissão	Data Validade
Alvará De Licença			
Certidão De Regularidade Do FGTS (CFRF)			
Certidão Negativa I.N.S.S			
Certidão Negativa Da União			
Certidão Negativa Estadual			
Certidão Negativa Municipal			
Certidão Simplificada – Junta Comercial			
Contrato Social E Alterações Ou Consolidada			
Prova De Inscrição No CNPJ			
Último Balanço Patrimonial Da Empresa			

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

CORONEL VIVIDA, 10 de agosto de 2017


Luana Marcolina Leonardi





TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
10 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERRI - TABELIÃO

Lei: 13.228 de 16/07/2001

Funarpe

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FMS44084



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



DECLARAÇÃO

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017 ✓


OBJETO: Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O signatário do presente, o senhor Moisés de Gasperin, representante legalmente constituído da proponente PEDREIRA SANTIAGO LTDA declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Atenciosamente,



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7



e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017 ✓

Eu, Moisés de Gasperin, RG 3.519.935-7, legalmente nomeado representante da proponente PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ 77.744.134/0001-41, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 04/2017, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da obra objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, Inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Atenciosamente,


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7










e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017

OBJETO: Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O signatário do presente, o senhor Moisés de Gasperin, representante legalmente constituído da proponente PEDREIRA SANTIAGO LTDA, declara sob as penas da Lei, que a mesma NÃO está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, não podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Atenciosamente,


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7





e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 77.744.134/0001-41 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 03/10/1979			
NOME EMPRESARIAL PEDREIRA SANTIAGO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEDREIRA SANTIAGO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 41.20-4-00 - Construção de edifícios 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 13 DE MAIO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO BARRACAO
CEP 85.560-000	BARRIO/DISTRITO SAO MIGUEL	MUNICÍPIO CHOPINZINHO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (46) 2421-002	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 77.744.134/0001-41 NIRE 41200132401



QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS:

- **MOISÉS DE GASPERIN**, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, CPF 518.634.809-00, portador da Cédula de Identidade nº 3.519.935-7, expedida pelo I.I. do Paraná, residente na Av. XV de Novembro, 877, Centro, em Chopinzinho- PR, CEP 85.560-000; e
- **MARCELO SILVESTRI**, brasileiro, casado sob o Regime Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CREA/PR nº 68498/D, CPF nº 025.056.959-03, portador da Cédula de Identidade nº 7.049.912-6, expedida pelo I.I. do Paraná, residente na Av. XV de Novembro, 4361, Edifício Avenida, Apto. 303, Centro, em Chopinzinho- PR, CEP 85.560-000.

Sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o Nome Empresarial de **"PEDREIRA SANTIAGO LTDA"**, tendo sua sede em Chopinzinho, Estado do Paraná, à Rua 13 de Maio, s/n, Bairro São Miguel, CEP 85.560-000, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº. 41200132401 por despacho em sessão de 11/09/1979, e Décima Segunda Alteração Contratual, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20120441993 por despacho em sessão de 23/01/2012, resolvem de comum acordo modificar o Contrato Social primitivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes, e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina esta forma societária.

1ª O Capital Social que era R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente integralizado, fica elevado por este instrumento para R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma.

O aumento de capital no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) procedido com o aproveitamento e incorporação parcial do saldo de Lucros Acumulados, contabilizados até 31/12/2012, demonstrado no Balanço Patrimonial transcrito no Livro Diário nº 19, será subscrito e integralizado neste ato pelos sócios da seguinte forma:

- **MOISÉS DE GASPERIN**, subscreve e integraliza R\$ 2.970.000,00 (dois milhões novecentos e setenta mil reais);
- **MARCELO SILVESTRI**, subscreve e integraliza R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2ª - O Capital Social da sociedade já totalmente integralizado no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Nº de Quotas	Valor (R\$)	Perc.
Moisés De Gasperin	59.400	5.940.000,00	99%
Marcelo Silvestri	600	60.000,00	1%
TOTAL	60.000	6.000.000,00	100%

[Handwritten signatures and initials]



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
41 NOV 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERRI - TABELIAO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 77.744.134/0001-41 NIRE 41200132401



3ª - Altera-se o objeto social que era: "Comercio de explosivos e materiais para detonação, britagem de pedras e detonação para britagem, mineração; terraplenagem e outras movimentações de terra, preparação de terrenos; transportes de cargas secas e a granel; obras viárias, serviços de engenharia, edificações e usinagem de concreto e asfalto, realização de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerais no território nacional", **por este instrumento passa a ser:** "CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEDRA BRITADA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E CALÇADAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, PREPARAÇÃO DE TERRENOS, ATERROS; SERVIÇOS DE SANEAMENTO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SECAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE CONCRETO E ASFALTO USINADO; REALIZAÇÃO DE PESQUISA, LAVRA, ESTUDOS GEOLÓGICOS, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO".

4ª - As quotas da sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios.

5ª - É vedado aos sócios caucionar ou dar suas quotas em garantia, seja a que título for.

6ª - Falecendo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades normalmente com os sócios remanescentes. A sociedade é fundada sobre o princípio do **AFFECTIO SOCIETATIS**, que deve estar presente obrigatoriamente em relação a todos os sócios, uma vez que é fundamental à sobrevivência da sociedade e de seu desiderato. Por essa razão não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de eventuais sucessores, seja a que título for, sem o expresse consentimento de todos os sócios remanescentes, a quem caberá, exclusivamente, a decisão de admitir na sociedade pessoas estranhas ao quadro societário.

§ 1º: Na presença de eventuais sucessores, que não obtiveram consentimento de admissão na sociedade, será levantado um Balanço Patrimonial na data desse evento, e com base nessas demonstrações, será apurado o quinhão respectivo que será reembolsado em 120 (cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, com acréscimos legais da TJLP, justificando-se esse prazo para não colocar em risco a sobrevivência da sociedade.

§ 2º: A sociedade não se dissolverá pela morte, incapacidade, retirada de sócio quotista, nem por sua exclusão. Também não haverá dissolução da sociedade mesmo que remanesça um único sócio continuando, nesta hipótese, com o sócio remanescente pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, como faculta o inciso IV do artigo 1.033 da lei 10.406/2002.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



TABELIONATO FERREI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
24 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERREIRA-FELIÃO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 77.744.134/0001-41

NIRE 41200132401



7ª - As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo em igualdade de preços e condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum sócio pretender ceder as que possuem.

8ª - Se qualquer dos sócios desejarem se retirar da sociedade, deverá comunicar sua intenção aos demais por escrito, especificando o preço da oferta e as condições de pagamento, e concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para manifestação.

9ª - Neste caso, se qualquer sócio desejar retirar-se da sociedade, é assegurado o direito personalíssimo e exclusivo de preferência ao sócio, que poderá exercê-lo pagando um valor nominal da quota que constar no contrato social vigente a época da retirada em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com acréscimos legais da TJLP, não estando sujeito, portanto, a igualar ofertas de terceiros.

10ª - Os sócios poderão deliberar em reunião de sócios, excluírem da sociedade, por justa causa, os sócios que estejam pondo em risco a continuidade da empresa, devendo ser apurados os respectivos haveres através de demonstrações contábeis da sociedade na data do evento. Nesta hipótese de exclusão de sócios, será levantado um Balanço Patrimonial na data da saída, e com base nestas demonstrações contábeis será apurado o quinhão do sócio, que será reembolsado em 120 (cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, com acréscimos legais da TJLP.

11ª - Altera-se os endereços dos sócios acima qualificados, que passam a ser:

- Moisés De Gasperin: Rua 14 de Dezembro, 4682, Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho, Estado do Paraná.
- Marcelo Silvestri: Rua Padre Anchieta, 4261, Apto 301, Edifício Gerânio, Centro, CEP 85560-000, Chopinzinho, Estado do Paraná.

À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento consolidar o Contrato Social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas no contrato primitivo e demais alterações que, adequado às disposições da referida Lei nº. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS:

- **MOISÉS DE GASPERIN**, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, CPF 518.634.809-00, portador da Cédula de Identidade nº 3.519.935-7, expedida pelo I.I. do Paraná, residente na Rua 14 de Dezembro, 4682, Centro, em Chopinzinho- PR, CEP 85.560-000; e



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
41 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERRI - TABELIÃO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 77.744.134/0001-41 NIRE 41200132401



- **MARCELO SILVESTRI**, brasileiro, casado sob o Regime Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CREA/PR nº 68498/D, CPF nº 025.056.959-03, portador da Cédula de Identidade nº 7.049.912-6, expedida pelo I.I. do Paraná, residente na Rua Padre Anchieta, 4261, Apto 301, Edifício Gerânio, Centro, em Chopinzinho- PR, CEP 85.560-000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de “**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**”.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na: Rua 13 de Maio, s/n, Bairro São Miguel, Chopinzinho, Estado do Paraná, CEP 85.560-000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá quando servir aos seus interesses, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social: Construção e Recuperação de Rodovias; Extração e Britamento de Pedra; Comércio Atacadista de Pedra Britada; Prestação de Serviço de Sinalização Rodoviária; Construção e Manutenção de Ruas e Calçadas; Prestação de Serviços de Terraplenagem, Movimentações de Terra, Preparação de Terrenos, Aterros; Serviços de Saneamento; Transporte Rodoviário de Cargas Secas Municipal, Intermunicipal e Interestadual; Serviços de Engenharia; Construção de Edifícios; Fabricação de Concreto e Asfalto Usinado; Realização de Pesquisa, Lavra, Estudos Geológicos, Exploração e Aproveitamento dos Recursos Minerais no Território Nacional; Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção.

Cláusula Quinta: O início das atividades ocorreu em 01 de novembro de 1979. Seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula Sexta: O Capital Social da sociedade já totalmente integralizado no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Nº de Quotas	Valor (R\$)	Perc.
Moisés De Gasperin	59.400	5.940.000,00	99%
Marcelo Silvestri	600	60.000,00	1%
TOTAL	60.000	6.000.000,00	100%

Cláusula Sétima: As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo em igualdade



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
41 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERRI - TABELIÃO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 77.744.134/0001-41 NIRE 41200132401



de preços e condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum sócio pretender ceder as que possuem.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: As quotas da sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios.

Cláusula Décima: É vedado aos sócios caucionar ou dar suas quotas em garantia, seja a que título for.

Cláusula Décima Primeira: Se qualquer dos sócios desejarem se retirar da sociedade, deverá comunicar sua intenção aos demais por escrito, especificando o preço da oferta e as condições de pagamento, e concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para manifestação.

Cláusula Décima Segunda: Neste caso, se qualquer sócio desejar retirar-se da sociedade, é assegurado o direito personalíssimo e exclusivo de preferência ao sócio, que poderá exercê-lo pagando um valor nominal da quota que constar no contrato social vigente a época da retirada em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com acréscimos legais da TJLP, não estando sujeito, portanto, a igualar ofertas de terceiros.

Cláusula Décima Terceira: Os sócios poderão deliberar em reunião de sócios, excluir da sociedade, por justa causa, os sócios que estejam pondo em risco a continuidade da empresa, devendo ser apurados os respectivos haveres através de demonstrações contábeis da sociedade na data do evento. Nesta hipótese de exclusão de sócios, será levantado um Balanço Patrimonial na data da saída, e com base nestas demonstrações contábeis será apurado o quinhão do sócio, que será reembolsado em 120 (cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, com acréscimos legais da TJLP.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

Cláusula Décima Quarta: A administração da sociedade será exercida pelo sócio MOISÉS DE GASPERIN, que isoladamente representara a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo constituir procuradores para atuar em nome da sociedade.

§1º: A remuneração dos sócios é mensal, a título de "pró labore", que será convencionado de comum acordo entre os sócios ou a maioria do Capital Social, e cujo montante será levado a débito da conta despesas gerais da sociedade.

§2º: É vedado, no entanto, o uso da Denominação Social em atividades estranhas ao interesse social, como avais, penhores e fianças, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, tornando-se nulo o ato em sua decorrência.



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZIMHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
41 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERREIRA TABELIÃO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 77.744.134/0001-41 NIRE 41200132401



DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima Quinta: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, por ocasião do encerramento, será levantado o inventário e o balanço geral, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Na eventualidade de vir a ser constatado prejuízo, o mesmo será contabilizado em conta especial, a débito do Patrimônio Líquido para amortização em exercícios futuros.

DO AFFECTIO SOCIETATIS

Cláusula Décima Sexta: Falecendo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades normalmente com os sócios remanescentes. A sociedade é fundada sobre o princípio do **AFFECTIO SOCIETATIS**, que deve estar presente obrigatoriamente em relação a todos os sócios, uma vez que é fundamental à sobrevivência da sociedade e de seu desiderato. Por essa razão não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de eventuais sucessores, seja a que título for, sem o expresso consentimento de todos os sócios remanescentes, a quem caberá, exclusivamente, a decisão de admitir na sociedade pessoas estranhas ao quadro societário.

§ 1º: Na presença de eventuais sucessores, que não obtiveram consentimento de admissão na sociedade, será levantado um Balanço Patrimonial na data desse evento, e com base nessas demonstrações, será apurado o quinhão respectivo que será reembolsado em 120 (cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, com acréscimos legais da TJLP, justificando-se esse prazo para não colocar em risco a sobrevivência da sociedade.

§ 2º: A sociedade não se dissolverá pela morte, incapacidade, retirada de sócio quotista, nem por sua exclusão. Também não haverá dissolução da sociedade mesmo que remanesça um único sócio continuando, nesta hipótese, com o sócio remanescente pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, como faculta o inciso IV do artigo 1.033 da lei 10.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Sétima: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Cláusula Décima Oitava: Os sócios declaram que, 51% (cinquenta e um por cento) do capital pertencerão sempre a brasileiros; o quadro de pessoal será sempre constituído de pelo menos 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros; e a administração ou gerência caberá sempre a maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
6 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS RO. FERRI - TABELIAO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 77.744.134/0001-41 NIRE 41200132401




7/7


DO FORO

Cláusula Décima Nona: Fica eleito o foro e Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


Lavrado em três vias de igual teor e forma, assinado pelos sócios, na presença de duas testemunhas.

Chopinzinho PR, 26 de Dezembro de 2013.


MOISÉS DE GASPERIN


MARCELO SILVESTRI

Testemunhas:


Cristiane Balansin
RG 10.251.623-0 SSP/PR


Elcinthia L. Fávero
RG 4.122.321-9 SSP/PR





TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
41 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGÉRIO FERRI - TABELIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CNPJ: 77.744.134/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 16:28:07 do dia 12/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2018.

Código de controle da certidão: **472A.21A5.FCC1.994F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7
CO
10
n

g

Certidão Negativa ✓
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017146967-93

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **77.744.134/0001-41** ✓
Nome: **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/03/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br





Município de Chopinzinho - Paraná

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome.....: PEDREIRA SANTIAGO LTDA ✓
CPF/CNPJ.....: 77.744.134/0001-41 ✓
Endereço.....: RUA 13 DE MAIO
Bairro.....: SAO MIGUEL
Cidade.....: CHOPINZINHO

Número Cad...: 4545
RG/Inscr.....:
Número.....: 0
UF.....: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos
OBS:

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que em nome do Contribuinte, NÃO CONSTA DÉBITOS, referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do Contribuinte acima, que vierem ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>>.

Certidão emitida conforme Artigo 349 da Lei Municipal Nº 050/2009 de 18/12/2009.

Emitida em 21/11/2017. ✓
Válida até 60 dias após a data de emissão desta. ✓
Código/Ano da certidão.....: 4065/2017
Código de autenticidade da certidão: 182135176182135

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 21/11/2017.

7 CD 16

g

u

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77744134/0001-41 ✓
Razão Social: PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Nome Fantasia: PEDREIRA SANTIAGO
Endereço: RUA 13 DE MAIO S/N BARRACAO / SAO MIGUEL / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/11/2017 a 06/12/2017 ✓

Certificação Número: 2017110701284660953740

Informação obtida em 21/11/2017, às 11:19:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDREIRA SANTIAGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Certidão nº: 136454237/2017

Expedição: 04/09/2017, às 08:30:02

Validade: 02/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDREIRA SANTIAGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **77.744.134/0001-41**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 149804/2017

Validade: 31/03/2018 ✓

Razão Social: PEDREIRA SANTIAGO LTDA ✓

CNPJ: 77744134000141 ✓

Num. Registro: 38533

Registrada desde : 12/09/2001

Capital Social: R\$ 6.000.000,00

Endereço: RUA 13 DE MAIO, S/N PROLONGAMENTO SÃO MIGUEL

Município/Estado: CHOPINZINHO-PR

CEP: 85560000

Objetivo Social:

Construção e recuperação de rodovias; Extração e britamento de pedra; Comércio Atacadista de pedra britada; Prestação de serviço de sinalização rodoviária; Construção e manutenção de ruas e calçadas; Prestação de serviços de terraplenagem, movimentações de terra, preparação de terrenos, aterros; Serviços de saneamentos; Transporte rodoviário de cargas secas municipal, intermunicipal e interestadual; Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Fabricação de concreto e asfalto usinado; Realização de pesquisa, lavra, estudos geológicos, exploração e aproveitamento dos recursos minerais no território nacional; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil e Geologia.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ELIZANGELA PEREIRA VILELA

Carteira: PR-63346/D Data de Expedição: 26/03/2001

Desde: 12/09/2001 Até: 27/03/2002

Desde: 26/04/2002 Carga Horária: 0:30 H/D

Título: GEÓLOGA Situação: Regular

LEI 4076 - ARTIGO 06 São da competência do geólogo ou engenheiro geólogo: a) trabalhos topográficos e geodésicos; b) levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos; c) estudos relativos às ciências da terra; d) trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; e) ensino das ciências geológicas nos estabelecimentos de ensino secundário e superior; f) assuntos legais relacionados com suas especialidades; g) perícias e arbitramentos referentes às matérias das alíneas anteriores. Parágrafo único - É também da competência do geólogo ou engenheiro-geólogo o disposto no item IX, artigo 16, do Decreto-Lei nº 1.985, de 29 JAN 1940 (Código de Minas).(*) (*) IX - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da autorização, e sem prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo D.N.P.M. no curso deles, o concessionário apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado ao exercício de Engenharia de Minas com dados informativos que habilitem o Governo a formar juízo seguro sobre a reserva mineral da

jazida, qualidade do minério e possibilidade de lavra. Nomeadamente: a) situação, vias de acesso e comunicação; b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as exposições naturais de minério e as que forem descobertas pela pesquisa; c) perfis geológicos-estruturais; d) descrições detalhada da jazida; e) quadro demonstrativo de quantidade e da qualidade do minério; f) resultado dos ensaios de beneficiamento; g) demonstração da possibilidade de lavra; h) estudo analítico das águas, do ponto de vista de suas qualidades químicas, físicas e físico químicas, além das exigências supra-referidas que lhes forem aplicáveis.

Observações: Possui atribuições para Utilização de Explosivos e Desmonte de Rochas conforme DN 071/2001 do CONFEA. Possui atribuições para ensaios de beneficiamento e para demonstração de possibilidade de lavra conforme o parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 4.076 de 23 de junho de 1962.

2 - MARCELO SILVESTRI

Carteira: PR-68498/D Data de Expedição: 13/09/2002

Desde: 29/09/2005 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 413684/2017, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/11/2017 11:20:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **149805/2017**

Validade: 31/03/2018 ✓

Nome Civil: **MARCELO SILVESTRI** ✓

Carteira - CREA-PR Nº :PR-68498/D

Registro Nacional : 1703011546

Registrado(a) desde : 13/09/2002

Filiação : IZONIR CARLOS SILVESTRI

SANTINA DE MATTOS SILVESTRI

Data de Nascimento : 11/12/1979

Carteira de Identidade : 70499126

Naturalidade : SAO JOAO/PR

CPF : 02505695903

Título: **ENGENHEIRO CIVIL** ✓

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU-SC

Data da Colação de Grau : 17/08/2002

Diplomação : 17/08/2002

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.


Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 413695/2017.

Emitida via Internet em 21/11/2017 11:20:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017

O signatário da presente, o senhor Moisés de Gasperin, representante legalmente constituído da proponente PEDREIRA SANTIAGO LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do(s) objeto(s) da Concorrência supramencionada.

Atenciosamente,



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



MODELO Nº 03

ATESTADO DE VISITA ✓

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017 ✓

Declaramos que o Responsável Técnico **Marcelo Silvestri**, Crea, **PR-68.498/D** da Proponente, **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**, CNPJ nº 77.744.134/0001-41, ✓ localizado a Rua 13 de maio, s/n, prolongamento, São Miguel, Chopinzinho, Paraná, devidamente credenciado, visitou o local da Execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Coronel Vivida, 26 de Outubro de 2017. ✓

Douglas Cristian Strapazon
Engenharia/Divisão de Estudos e Projetos
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida - PR
Fone: (46)3232-8349

Marcelo Silvestri
Crea: PR-68.498/D

7

9

CG 97

2



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico ✓

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
MARCELO SILVESTRI ✓

Carteira Profissional: PR-68498/D
Acervo Técnico Nº.: **10407/2009**

RNP Nº: 1703011546
Protocolo Nº.: **2009/00215388**





Observação.....:

3

7

LG 46

~





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

MARCELO SILVESTRI

Carteira Profissional: PR-68498/D

Acervo Técnico Nº.: 10407/2009

RNP Nº.: 1703011546

Protocolo Nº.: 2009/00215388

ART Nº.: 20093424894 0..... Registrada: 24/09/2009.....
ART Co-Respons.: ART Vinculada: 20092586416 0
Empresa Executora.: PEDREIRA SANTIAGO LTDA.....
Contratante(s).....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO.....
Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....
Atividade Técnica.....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.....: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
Tipo de Obra/Serviço.....: ARRUAMENTO.....
Serviço Contratado.....: EXECUÇÃO.....
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
Dimensão.....: 2.525,00 TON..... Área Existente: 0,00 TON
Área Ampliada.....: 0,00 TON Área de Reforma: 0,00 TON
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.....: ESTRADA LIG. CHOPINZINHO - COM. BUGRE, NAO N. SRA.
APAREC. E BUGRE L. NAO Q. NAO.....
Município/Estado.....: CHOPINZINHO/PR.....
Data de Início.....: 25/08/2009..... Data de Conclusão: 17/09/2009.....
Docto de Conclusão.....: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: ADITAMENTO DE CONTRATO PARA OS MESMOS SERVIÇOS DA ART
PRINCIPAL, PASSANDO A OBRA A TER AS SEGUINTE
QUANTIDADES TOTAIS: USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO
DE 12.625,00 TONELADAS DE CBUQ. ESTRADA DE LIGAÇÃO
CHOPINZINHO A COMUNIDADE DO BRUGRE COM EXTENSAO DE 13
KM. PRINCIPAIS SERVIÇOS: CORREÇÃO DA PISTA COM
COMPACTAÇÃO COM ROLO PESADO, LIMPEZA E LAVAGEM DA
PISTA; PINTURAS DE IMPRIMAÇÃO E LIGAÇÃO; REMOÇÃO DE
PAVIMENTO POLIÉDRICO E APLICAÇÃO DE 5.000 M³ DE BRITA
GRADUADA PARA FORMAÇÃO DE BASE P' / PAVIM. ASFÁLTICA;
APLICAÇÃO DE REPERFILAGEM EM CBUQ (3 CM) SOBRE
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E BRITA GRADUADA; APLICAÇÃO
DE CAPA DE ROLAMENTO (3 CM) SOBRE REPERFILAGEM DE
CBUQ COM VIBRO-ACABADORA.....
Observação.....:

[Handwritten signature and initials]

TABELIONATO FERRI

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

U 1 NOV, 2017

O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL

MARCOS ROGÉRIO FERRI - TABELIÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
MARCELO SILVESTRI

Carteira Profissional: PR-68498/D
Acervo Técnico Nº.: **10407/2009**

RNP Nº.: 1703011546
Protocolo Nº.: **2009/00215388**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2009/00215388.

Emitida via Internet em 25/09/2009 08:39:29 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures and initials]





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 e 3242-1331 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



DECLARAÇÃO

O Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n. 76.995.414/0001-60, com sede na Rua Santos Dumont, 3883, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Vanderlei José Crestani, abaixo assinado, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e a pedido de parte interessada, DECLARA, a quem interessar possa, que a empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 77.744.134/0001-41, CREA PR n. 38.533/F, situada na Rua 13 de maio, s/n, município de Chopinzinho, estado do Paraná, foi a responsável pela EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CHOPINZINHO ATÉ A COMUNIDADE DO BUGRE COM EXTENSÃO DE 13,00 KM, tendo como principais características e quantidades o que segue:

- ☐ Usinagem, Transporte e Aplicação de 12.625,00 (doze mil e seiscentos e vinte e cinco) toneladas de C.B.U.Q;
- ☐ Correção da pista com compactação com rolo pesado, limpeza e lavagem da pista = 78.000,00 metros quadrados;
- ☐ Pinturas de imprimação e ligação = 78.000,00 metros quadrados cada pintura;
- ☐ Remoção de pavimento poliédrico e aplicação de 5.000,00 m³ de brita graduada para formação de base para pavimentação;
- ☐ Aplicação de camada de reperfilagem em CBUQ (3,00 cm de espessura média) sobre pavimentação poliédrica e brita graduada;
- ☐ Aplicação de capa de rolamento em CBUQ (3,00 cm de espessura média) sobre camada de reperfilagem, aplicado com vibroacabadora.

Edital de Licitação número 29/2009 e Contrato número 159/2009.

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 01 de 02 páginas

TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
01 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGENO FERRI - TABELIÃO



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-1122 e 3242-1331

Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO



As obras descritas foram realizadas na estrada de ligação entre a cidade de Chopinzinho e a Comunidade do Bugre, neste mesmo município, tendo como Responsável Técnico pela empresa executora o Engenheiro Civil Marcelo Silvestri, CREA PR 068.498/D.

Data de início dos serviços: 20/07/2009

Data de término dos serviços: 17/09/2009

ART de execução:

Principal: 20092586416

Vinculada: 200914884

Como expressão da verdade, firmamos o presente.



Chopinzinho, 17 de setembro de 2009

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
VANDERLEI JOSÉ CRESTANI – CPF N. 530.439.959-53
Prefeito Municipal



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Paraná

004783





TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
01 NOV. 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGÉRIO FERRI - TABELIÃO



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.




DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ✓

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017 ✓

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317 de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	DATA REGISTRO	ASSINATURA
01	Marcelo Silvestri	Eng. Civil	68.498/D	13/09/2002	

Declaramos outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Atenciosamente,



PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7



e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná

PEDREIRA SANTIAGO LTDA. EPP

CNPJ: 77.744.134/0001-41

NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

OSVALDO JOSÉ DE GASPERIN, brasileiro, casado sob o Regime Comunhão Universal de Bens, empresário, CPF 340.704.869-68, portador da Cédula de Identidade nº 1.922.256, expedida pelo I.I. do Paraná, residente na Av. Getulio Vargas, 3661, Bairro Frei Vito, em Chopinzinho – PR, CEP 85560-000;

MOISÉS DE GASPERIN, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 19/12/1964, empresário, CPF 518.634.809-00, portador da Cédula de Identidade nº 3.519.935-7, expedida pelo I.I. do Paraná, residente na Av. Getulio Vargas, 3661, Bairro Frei Vito, em Chopinzinho – PR, CEP 85560-000; resolvem por este instrumento, de comum acordo, alterar seu contrato social da empresa que gira sob o nome de “**PEDREIRA SANTIAGO LTDA. EPP**”, situada na Rua 13 de Maio, s/nº, em Chopinzinho, Estado do Paraná, CEP 85.560-000, com contrato devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41200132401 por despacho em sessão em 11/09/1979, e alterações sob o nº 259.151 em 26/05/1981, 281.903 em 06/10/1982, 306.389 em 13/04/1984, 488.351 em 27/05/1991, 983149941 em 09/12/1998, 20011474815 em 20/06/2001, 20020794169 em 18/04/2002, e 20050314920 em 24/01/2005, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade, representada por todos os sócios, declara, para os devidos fins do art. 9º da Lei nº 9.841/99, que se reenquadra na situação de empresa, em virtude de não mais haver interesse em permanecer no regime da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL: O objeto social que era: COMÉRCIO DE EXPLOSIVOS E MATERIAIS PARA DETONAÇÃO, BRITAGEM DE PEDRAS, DETONAÇÃO PARA BRITAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA TERRAPLENAGEM, passa a ser:

- COMÉRCIO DE EXPLOSIVOS E MATERIAIS PARA DETONAÇÃO, BRITAGEM DE PEDRAS E DETONAÇÃO PARA BRITAGEM, MINERAÇÃO;
- TERRAPLENAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, PREPARAÇÃO DE TERRENOS;
- TRANSPORTES DE CARGAS SECAS E A GRANEL;
- OBRAS VIÁRIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EDIFICAÇÕES E USINAGEM DE CONCRETO E ASFALTO.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CAPITAL SOCIAL

O Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, é elevado para R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais), divididos em 10.000 (Dez mil) quotas de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada, que é inteiramente subscrito e integralizado na forma prevista neste ato:

- a) **OSVALDO JOSÉ DE GASPERIN**, que possuía R\$ 133.340,00 (Cento e trinta e três Mil, trezentos e quarenta Reais) subscreve mais R\$ 533.360,00 (Quinhentos e trinta e três mil trezentos e sessenta Reais) que integraliza neste ato, com a sua participação nas contas de Lucros Acumulados;
- b) **MOISÉS DE GASPERIN**, que possuía R\$ 66.660,00 (Sessenta e seis mil seiscentos e sessenta Reais) subscreve mais R\$ 266.640,00 (Duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e quarenta Reais) que integraliza neste ato, com a sua participação nas contas de Lucros Acumulados;



**JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ**



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'J' and '7 CG'.

TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
01 NOV, 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERREI - TABELIAO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA. EPP

CNPJ: 77.744.134/0001-41

NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



**UNTA COMERCIAL
DO PARANÁ**



CLÁUSULA QUARTA: INGRESSA na sociedade **MARCELO SILVESTRI**, brasileiro, casado sob o Regime Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CREA/RR nº 68498/D, CPF nº 025.056.959-03, portador da Cédula de Identidade nº 7.049.912-6 expedida pelo I.I. do Paraná, residente na Av. XV de Novembro, 4361, Edifício Avenida, Apto. 303, Centro, em Chopinzinho – PR, CEP 85560-000, do que declara conhecer a situação econômica financeira da sociedade, ficando desta forma subrogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: O sócio **MOISÉS DE GASPERIN** que é possuidor de 3.333 (três mil trezentas e trinta e três) quotas de R\$ 100,00 (Cem reais) cada, no valor de R\$ 333.333,00 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais), vende e transfere 100 (cem) quotas de R\$ 100,00 (cem reais) cada, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) juntamente com a sua participação nas contas de RESEVA DE CAPITAL e demais direitos ao sócio ingressante **MARCELO SILVESTRI**, do que recebe neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEXTA: O CAPITAL SOCIAL já totalmente integralizado no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais), divididos em 10.000 (Dez mil) quotas de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
OSVALDO JOSÉ DE GASPERIN	6.667	666.700,00
MOISÉS DE GASPERIN	3.233	323.300,00
MARCELO SILVESTRI	100	10.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	10.000	1.000.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: Caberá ao sócio **MARCELO SILVESTRI**, Engenheiro Civil, a responsabilidade técnica da empresa, nas atividades pertinentes à Engenharia Civil.

CLÁUSULA OITAVA: A carga horária a ser cumprida pelo responsável técnico será de 04 (quatro) horas diárias, não sendo vinculados os horários de início e término da jornada diária.

CLÁUSULA NONA: Fica estipulado que para desempenho das atividades técnicas o sócio **MARCELO SILVESTRI**, receberá o valor mensal de R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos Reais), equivalentes a 06 (seis) salários mínimos nesta data, sendo o valor corrigido de acordo com a variação do salário mínimo.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADMINISTRAÇÃO: Permanece na administração da sociedade os sócios **OSVALDO JOSÉ DE GASPERIN** e **MOISÉS DE GASPERIN**, que em conjunto ou separadamente representarão a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo constituir procuradores para atuar em nome da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS: Os sócios declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

[Handwritten signatures and initials]

TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
U 1 NOV, 2017
O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROGÉRIO FERRI - TABELIÃO

PEDREIRA SANTIAGO LTDA. EPP

CNPJ: 77.744.134/0001-41

NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL




JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORO: Fica eleito o foro e comarca de Chopinzinho, PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Continuam em vigor as demais cláusulas de Contrato Social, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Chopinzinho, 15 de setembro de 2005.



OSVALDO JOSÉ DE GASPERIN



MOISES DE GASPERIN


MARCELO SILVESTRI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE PATO BRANCO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 23/09/2005
SOB NÚMERO: 20053530217
Protocolo: 05/353021-7
Empresa: 41 2 0013240 1
PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP
0141051
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

TESTEMUNHAS:


Jefferson Diaz Gois
RG 5.331.810-0 II/PR


Neuza Aparecida Verdi
RG 6.341.779-3 II/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE PATO BRANCO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 23/09/2005
SOB NÚMERO: 20053530225
Protocolo: 05/353022-5
Empresa: 41 2 0013240 1
PEDREIRA SANTIAGO LTDA EPP
0141055
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
01 NOV 2017
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO ORIGINAL
MARCOS ROGERIO FERRI - TABELIAO



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 04/2017

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	ANO	MARCA/MODELO	placa
01	01	Usina de Asfáltos	2009	TEREX MAG.80	
02	01	Vibroacabadoura	2010	CIBER AF 4000	
03	01	Rolo Pneumático	2015	CAT CW34	
04	01	Rolo Chapa Chapa	2014	CAT - CB44	
05	01	Rolo Chapa	2015	CAT - CS54	
06	01	Rolo chapa/pneu	2014	HANN - HD75	
07	01	Espargidor de asfáltos	2010	SR-ROMANELI	ASQ 1070
08	01	Caminhão Betoneira	2014	M.Benz - ATRON 2729	AYL 4125
09	01	Caminhão Basculante	2009	M.Benz - AXOR 2831	AQI 1368
10	01	Caminhão Basculante	2009	M.Benz - AXOR 2831	API 4955
11	01	Caminhão Basculante	2010	M.Benz - 2428	ALX 8300
12	01	Caminhão Basculante	2012	M.Benz - AXOR 2831	ALX 8388
13	01	Caminhão Basculante	2011	M.Benz - 2428	ALX 8333
14	01	Caminhão Basculante	2012	M.Benz - 1725	ALX 8666
15	01	Placa vibratória	2010	CAT	
16	01	Retroescavadeira	2012	CAT 416 E	
17	01	Minicarregadeira	2016	CAT 246D	
18	01	Vassoura Mecânica	2010	CAT	
19	01	Motoniveladora	2013	CAT 120K	
20	01	Caminhão Pipa	2005	M.Benz	
21	01	Veículo para assist.	2015	KIA BONGO	ATQ 5982
22	01	Extrusora p/meio fio	2005		
23	01	Fresadora de Asfáltos	2011	CAT PM 102	
24	01	Caminhão Comboio	2013	M.Benz accelo 1016	AXJ 6531
25	01	Caminhão Munk	2013	VOLVO VM330	AWW-7145

Declaramos que se nossa empresa for declarada vencedora do certame em epígrafe, disporomos das máquinas e equipamentos acima relacionados.

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Marcelo Silvestri – Resp. Técnico
CREA PR 68.498/D

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REF: CONCORRÊNCIA 04/2017


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (EM DIAS)										
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1	USINA DE ASFÁLTO	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	VIBROACABADOURA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	ROLO COMPACTADOR LISO	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Rolo Chapa Liso	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ROLO CHAPA / PNEU	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	CAMINHÃO ESPARGIDOR	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	CAMINHÃO BETONEIRA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	PLACA VIBRATÓRIA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	MINICARREGADEIRA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	VASSOURA MECÂNICA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	MOTONIVLADORA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	CAMINHÃO PIPA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	VEÍCULO PARA ASSISTENCIA	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	FRESADORA DE ASFÁLTOS	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	CAMINHÃO COMBOIO	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	CAMINHÃO MUNCK	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin - Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Marcelo Silvestri - Resp. Técnico
CREA PR 68.498/D

PEDREIRA SANTIAGO LTDA.
Prestação de Serviços, Briagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



e-mail: pedreirasantiagoolda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com
Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



CAPACIDADE FINANCEIRA

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.


SÃO AS DEMONSTRAÇÕES :

Índice de Liquidez geral (ILG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = \frac{(14.959.833,23 + 143.670,80)}{(1.649.866,80 + 0,00)}$	9,15 ✓
Índice de Liquidez corrente (ILC) $LC = AC / PC$	$LC = \frac{(14.959.833,23)}{(1.649.866,80)}$	9,07 ✓
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$SG = \frac{(14.959.833,23 + 6.147.128,57 + 143.670,80)}{(1.649.866,80 + 0,00)}$	9,16 ✓

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.


Moisés de Gasperin
Representante legal
RG: 3.519.935-7


Paulo Roberto Machado
Contador
CRC PR 043687/O-9



e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PEDREIRA SANTIAGO LTDA ✓
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 77.744.134/0001-41 ✓
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 ✓

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PEDREIRA SANTIAGO LTDA

NIRE 41200132401

CNPJ 77.744.134/0001-41

Número de Ordem 24

Natureza do Livro DIARIO

Município Chopinzinho

Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/09/1979

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2016

Quantidade total de linhas do arquivo digital 46247

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 24

Quantidade total de linhas do arquivo digital 46247

Data de início 01/01/2016

Data de término 31/12/2016



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 13.031.489,76	R\$ 21.250.632,60
CIRCULANTE	R\$ 6.757.514,36	R\$ 14.959.833,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.758.990,86	R\$ 13.901.399,92
BENS NUMERÁRIOS	R\$ 1.171.414,19	R\$ 9.515.166,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	R\$ 24.903,34	R\$ 228.104,12
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.562.673,33	R\$ 4.158.129,05
CLIENTES	R\$ 2.602.718,50	R\$ 23.006,18
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.602.718,50	R\$ 23.006,18
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 96.445,00	R\$ 457.927,13
CONSÓRCIOS	R\$ (0,00)	R\$ 57.940,08
TÍTULOS A RECEBER	R\$ (0,00)	R\$ 162.500,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 6.157,78	R\$ 6.911,64
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 90.287,22	R\$ 230.575,41
ESTOQUES	R\$ 299.360,00	R\$ 577.500,00
ESTOQUES DIVERSOS	R\$ 299.360,00	R\$ 577.500,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.273.975,40	R\$ 6.290.799,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 142.644,36	R\$ 143.670,80
OUTROS CREDITOS	R\$ 142.644,36	R\$ 143.670,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 142.644,36	R\$ 143.670,80
IMOBILIZADO	R\$ 6.131.331,04	R\$ 6.147.128,57
IMÓVEIS	R\$ 506.797,52	R\$ 506.797,52
BENS EM OPERAÇÃO	R\$ 7.784.361,86	R\$ 7.834.044,06
(-) (-) DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (2.159.828,34)	R\$ (2.193.713,01)
PASSIVO	R\$ 13.031.489,76	R\$ 21.250.632,60
CIRCULANTE	R\$ 422.606,25	R\$ 1.649.866,80
FORNECEDORES	R\$ 76.536,38	R\$ 1.145.617,74
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 76.536,38	R\$ 1.145.617,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 246.636,38	R\$ 375.844,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 246.636,38	R\$ 375.371,15
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ (0,00)	R\$ 473,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 98.648,68	R\$ 128.404,11
OBRIGACOES COM O PESSOAL	R\$ 28.720,67	R\$ 36.147,94
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 21.311,15	R\$ 29.408,91
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	R\$ 48.616,86	R\$ 62.847,26

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.2

Página 1 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 784,81	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 784,81	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.608.883,51	R\$ 19.600.765,80
CAPITAL SOCIAL	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 1.364.547,13	R\$ 1.364.547,13
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 5.244.336,38	R\$ 12.236.218,67
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 4.164.080,42	R\$ 5.244.336,38
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	R\$ 4.736.821,62	R\$ 11.891.882,29
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	R\$ (3.656.565,66)	R\$ (4.900.000,00)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 15.608.806,93	R\$ 26.663.146,63
VENDAS MERCADO INTERNO	R\$ 1.583.550,24	R\$ 2.057.035,85
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	R\$ 14.025.256,69	R\$ 24.606.110,78
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.083.011,75)	R\$ (1.344.680,57)
(-) VENDAS CANCELADAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.964,80)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ (1.964,80)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	R\$ (1.083.011,75)	R\$ (1.342.715,77)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (1.083.011,75)	R\$ (1.342.715,77)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 14.525.795,18	R\$ 25.318.466,06
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	R\$ (8.528.479,53)	R\$ (11.349.629,34)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (95.242,93)	R\$ (201.323,29)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ (461.291,89)	R\$ (508.773,67)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ (8.894,61)	R\$ (76.832,22)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (31.844,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (639,62)	R\$ (0,00)
(-) (-) ESTOQUE FINAL	R\$ (29.827,50)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO	R\$ (4.781.380,31)	R\$ (5.566.093,48)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA	R\$ (573.339,01)	R\$ (908.090,65)
(-) GASTOS GERAIS	R\$ (55.834,26)	R\$ (140.180,25)
(-) MÃO-DE-OBRA INDIRETA	R\$ (6.884,19)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	R\$ (1.521.142,43)	R\$ (2.753.659,59)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ (295.200,19)	R\$ (253.193,05)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (107.302,39)	R\$ (425.843,14)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ (19.052,88)
(-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	R\$ (555.371,65)	R\$ (486.273,46)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (4.283,95)	R\$ (10.313,66)
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 5.997.315,65	R\$ 13.968.836,72
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (531.283,39)	R\$ (1.052.529,68)
(-) ADMINISTRATIVAS	R\$ (446.489,59)	R\$ (1.031.012,04)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (168.259,47)	R\$ (243.215,92)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ (1.369,00)
(-) OCUPAÇÃO	R\$ (19.563,08)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS	R\$ (13.793,14)	R\$ (11.220,04)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	R\$ (0,00)	R\$ (7.047,48)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (244.873,90)	R\$ (768.159,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (8.918,45)	R\$ (39.125,17)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (8.918,45)	R\$ (39.125,17)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 21.680,21	R\$ 180.226,79
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 21.680,21	R\$ 180.226,79
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (97.555,56)	R\$ (162.619,26)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (97.555,56)	R\$ (162.619,26)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ 5.466.032,26	R\$ 12.916.307,04
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ (160.358,58)	R\$ (117.796,33)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 340.000,00	R\$ 396.814,88
RECEITAS	R\$ 340.000,00	R\$ 396.814,88
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (500.358,58)	R\$ (514.611,21)
(-) CUSTOS	R\$ (500.358,58)	R\$ (514.611,21)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	R\$ 5.305.673,68	R\$ 12.798.510,71
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (194.444,53)	R\$ (313.791,14)
(-) CSLL	R\$ (194.444,53)	R\$ (313.791,14)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ (374.407,53)	R\$ (592.837,28)
(-) IRPJ	R\$ (374.407,53)	R\$ (592.837,28)
(=) LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 4.736.821,62	R\$ 11.891.882,29



0144 PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CNPJ: 77.744.134/0001-41

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA 2016

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
Resultado do exercício/período	11.891.882,29	4.736.821,62
Depreciação e Amortização	33.884,67	363.210,23
Variações nos ativos e passivos	-362.508,57	-66.906,57
(Aumento) Redução em contas a receber	2.579.712,32	-1.326.126,29
(Aumento) Redução dos estoques	-278.140,00	29.827,50
Aumento (Redução) em fornecedores	1.069.081,36	26.742,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	158.179,19	65.936,73
= Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ operac	3.200.208,97	-907.316,32
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	-49.682,20	-1.141.945,75
= Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ invest	-49.682,20	-1.141.945,75
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	6.991.882,29	1.080.255,96
Empréstimos tomados	0,00	-71.666,75
= Disponibilidades líquidas ger pelas ativ de financiamento	6.991.882,29	1.008.589,21
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	10.142.409,06	-1.040.672,86
5 - Disponibilidades no início do período	3.758.990,86	4.799.663,72
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	13.901.399,92	3.758.990,86

MOISES DE GASPERIN
Socio Administrador
CPF: 518.634.809-00

Ronnie Emerson Bordin
CRC: 1-PR-034612/O-9 - Contador
CPF: 842.592.309-30

g

7 69

2 96

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CNPJ: 77.744.134/0001-41



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2016

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
Saldo Anterior de Lucros/ Prejuízos Acumulados	5.244.336,38	4.164.080,42
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	11.891.882,29	4.736.821,62
SOMA DOS RECURSOS	17.136.218,67	8.900.902,04
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(4.900.000,00)	(3.656.565,66)
SOMA DAS APLICAÇÕES	(4.900.000,00)	(3.656.565,66)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.236.218,67	5.244.336,38

MOISES DE GASPERIN
Socio Administrador
CPF: 518.634.809-00

Ronnie Emerson Bordin
CRC: 1-PR-034612/O-9 - Contador
CPF: 842.592.309-30



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

PEDREIRA SANTIAGO LTDA, inscrita no CNPJ 77.744.134/0001-41 constituída em 11/09/1979, tributada pelo Lucro Presumido, com ramo de atividade: Construção de rodovias e ferrovias Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; Piniura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos; Atividades de estudos geológicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Com sede na Rua 13 DE MAIO, número 1, bairro SAO MIGUEL em Chopinzinho - Paraná

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOADAS

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência. A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios da Contabilidade aprovada pela resolução CFC nº 750/1993 e disposições contidas na NBC TG 1000 aprovada pela resolução CFC nº 1.255/2009.

O imobilizado está avaliado pela média do valor de mercado dos bens.

A depreciação foi alocada de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

Edifícios 4% a.a.; Móveis e utensílios 10% a.a.; Software 10% a.a.; Veículos 10% a.a.;

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos cfe tabela abaixo:

Valor	Taxa de Depreciação	Valor Depreciado em 2016
R\$ 6.949.548,87	10% a.a.	R\$ 382.809,39
R\$ 20.833,12	20% a.a.	R\$ 2.534,53
R\$ 4.500,00	25% a.a.	R\$ 92,46

Valor total de máquinas, aparelhos e equipamentos R\$ 6.974.881,99 ;

Taxa média de depreciação 18,33% a.a.;

Valor total depreciado em 2016 R\$ 385.436,38 .

Equipamentos para Processamento de Dados cfe tabela abaixo:

Valor	Taxa de Depreciação	Valor Depreciado em 2016
R\$ 1.100,00	10% a.a.	R\$ 77,00
R\$ 5.915,65	20% a.a.	R\$ 828,27
R\$ 1.539,00	25% a.a.	R\$ 100,68

Valor total de máquinas, aparelhos e equipamentos R\$ 8.554,65;

Taxa média de depreciação 18,33% a.a.;

Valor total depreciado em 2016 R\$ 1.005,95.

4) Para o Recurso Mineral está sendo utilizada a seguinte taxa atual de exaustão 12,5% a.a..

MOISES DE GASPERIN
Socio Administrador
CPF: 518.634.809-00

Ronnie Emerson Bordin
CRC: 1-PR-034612/O-9 - Contador
CPF: 842.592.309-30



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41200132401	CNPJ 77.744.134/0001-41
NOME EMPRESARIAL PEDREIRA SANTIAGO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 37.15.66.83.48.2E.D4.50.FB.A2.EA.E3.7E.66.52.28.41.A9.47.95	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	77744134000141	PEDREIRA SANTIAGO LTDA:77744134000141	268219927726527774 4	22/08/2016 a 22/08/2017	Não
Contador	84259230930	RONNIE EMERSON BORDIN:84259230930	771374489257037026 9	11/08/2014 a 10/08/2017	Não
Administrador	51863480900	MOISES DE GASPERIN:51863480900	268219816886414808 5	10/06/2015 a 09/06/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

37.15.66.83.48.2E.D4.50.FB.A2.EA.E3.
7E.66.52.28.41.A9.47.95-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2017 às 13:08:00

F8.82.D6.F6.13.14.66.CA
D5.9D.DF.67.58.DD.82.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. SI 23



CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 201711011316416200000

**** RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT ****, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Observações:

Não Há.

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 50 anos.

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, quarta-feira, 1 de novembro de 2017.

Rodolfo Rafael da Conceição
auxiliar juramentado

Raquel Teixeira de Lima Dalmut
titular



TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARREN

10 NOV. 2017

O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL
MARCOS ROY ERIG FERRI - TABELIÃO

FMS44076



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0013240-1

CNPJ

77.744.134/0001-41

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

11/09/1979

Data de Início de Atividade

01/11/1979

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA 13 DE MAIO, S/N, SAO MIGUEL, CHOPINZINHO, PR, 85.560-000

Objeto Social

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEDRA BRITADA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E CALÇADAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, PREPARAÇÃO DE TERRENOS, ATERROS; SERVIÇOS DE SANEAMENTO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SECAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE CONCRETO E ASFALTO USINADO; REALIZAÇÃO DE PESQUISA, LAVRA, ESTUDOS GEOLÓGICOS, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO.

Capital: R\$ 6.000.000,00
(SEIS MILHOES DE REAIS)

Capital Integralizado: R\$ 6.000.000,00
(SEIS MILHOES DE REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei nº 123/2006)

Não

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ

Participação no capital (R\$)

Espécie de Sócio

Administrador

Término do Mandato

MOISES DE GASPERIN
518.634.809-00

5.940.000,00 SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

MARCELO SILVESTRI
025.056.959-03

60.000,00 SOCIO

XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 06/10/2014

Número: 20144246490

Ato: COMUNICACAO EXTRA-JUDICIAL

Evento (s): OUTROS

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

COM IMPEDIMENTO EXTRAJUDICIAL

Observações:

BLOQUEIO(S)

EXTRA-JUDICIAL: PROCEDER A AVERBAÇÃO NOS REGISTROS DA EMPRESA SUPRA DE QUE FORAM ARQUIVADAS A 12ª E 13ª ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, DATADAS DE 20/01/2012 E 26/12/2013, RESPECTIVAMENTE, SEM O ATO DE ASSENTIMENTO PRÉVIO DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL. OFÍCIO Nº 383/2014/DREI/SRS/SMPE EM 30/07/2014 DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI. PROTOCOLO: 14/424649-0 EM 26/08/2014.

CHOPINZINHO - PR, 01 de novembro de 2017

17/774581-9



Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Lei: 13.226 de 18/07/2001

SELO
FUNARPEN

Tabellionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FM544079

TABELIONATO FERRI

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO

COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

10 NOV 2017

O PRESENTE DOCUMENTO É
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO
ORIGINAL

MARCOS ROGERIO FERRI - TABELIÃO



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017

O signatário da presente, em nome da proponente PEDREIRA SANTIAGO LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,


PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Detonação, Britas e Transportes.

Fone (46) 3242-1002

Fone/Fax 3242-3456

Rua Treze de Maio, s/n (prolongamento)
85560-000 CHOPINZINHO - PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CONCORRÊNCIA 04/2017

ENVELOPE 01
HABILITAÇÃO PRELIMINAR

DATA DE ABERTURA: 24/11/2017

HORÁRIO: 09:00 Horas

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ 77.744.134/0001-41



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

CONCORRÊNCIA 04/2017

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ: 77.744.134/0001-41

[Handwritten signatures and initials]

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.



PROPOSTA DE PREÇOS

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 04/2017

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços, relativa à Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trecho:

- ☐ Rua Leopoldo Schiavini (entre Rua Armindo Bernardo Pick e Rua Armindo José Gregolin)
- ☐ Rua Luiz Ruffato (entre Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)
- ☐ Rua dos Caminhões (entre Prolongamento da Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)
- ☐ Rua Duque de Caxias (entre Rua Hermes Alcides Lunardi até o final do Lote 19A da mesma Rua)
- ☐ Rua 15 de Novembro (entre Rua Henrique Zanella e Rua Zefferino Poletto)
- ☐ Rua Valdomiro Castro (entre Rua Jacó Fleck e Av. Generoso Marques)
- ☐ Rua Dona Rosa Stédile (entre Rua Santa Catarina e Rua Tupi)
- ☐ Rua das Azaleias (entre Rua Candido Inácio de Lima e Rua dos Canários)
- ☐ Rua Duque de Caxias (entre Rua Luiz Bassan Mezzomo e Rua Doutor Ubaldino do Amaral)
- ☐ Rua Antonio Inácio Rokemback (entre Rua Celeste Foppa e Rua Santa Catarina)
- ☐ Rua Waldemar Antonio Fischer (entre Rua Clevelândia e Rua Antonio Inácio Rokemback)
- ☐ Rua José Henrique de Freitas (entre Rua 15 de Novembro e Rua Luiz Costella)
- ☐ Rua Luiz Costella (entre Rua Ângelo Colpani e Rua José Henrique de Freitas)
- ☐ Rua Ângelo Colpani (entre Rua 15 de Novembro e Rua Clevelândia)
- ☐ Rua Fioravante Panato (entre Av. Generoso Marques e Rua Candido Inácio de Lima)
- ☐ Rua Giuseppe Guarnieri (entre Rua Antonio Schiavini e Rua Primo Zeni)

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

*Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.*



O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 3.071.208,59** (Três milhões setenta e um mil duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).

O prazo de execução do objeto é de 330 (Trezentos e trinta) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin – Rep. Legal
RG: 3.519.935-7



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplanagem, Cascalhamento e Pavimentação.

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS

Município:	CORONEL VIVIDA - PR				SAM	38
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS				LOTE nº	01
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
				unitário	parcial	subtotal
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.600,00
74209/1	Placa de Obra 2,00 x 1,00	ud	1,00	1.600,00	1.600,00	
2	TERRAPLENAGEM					5.236,00
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	58,00	12,00	696,00	
400300	Destocamento árvores diam. < 30cm	ud	227,00	20,00	4.540,00	
4	REVESTIMENTO					2.029.135,02
PAV-77	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	34.160,41	1,60	54.656,66	
561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	68.320,82	1,90	129.809,56	
570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) Reperfilamento	ton	1.708,03	360,00	614.890,80	
570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) Capa	ton	3.416,05	360,00	1.229.778,00	
5	MEIO-FIO E SARJETA					131.465,86
606700B	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	m	5.202,80	13,25	68.937,10	
810150	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1.488,78	42,00	62.528,76	
6	PAISAGISMO / URBANISMO					775.663,39
810250A	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	12.832,54	13,50	173.239,29	
72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	7.610,49	4,20	31.964,06	
516000	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	380,52	92,00	35.007,84	
534906	Paver e=6cm - sem colchão	m2	6.457,17	61,00	393.887,37	
534906C	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	m2	1.153,22	72,00	83.031,84	
74236/1	Plantio de Grama em placas	m2	2.338,24	10,80	25.252,99	
605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	ud	128,00	260,00	33.280,00	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					109.988,32
822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.069,83	29,75	61.577,44	
820000	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	9,71	326,00	3.164,66	
821300	Suporte metálico galv.fogo d=2,5" c/Tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	43,00	382,00	16.426,00	
820000E	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	23,00	480,00	11.040,00	
820000G	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	37,00	480,00	17.760,00	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					16.120,00
74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	ud	47,00	90,00	4.230,00	
74022/53	Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	47,00	90,00	4.230,00	
74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	ud	47,00	90,00	4.230,00	
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	47,00	90,00	4.230,00	
72872	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	1.200,00	1.200,00	
PREÇO GLOBAL						3.071.208,59


Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasperin - Rep. Legal
RG 3.519.935-7

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Marcelo Silvestri - Resp. Técnico
CREA PR 68.498/D

e-mail: pedreirasantiagoltda@gmail.com - Financeiro: danfe.santiago@gmail.com

Fone (46) 3242-1409 e 3242-3456 Fax (46) 3242-1002 CNPJ 77.744.134/0001-41 Inscr. Est. 31200845-92
Rua 13 de Maio, s/n - prolongamento - CEP 85.560-000 Chopinzinho - Paraná



PEDREIRA SANTIAGO LTDA.
Prestação de Serviços, Britagem, Transportes, Locação de Máquinas,
Terraplenagem, Cascalhamento e Pavimentação.



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REF: CONCORRÊNCIA 04/2017

Código	Descrição Serviços	Valor	Prazo de execução (dias)												Peso	TOTAL
		Serviço R\$		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	(%)	OBRA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.600,00	R\$ 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	59.802.120,3 \$R
			% 100,00%													
2	TERRAPLENAGEM	5.236,00	R\$ 1.570,80	1.570,80	1.570,80	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%	
			% 30,00%	30,00%	30,00%	10,00%										
4	REVESTIMENTO	2.029.135,02	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	304.370,25	304.370,25	304.370,25	304.370,25	304.370,25	304.370,25	304.370,25	202.913,50	66,07%	
			%				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
5	MEIO-FIO E SARJETA	131.465,86	R\$ 19.719,88	19.719,88	19.719,88	19.719,88	19.719,88	19.719,88	13.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	
			% 15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%							
6	PAISAGISMO / URBANISMO	775.663,39	R\$ 116.349,51	116.349,51	116.349,51	116.349,51	116.349,51	116.349,51	77.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%	
			% 15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%							
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	109.988,32	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.996,50	32.996,50	43.995,33	0,00	3,58%	
			%								30,00%	30,00%	40,00%			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	18.120,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	1.812,00	0,00	0,59%	
			%				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 139.240,19	137.640,19	137.640,19	136.592,99	443.157,64	443.157,64	397.801,18	307.088,25	340.064,75	340.064,75	248.720,83			
			% 4,53%	4,48%	4,48%	4,45%	14,43%	14,43%	12,95%	10,00%	11,07%	11,07%	8,10%			
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 139.240,19	276.880,38	414.520,56	551.113,55	994.271,19	1.437.428,83	1.835.230,01	2.142.318,26	2.482.403,01	2.822.487,76	3.071.208,59			
			% 4,53%	9,02%	13,50%	17,94%	32,37%	46,80%	59,76%	69,75%	80,83%	91,90%	100,00%			

Chopinzinho, 24 de Novembro de 2017.

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Moisés de Gasparin - Rep. Legal
RG: 3.519.935-7

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Marcelo Silvestri - Resp. Técnico
CREA PR 68.498/D





PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Prestação de Serviços, Detonação, Britas e Transportes.

Fone (46) 3242-1002

Fone/Fax 3242-3456

Rua Treze de Maio, s/n (prolongamento)
85560-000 CHOPINZINHO - PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CONCORRÊNCIA 04/2017

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA DE ABERTURA: 24/11/2017

HORÁRIO: 09:00 Horas

PROPONENTE:

PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CNPJ 77.744.134/0001-41



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ATA Nº 126/2017 DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2017.

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, contendo a documentação e a proposta de preços, em atendimento ao edital de concorrência nº 04/2017.

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor Ademir Antonio Aziliero e membros os Senhores Fernando Q. Abatti, Iana Roberta Schmid e secretária a Senhora Leila Marcolina Gruntowski reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 02 de 04 de janeiro de 2017 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº 04/2017. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentou-se como proponente a empresa: Pedreira Santiago Ltda representada, pelo senhor Moises de Gasperin. O senhor representante, após se identificar junto à comissão, efetuou a entrega dos envelopes nº 01 e nº 02, ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 01 e 02 pela comissão de licitação e pelo representante da proponente presente. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 01 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica do senhor representante da proponente presente. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 01 da proponente participante. Como a mesma apresentou sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou a mesma habilitada. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, o Senhor presidente acordou com a proponente, que tal fato será registrado em ata a qual deverá ser assinada pelo representante da proponente, e que, em ato contínuo, será aberto o envelope nº 02 contendo a proposta de preços. A seguir, procedeu-se à abertura deste, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: proponente Pedreira Santiago Ltda, R\$ 3.071.208,59 (três milhões e setenta e um mil duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), prazo de execução de 330 (trezentos e trinta dias), prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. A proposta foi rubricada pela comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica do representante da proponente. A Comissão de Licitação analisou a adequação formal da proposta aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R\$ 3.071.211,99, o prazo de execução é de 330 dias, o prazo de validade da proposta é de 60 dias. Na sequência procedeu-se a conferência da planilha de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	VALOR ANALISADO R\$
01	Pedreira Santiago Ltda	3.071.208,59	3.071.208,59

A proponente renunciou expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento da proposta de preços. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Fernando Q. Abatti, membro da comissão, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representante da proponente presente.

Fernando
W. A. / L. M.
Leila n. Gruntowski

[Handwritten signature]



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 77.744.134/0001-41

Data da Emissão : 12/07/2017

Hora da Emissão : 16:28:07

Código de Controle da Certidão : 472A.21A5.FCC1.994F

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 12/07/2017, com validade até 08/01/2018.

[Página Anterior](#)

**Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda**☐ Recelto PR ☐ Sefanet ☐ EXPRESSO

chave:

senha:

Ok

Certificado
Digital

Secretaria da Fazenda ▼ palavra-chave

Pesquisar

Confirmação de Certidão**Informações do Documento**

Certidão 017146967-93

Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

Fornecida para o CNPJ 77.744.134/0001-41
PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Emissão 01/11/2017 10:10:59

Data de Validade 01/03/2018

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localização





Município de Chopinzinho - Paraná

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome.....: PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CPF/CNPJ.....: 77.744.134/0001-41
Endereço.....: RUA 13 DE MAIO
Bairro.....: SAO MIGUEL
Cidade.....: CHOPINZINHO

Número Cad...: 4545
RG/Inscr.....:
Número.....: 0
UF.....: PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos
OBS:

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que em nome do Contribuinte, NÃO CONSTA DÉBITOS, referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do Contribuinte acima, que vierem ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>>.

Certidão emitida conforme Artigo 349 da Lei Municipal N° 050/2009 de 18/12/2009.

Emitida em 21/11/2017.
Válida até 60 dias após a data de emissão desta.
Código/Ano da certidão.....: 4065/2017
Código de autenticidade da certidão: 182135176182135

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 21/11/2017.

CAIXAPara você
para todos
os brasileiros

ACESSE SUA CONTA OK

A CAIXA

REDE DE ATENDIMENTO

OUVIDORIA

DOWNLOAD

MAPA DO SITE

SEGURANÇA

IMPrensa

?

Navegue pela CAIXA



Produtos e Serviços

Ajuda

[Home](#) | [SERVIÇOS AO CIDADÃO](#) | [FGTS Empresa](#) | [Consulta Regularidade do Empregador](#) | [Situação de Regularidade do Empregador](#) | [Histórico do Empregador](#)

:: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

Inscrição: 77744134/0001-41**Razão Social:** PEDREIRA SANTIAGO LTDA**Nome Fantasia:** PEDREIRA SANTIAGO

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/11/2017	07/11/2017 a 06/12/2017	2017110701284660953740
19/10/2017	19/10/2017 a 17/11/2017	2017101901581865003355
30/09/2017	30/09/2017 a 29/10/2017	2017093001412605186400
11/09/2017	11/09/2017 a 10/10/2017	2017091100390506155920
23/08/2017	23/08/2017 a 21/09/2017	2017082301545651464956
04/08/2017	04/08/2017 a 02/09/2017	2017080401511992793619
16/07/2017	16/07/2017 a 14/08/2017	2017071604032153590509
27/06/2017	27/06/2017 a 26/07/2017	2017062701592648812623
08/06/2017	08/06/2017 a 07/07/2017	2017060801443880950634
20/05/2017	20/05/2017 a 18/06/2017	2017052001563361813437
01/05/2017	01/05/2017 a 30/05/2017	2017050100550204496834
12/04/2017	12/04/2017 a 11/05/2017	2017041201364593839883
24/03/2017	24/03/2017 a 22/04/2017	2017032401495608463450
05/03/2017	05/03/2017 a 03/04/2017	2017030500560307530847
14/02/2017	14/02/2017 a 15/03/2017	2017021401590955684838
26/01/2017	26/01/2017 a 24/02/2017	2017012601543565307505
07/01/2017	07/01/2017 a 05/02/2017	2017010701363746489028
19/12/2016	19/12/2016 a 17/01/2017	2016121900524800433047
30/11/2016	30/11/2016 a 29/12/2016	2016113001344324423520
11/11/2016	11/11/2016 a 10/12/2016	2016111102165096873334
23/10/2016	23/10/2016 a 21/11/2016	2016102305354713748604
04/10/2016	04/10/2016 a 02/11/2016	2016100401235755118378
15/09/2016	15/09/2016 a 14/10/2016	2016091501430255864301
27/08/2016	27/08/2016 a 25/09/2016	2016082701484424724622
08/08/2016	08/08/2016 a 06/09/2016	2016080800365927161601
20/07/2016	20/07/2016 a 18/08/2016	2016072001182254924933
01/07/2016	01/07/2016 a 30/07/2016	2016070101551581655998
12/06/2016	12/06/2016 a 11/07/2016	2016061201590332799290
24/05/2016	24/05/2016 a 22/06/2016	2016052401261232198304
05/05/2016	05/05/2016 a 03/06/2016	2016050501240947742151
16/04/2016	16/04/2016 a 15/05/2016	2016041602133652525932
28/03/2016	28/03/2016 a 26/04/2016	2016032801152405093270
09/03/2016	09/03/2016 a 07/04/2016	2016030912213397512128
19/02/2016	19/02/2016 a 19/03/2016	2016021904352324602431



31/01/2016	31/01/2016 a 29/02/2016	2016013105421155933335
12/01/2016	12/01/2016 a 10/02/2016	2016011202081393940614
24/12/2015	24/12/2015 a 22/01/2016	2015122405095966389546
05/12/2015	05/12/2015 a 03/01/2016	2015120505372507680702
16/11/2015	16/11/2015 a 15/12/2015	2015111601484453691119
28/10/2015	28/10/2015 a 26/11/2015	2015102803405642691778
09/10/2015	09/10/2015 a 07/11/2015	2015100904155684004168
20/09/2015	20/09/2015 a 19/10/2015	2015092004050711180360
01/09/2015	01/09/2015 a 30/09/2015	2015090102124372087821
13/08/2015	13/08/2015 a 11/09/2015	2015081302421351624634
25/07/2015	25/07/2015 a 23/08/2015	2015072504084920991026
06/07/2015	06/07/2015 a 04/08/2015	2015070601530710283429
17/06/2015	17/06/2015 a 16/07/2015	2015061703265505418813
29/05/2015	29/05/2015 a 27/06/2015	2015052903500797800554
10/05/2015	10/05/2015 a 08/06/2015	2015051002375538227708
21/04/2015	21/04/2015 a 20/05/2015	2015042102114992604147

Resultado da consulta em 24/11/2017 às 14:55:40

■ Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDREIRA SANTIAGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 77.744.134/0001-41

Certidão nº: 136454237/2017

Expedição: 04/09/2017, às 08:30:02

Validade: 02/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDREIRA SANTIAGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **77.744.134/0001-41**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ**



Confirmação de Autenticidade da Certidão

CERTIDÃO Nº :	149804/2017
REGISTRO - CREA :	38533
SOLICITADA POR :	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
OBJETIVO SOCIAL :	Construção e recuperação de rodovias; Extração e britamento de pedra; Comércio Atacadista de pedra britada; Prestação de serviço de sinalização rodoviária; Construção e manutenção de ruas e calçadas; Prestação de serviços de terraplenagem, movimentações de terra, preparação de terrenos, aterros; Serviços de saneamentos; Transporte rodoviário de cargas secas municipal, intermunicipal e interestadual; Serviços de engenharia; Construção de edifícios; Fabricação de concreto e asfalto usinado; Realização de pesquisa, lavra, estudos geológicos, exploração e aproveitamento dos recursos minerais no território nacional; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção.
RESP. TÉCNICO(S)	1 - ELIZANGELA PEREIRA VILELA Carteira: PR-63346/D Título: GEÓLOGA LEI 4076 - ARTIGO 06 São da competência do geólogo ou engenheiro geólogo: a) trabalhos topográficos e geodésicos; b) levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos; c) estudos relativos às ciências da terra; d) trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; e) ensino das ciências geológicas nos estabelecimentos de ensino secundário e superior; f) assuntos legais relacionados com suas especialidades; g) perícias e arbitramentos referentes às matérias das alíneas anteriores. Parágrafo único - É também da competência do geólogo ou engenheiro-geólogo o disposto no item IX, artigo 16, do Decreto-Lei nº1.985, de 29 JAN 1940 (Código de Minas).(*) (*) IX - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da autorização, e sem prejuízo de quaisquer informações pedidas pelo D.N.P.M. no curso deles, o concessionário apresentará um relatório circunstanciado, sob a responsabilidade do profissional legalmente habilitado ao exercício de Engenharia de Minas com dados informativos que habilitem o Governo a formar juízo seguro sobre a reserva mineral da jazida, qualidade do minério e possibilidade de lavra. Nomeadamente: a) situação, vias de acesso e comunicação; b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as exposições naturais de minério e as que forem descobertas pela pesquisa; c) perfis geológicos-estruturais; d) descrições detalhada da jazida; e) quadro demonstrativo de quantidade e da qualidade do minério; f) resultado dos ensaios de beneficiamento; g) demonstração da possibilidade de lavra; h) estudo analítico das águas, do ponto de vista de suas qualidades químicas, físicas e físico químicas, além das exigências supra-referidas que lhes forem aplicáveis. de 23/06/1962 Possui atribuições para Utilização de Explosivos e Desmonte de Rochas conforme DN 071/2001 do CONFEA. Possui atribuições para ensaios de beneficiamento e para demonstração de possibilidade de lavra conforme o parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 4.076 de 23 de junho de 1962. 2 - MARCELO SILVESTRI Carteira: PR-68498/D Título: ENGENHEIRO CIVIL DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA
DATA EMISSÃO :	21/11/2017 11:20:16
VALIDADE :	31/03/2018
FINALIDADE :	LICITAÇÕES



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Confirmação de Autenticidade da Certidão

CERTIDÃO Nº :	149805/2017
CARTEIRA - CREA :	PR-68498/D
SOLICITADA POR :	MARCELO SILVESTRI
TÍTULOS :	ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÕES :	DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA
DATA EMISSÃO :	21/11/2017 11:20:39
VALIDADE :	31/03/2018
FINALIDADE :	Licitações



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ**

Confirmação de Autenticidade da Certidão

**ENGENHEIRO CIVIL
MARCELO SILVESTRI**

Emitida em : 25/09/2009

Carteira Profissional: PR-68498/D

Acervo Técnico Nº.:10407/2009

Selo(s) de Autenticidade: 4783

ART N°.....:20092586416 0 Registrada.....:22/07/2009

Empresa Executora...:PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Tipo de Contrato....:EMPREITADA

Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS

Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO

Serviço Contratado...:EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Dimensão.....:10.100,00 TON

Área Ampliada.....:0,00 TON

Área de Reforma...:0,00 TON

Local da Obra.....:ESTRADA LIG. CHOPINZINHO - COM. BUGRE, NAO N. SRA.

APAREC. E BUGRE

Município/Estado....:CHOPINZINHO/PR

Data de Início.....:20/07/2009

Data de Conclusão:17/09/2009

Descr. Compl. Serv.:USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE 10.100,00

TONELADAS DE CBUQ. ESTRADA DE LIGAÇÃO CHOPINZINHO A COMUNIDADE DO BRUGRE

COM EXTENSAO DE 13 KM. PRINCIPAIS SERVIÇOS: CORREÇÃO DA PISTA COM

COMPACTAÇÃO COM ROLO PESADO, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA; PINTURAS DE

IMPRIMAÇÃO E LIGAÇÃO; REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO E APLICAÇÃO DE 5.000

M³ DE BRITA GRADUADA PARA FORMAÇÃO DE BASE P' / PAVIM. ASFÁLTICA; APLICAÇÃO

DE REPERFILAGEM EM CBUQ (3 CM) SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E BRITA

GRADUADA; APLICAÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO (3 CM) SOBRE REPERFILAGEM DE CBUQ

COM VIBRO-ACABADORA..

Observação.....:

ART N°.....:20093424894 0

Registrada.....:24/09/2009

ART Vinculada.....:20092586416 0

Empresa Executora...:PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Tipo de Contrato....:EMPREITADA

Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS

Tipo de Obra/Serviço:ARRUAMENTO

Serviço Contratado...:EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Dimensão.....:2.525,00 TON

Área Ampliada.....:0,00 TON

Área de Reforma...:0,00 TON

Local da Obra.....:ESTRADA LIG. CHOPINZINHO - COM. BUGRE, NAO N. SRA.

APAREC. E BUGRE

Município/Estado....:CHOPINZINHO/PR

Data de Início.....:25/08/2009

Data de Conclusão:17/09/2009

Descr. Compl. Serv.:ADITAMENTO DE CONTRATO PARA OS MESMOS SERVIÇOS DA ART

PRINCIPAL, PASSANDO A OBRA A TER AS SEGUINTEs QUANTIDADES TOTAIS: USINAGEM,

TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE 12.625,00 TONELADAS DE CBUQ. ESTRADA DE LIGAÇÃO

CHOPINZINHO A COMUNIDADE DO BRUGRE COM EXTENSAO DE 13 KM. PRINCIPAIS

SERVIÇOS: CORREÇÃO DA PISTA COM COMPACTAÇÃO COM ROLO PESADO, LIMPEZA E

LAVAGEM DA PISTA; PINTURAS DE IMPRIMAÇÃO E LIGAÇÃO; REMOÇÃO DE PAVIMENTO

POLIÉDRICO E APLICAÇÃO DE 5.000 M³ DE BRITA GRADUADA PARA FORMAÇÃO DE BASE

P' / PAVIM. ASFÁLTICA; APLICAÇÃO DE REPERFILAGEM EM CBUQ (3 CM) SOBRE

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E BRITA GRADUADA; APLICAÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO (3 CM) SOBRE REPERFILAGEM DE CBUQ COM VIBRO-ACABADORA..

Observação.....:





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calcadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa da obra, totalizando 34.160,41 m²; conforme planilhas, projetos e memoriais.

01. ABERTURA: 24 de novembro de 2017, as 09:00 horas, no prédio sede da Prefeitura de Coronel Vivida, situado na Praça Ângelo Mezzomo.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- Diário Oficial do Estado no dia 25 de outubro de 2017;
- Jornal Bem Paraná no dia 25 de outubro de 2017;
- Jornal Diário do Sudoeste no dia 25 de outubro de 2017;
- Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná no dia 25 de outubro de 2017.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 25 de outubro de 2017.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 24 de novembro de 2017, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, II, “a” e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

Nº	NOME	ENDEREÇO
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	RUA TREZE DE MAIO, S/N, CHOPINZINHO - PARANÁ
02	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	RUA BLUMENAU, 20D, BAIRRO LIDER, CHAPECÓ – SANTA CATARINA
03	SIZA CONSTRUTORA LTDA – EPP	RUA JOSÉ LEONARDI, 225 – AEROPORTO, PATO BRANCO - PARANÁ

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

05. PARTICIPANTE DO CERTAME

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	MOISES DE GASPERIN

78

7

u

g



06. HABILITAÇÃO

Proponente habilitado:

Nº	EMPRESA
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Proponentes inabilitados:

Não houve.

A decisão foi comunicada em 24 de novembro de 2017 à empresa através da própria ata.

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Não houve apresentação de recursos.

08. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve apresentação de recursos.

09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve apresentação de recursos.

10. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Participou da sessão de abertura a seguinte empresa:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	MOISES DE GASPERIN

O preço proposto foi:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	3.071.208,59

11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal da proposta aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R\$ 3.071.211,99, o prazo de execução é de 330 dias, o prazo de validade da proposta é de 60 dias.

Na sequência procedeu-se a conferência da planilha de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	VALOR ANALISADO R\$
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	3.071.208,59	3.071.208,59



A decisão foi comunicada à empresa através da própria ata.

12. RECURSOS

A proponente renunciou expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento da proposta de preços.

13. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve apresentação de recursos.

14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve apresentação de recursos.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da Concorrência Pública nº 04/2017, seja adjudicada, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, à respectiva proponente vencedora, para entrega nos prazos e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto e pelo valor global seguinte:


Lote nº 01 (Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.)

Proponente: PEDREIRA SANTIAGO LTDA.


Valor global: R\$ 3.071.208,59 (tres milhões e setenta e um mil duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).


Prazo de execução: 330 (trezentos e trinta) dias.

Coronel Vivida, 27 de novembro de 2017.


Ademir Antonio Aziliero,
Presidente da Comissão.


Fernando Q. Abatti,
Membro da Comissão.


Iana R. Schmid,
Membro da Comissão.


Leila Marcolina Gruntowski.
Secretaria da Comissão.

Iana



De: Iana <iana@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de outubro de 2017 17:27
Para: 'heber silvestri'; 'pedreirasantiagolda@gmail.com'
Assunto: EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017
Anexos: 2. Edital de Concorrência nº 04-2017 Recapeamento asfáltico PARANACIDADE.pdf

BOA TARDE!

Envio em anexo o edital da concorrência pública nº 04/2017 que tem por objeto: **Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.**

Como a pasta técnica, anexa ao edital é muito grande, você conseguirá baixar pelo link:

mbf.me/HbNFHL

Att, Iana Schmid
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8304
iana@coronelvivida.pr.gov.br



iana

De: iana <iana@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de outubro de 2017 17:27
Para: 'guilherme elias piassa'
Assunto: EDITAL CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 04/2017
Anexos: 2. Edital de Concorrência nº 04-2017 Recapeamento asfáltico
PARANACIDADE.pdf



BOA TARDE!

Envio em anexo o edital da concorrência publica nº 04/2017 que tem por objeto: **Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.**

Como a pasta técnica, anexa ao edital é muito grande, você conseguirá baixar pelo link:

mbf.me/HbNFHL

Att, Iana Schmid
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8304
iana@coronelvivida.pr.gov.br



Iana

De: Iana <iana@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 1 de novembro de 2017 15:57
Para: 'Gilvane'; 'kaoane@planaterra.com.br'
Assunto: RES: EDITAL CC 4/17
Anexos: 2. Edital de Concorrência nº 04-2017 Recapeamento asfáltico
PARANACIDADE.pdf



Boa tarde!

Sim, o orçamento é assim mesmo, este edital vem do PARANACIDADE.

O orçamento deve se elaborado por cada empresa.

04.3 O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para em até 20%. O valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela cronograma físico-financeiro.



ITEM	DESCRIÇÃO – GRANDES ITENS	PERCENTUAL VALOR GLO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%
2	TERRAPLENAGEM	0,17%
4	REVESTIMENTO	65,69%
5	MEIO-FIO E SARJETA	4,22%
6	PAISAGISMO / URBANISMO	25,56%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	3,73%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	0,57%

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o global da proposta não poderá ultrapassar o **Preço Máximo** estabelecido no item 04. pena de desclassificação.

04.5 O prazo de execução e a data de início da (s) obra (s) será contado a partir do (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

Att, Iana Schmid
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8304
iana@coronelvivida.pr.gov.br

De: Gilvane [mailto:gilvane@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de novembro de 2017 15:35
Para: iana@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: ENC: EDITAL CC 4/17
Prioridade: Alta

De: Kaoane Garbin [mailto:kaoane@planaterra.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de novembro de 2017 15:10
Para: 'Gilvane'
Assunto: RES: EDITAL CC 4/17
Prioridade: Alta

Boa tarde,

Pois bem,

Baixamos todos os arquivos, porém o orçamento está zerado, (conf. Anexo).

Aguardo.

Att

Kaoane Garbin

Setor de Engenharia

☎ **Fone/Fax:** (49) 3321-1942

🌐 **Web:** <http://www.planaterra.com.br>

✉ **E-mail:** kaoane@planaterra.com.br



pense bem antes de imprimir

De: Gilvane [mailto:gilvane@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de novembro de 2017 14:58
Para: 'Kaoane Garbin'
Assunto: RES: EDITAL CC 4/17
Prioridade: Alta

Boa tarde

Segue em anexo edital solicitado, o mesmo se encontra disponível na pag. do Município.

Os anexos deverão baixar na pag. www.coronelvivida.pr.gov.br pois não consigo anexar no e-mail devido ao tamanho do arquivo exceder o permitido;

Att: Gilvane



De: Kaoane Garbin [mailto:kaoane@planaterra.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de novembro de 2017 14:53
Para: gilvane@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: EDITAL CC 4/17
Prioridade: Alta

Boa tarde,

Gostaria de solicitar o orçamento da Concorrência nº 4/17,

Fico no aguardo,

Att

Kaoane Garbin

Setor de Engenharia

☎ **Fone/Fax: (49) 3321-1942**

🌐 **Web: <http://www.planaterra.com.br>**

✉ **E-mail: Kaoane@planaterra.com.br**



--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e acredita-se estar livre de perigo.

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e acredita-se estar livre de perigo.

=====

E-mail verificado pela PC Tools - Nenhum vírus ou spyware encontrado .

(Email Guard: 9.1.0.2894, Virus/Spyware Database: 6.22240)

<http://free.pctools.com>

=====

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e acredita-se estar livre de perigo.

Destinatário

'Gilvane'

'kaoane@planaterra.com.br'

Ler

Lida: 01/11/2017 16:43

Lida: 01/11/2017 16:23



AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

CÓPIA DA PREFEITURA

PARANÁ URBANO - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS



Município : Coronel Vivida

Modalidade : Concorrência Nacional

Nr. : 0004/2017

Objeto : Recapeamento Asfáltico em CBUQ em vias urbanas do município, numa área de 34.160,41 m², incluindo execução de meio fio (6.691,58 m), calçadas em paver (7.610,39 m²), e sinalização viária horizontal e vertical.

Lote(s) : 1==> R\$ 3.071.208,59

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

* Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório

* Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) :

Lote 1 - Pedreira Santiago Ltda

A presente Autorização prende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas pela Lei 8.666/93 e alterações foram cumpridas de forma satisfatória.

Alertamos :

a) a necessidade da observância do contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos atos ora autorizados.

b) que este lote é financiável através do Sistema de Financiamento de Ações Municipais.

O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:

Lote 01 - Valor Total: R\$3.071.208,59 Valor Financiável: R\$3.000.000,00; Contrapartida Municipal: R\$71.208,59;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período eleitoral, a excessão de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba , 06/12/2017

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado do Paraná



João Carlos Ortega
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano

Associação : AMSOP
Escritório Regional : Escritório Regional de Cascavel
Contratos de empréstimo : Lote : 1 ==> 0000/0372-1
SAM Projeto Nr : 38

90

SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ - SFM


Parecer Processo Licitatório Nº 2017/7298

Município : Coronel Vivida
Modalidade : Concorrência Nacional
Lote(s) : ***1***

Nº : 0004/2017

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo Licitatório em epígrafe referente a execução de recapeamento asfáltico e, considerando a documentação apresentada, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e consequente homologação do procedimento, pois o mesmo cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação vigente e nos manuais operacionais do SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS.

Curitiba, 06 de dezembro de 2017.


Nayana Frontera Fabro Dias Pedrozo
Advogado

Associação : AMSOP
Escritório Regional : Escritório Regional de Cascavel
Contratos de empréstimo: Lote : 1 ==>
SAM Projeto Nº : 38


Ricardo Muller
Coordenador Operacional
06/12/17



PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017

DATA: 24/10/17

ABERTURA: 24/11/17

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, MEIO FIO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALCADAS EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DA OBRA, TOTALIZANDO 34.160,41 M²; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.

Analizada a proposta apresentada pelo licitante concorrente no edital epigrafado, a Comissão de Licitação encaminha ao chefe do poder executivo, o processo para a decisão final quanto à adjudicação e homologação do objeto ao licitante:


LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	77.744.134/0001-41	3.071.208,59


Nas condições de sua proposta e do edital.


Valor total da licitação é de R\$ 3.071.208,59 (três milhões, setenta e um mil duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).


Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelos membros da Comissão de Licitação.

Coronel Vivida, 08 de dezembro de 2017.


Ademir Antonio Aziliero
Presidente da CML


Fernando Q. Abatti
Membro da CML


Iana R. Schmid
Membro da CML


Leila Marcolina Gruntowski
Secretaria da CML



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



RESULTADO DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017

DATA: 24/10/17

ABERTURA: 24/11/17

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, MEIO FIO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALCADAS EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DA OBRA, TOTALIZANDO 34.160,41 M²; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS.

O Município de Coronel Vivida - Paraná, comunica aos interessados que a empresa vencedora da licitação em epígrafe é a seguinte:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	77.744.134/0001-41	3.071.208,59

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 3.071.208,59 (três milhões, setenta e um mil duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Coronel Vivida, 08 de dezembro de 2017.

Frank Ariel Schiavini,
Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017

DATA: 24/10/17

ABERTURA: 24/11/17

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, MEIO FIO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALCADAS EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DA OBRA, TOTALIZANDO 34.160,41 M²; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS.


Analizados todos os atos referentes à Concorrência Pública nº 04/2017, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epigrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	77.744.134/0001-41	3.071.208,59

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 3.071.208,59 (três milhões, setenta e um mil duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Coronel Vivida, 08 de dezembro de 2017.


Frank Ariel Schiavini,
Prefeito Municipal.



Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná



Terça-Feira, 12 de Dezembro de 2017

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano VI – Edição Nº 1501

Página 10 / 098

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA

LEI N.º 2814/2017, de 08 de dezembro de 2017

Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2528/2013 (PPA 2014 a 2017), nº 2728/2016 (LDO para 2017), e nº 2738/2016 (LOA para 2017).

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º) – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial e a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores no PPA–Plano Plurianual para 2014 a 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 2528, de 21 de novembro de 2013, na LDO–Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 aprovada pela Lei Municipal nº 2728/2016, de 30 de junho de 2016 e na LOA–Lei Orçamentária Anual para 2017, aprovada pela Lei Municipal nº 2738/2016, de 03 de novembro de 2016, no valor de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0800	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo		
0801	Departamento de Obras e Serviços Urbanos		
0801.28.451.0029.1.059	Obras e Equipamentos de Circulação		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	909-EA	250.000,00
4.4.90.53	Indenizações e Restituições	909-EA	5.000,00
TOTAL			255.000,00

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I–Excesso de Arrecadação por fonte de recursos, relativo aos valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira e de Transferências Voluntárias do Governo Estadual, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pelo órgão repassador, conforme abaixo especifica:

NOMENCLATURA DA FONTE	Órgão	Fonte de recursos	Valor do Excesso de Arrecadação Estimado
Convênio SEDU/ Caminhão Novo	SEDU	909	255.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO ESTIMADO			255.000,00

Art. 3º)–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de dezembro do ano de 2017.

Frank Ariel Schiavini–PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO–Contabilista – CRC 25.365

Cod255192

LEI N.º 2815/2017, de 08 de dezembro de 2017

Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2528/2013 (PPA 2014 a 2017), nº 2728/2016 (LDO para 2017), e nº 2738/2016 (LOA para 2017).

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º) – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial e a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores no PPA–Plano Plurianual para 2014 a 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 2528, de 21 de novembro de 2013, na LDO–Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 aprovada pela Lei Municipal nº 2728/2016, de 30 de junho de 2016 e na LOA–Lei Orçamentária Anual para 2017, aprovada pela Lei Municipal nº 2738/2016, de 03 de novembro de 2016, no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0600	Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana		
0604	Fundo Municipal da Infância e Adolescência		
0604.08.243.0022.6.044	Atendimento à Criança, ao Jovem e ao Adolescente–FMIA		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	938-RD	65.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	880-RD	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	938-RD	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros–PJ	938-RD	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	934-RD	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros–PJ	934-RD	13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	934-RD	30.000,00
TOTAL			180.000,00

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I – Anulação parcial e/ou total de dotação orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0600	Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana		
0604	Fundo Municipal da Infância e Adolescência		
0604.08.243.0022.6.039	Modernização do FMIA		
4.4.90.52 (119)	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00
0604.08.243.0022.6.044	Atendimento à Criança, ao Jovem e ao Adolescente		
3.1.90.11 (786)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	000	13.000,00
3.3.90.30 (772)	Material de Consumo	000	13.000,00
3.3.90.36 (775)	Outros Serviços de Terceiros–PF	000	13.000,00
3.3.90.39 (778)	Outros Serviços de Terceiros–PJ	000	15.000,00
0604.08.243.0022.6.047	Menor Aprendiz		
3.1.90.04 (778)	Contratação por Tempo Determinado	000	80.000,00
3.1.90.13 (779)	Obrigações Patronais	000	16.000,00
TOTAL			180.000,00

Art. 3º)–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de dezembro do ano de 2017.

Frank Ariel Schiavini–PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO–Contabilista – CRC 25.365

Cod255193

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017

DATA: 24/10/17 ABERTURA: 24/11/17 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, MEIO FIO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALÇADAS EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DA OBRA, TOTALIZANDO 34.160,41 M²; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS. Analisados todos os atos referentes à Concorrência Pública nº 04/2017, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	77.744.134/0001-41	3.071.208,59

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 3.071.208,59 (três milhões, setenta e um mil duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). Coronel Vívda, 08 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod255174

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2017

DATA: 06/11/17 ABERTURA: 08/12/17 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, COM FORNECIMENTO DE PEDRA E MÃO DE OBRA. Analisados todos os atos referentes à Concorrência Pública nº 05/2017, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

ITEM	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	LARIN RIBEIRO & CIA LTDA–ME	08.719.582/0001-72	345,00	103.500,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais). Coronel Vívda, 08 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod255177

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2017.

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MADALOZZO, PROCESSO Nº 08906.533000/1150-01 – RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 81001476 – MINISTÉRIO DA SAÚDE – BLOCO: INVESTIMENTO – AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 13 de dezembro de 2017 até às 08h00min do dia 27 de dezembro de 2017. Abertura das propostas após às 08h00min do dia 27 de dezembro de 2017. Início da disputa de preços às 09h30min do dia 27 de dezembro de 2017. VALOR MÁXIMO: R\$ 35.468,48. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coronelviva.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Prazo de entrega é de 10 (dez) dias da emissão da ordem de fornecimento. Informações: (46) 3232-8331. Coronel Vívda, 11 de dezembro de 2017. Ademir Antonio Aziliero–Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Cod255213



CONTRATO Nº 135/2017

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA E A EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, situado na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, Estado do Paraná-PR, CNPJ 76.995.455/0001-56, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Frank Ariel Schiavini, portador da cédula de identidade R.G. n.º 5.767.644-2, inscrito no CPF sob n.º 938.311.109-72 e a empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ 77.744.134/0001-41, localizada na Rua 13 de Maio, s/n - São Miguel, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por seu representante legal, Sr. Moisés de Gasperin, portador da cédula de identidade R.G. n.º 3.519.935-7, inscrito no CPF sob n.º 518.634.809-00, residente na Avenida XV de Novembro, 877 - Centro, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 24 de novembro de 2017, protocolo n.º , conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Trecho:

- Rua Leopoldo Schiavini (entre Rua Armindo Bernardo Pick e Rua Armindo José Gregolin)
- Rua Luiz Ruffato (entre Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)
- Rua dos Caminhões (entre Prolongamento da Rua Fioreto Marcolina e Rua Francisco Beltrão)
- Rua Duque de Caxias (entre Rua Hermes Alcides Lunardi até o final do Lote 19A da mesma Rua)
- Rua 15 de Novembro (entre Rua Henrique Zanella e Rua Zefferino Poletto)
- Rua Valdomiro Castro (entre Rua Jacó Fleck e Av. Generoso Marques)
- Rua Dona Rosa Stédile (entre Rua Santa Catarina e Rua Tupi)
- Rua das Azaleias (entre Rua Candido Inácio de Lima e Rua dos Canários)
- Rua Duque de Caxias (entre Rua Luiz Bassan Mezzomo e Rua Doutor Ubaldino do Amaral)
- Rua Antonio Inácio Rokemback (entre Rua Celeste Foppa e Rua Santa Catarina)
- Rua Waldemar Antonio Fischer (entre Rua Clevelândia e Rua Antonio Inácio Rokemback)
- Rua José Henrique de Freitas (entre Rua 15 de Novembro e Rua Luiz Costella)
- Rua Luiz Costella (entre Rua Ângelo Colpani e Rua José Henrique de Freitas)
- Rua Ângelo Colpani (entre Rua 15 de Novembro e Rua Clevelândia)



- Rua Fioravante Panato (entre Av. Generoso Marques e Rua Candido Inácio de Lima)
- Rua Giuseppe Guarnieri (entre Rua Antonio Schiavini e Rua Primo Zeni) , sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 04/2017, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ 3.071.208,59 (três milhões e setenta e um mil e duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas das seguintes fontes : R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) serão financiadas com recursos do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM, a serem creditados em conta específica indicada pelo Município e R\$ 71.208,59 (setenta e um mil e duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos) a título de contrapartida municipal, através das dotações orçamentárias Órgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 10097 Código Reduzido: 3306 e Órgão/Unidade: 08/01 Unidade: Departamento de Obras e Serviços Urbanos Funcional Programática: 08.001.26.451.0029.1.052 Elemento: 4.4.90.51.02.02 Fonte: 501 Código Reduzido: 951, respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R\$ 3.071.208,59 (três milhões e setenta e um mil e duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). Os recursos financeiros incluindo a contrapartida tramitarão pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 11º (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

- a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

- c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- g) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 660 (seiscentos e sessenta) dias, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
- b) manutenção e conservação da placa de obra até o recebimento definitivo da obra;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;

- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
- m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaio emitida pela CONTRATANTE.
- n) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula sétima; e
- o) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.
- p) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro





do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra.

g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

g.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

- g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (*Modelo n. ° 11*) em anexo;
- g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
- g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.
- h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaio – firmado pelo CONTRATANTE e pelo responsável da CONTRATADA –, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio.

Parágrafo Primeiro

O faturamento deverá ser efetuado em nome do MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ – CNPJ n. ° 76.995.455/0001-56

Parágrafo Segundo

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12 / I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.





Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto

Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro

Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Mari de Jesus Reis Lazzari, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.



Parágrafo Segundo

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Euclides Luiz Weiss, e ao fiscal substituto Sr. (a) Douglas Cristian Strapazzon, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

Parágrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

Parágrafo Quarto

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parágrafo Quinto

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Sétimo

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Oitavo

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Nono

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

Parágrafo Décimo

Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta.

Parágrafo Décimo Terceiro

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.



Parágrafo Décimo Quarto

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer (*em*) na obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira



qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto



Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS





O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.

Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens

financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
- c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
- d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:
 - e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
 - e.2) não mantiver sua proposta;
 - e.3) abandonar a execução do contrato;
 - e.4) incorrer em inexecução contratual.
- f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:
 - f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
 - f.2) apresentar documento falso;
 - f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
 - f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
 - f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
 - f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;
 - f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.

Parágrafo Primeiro



As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do valor da garantia contratual.

Parágrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejem a aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo





Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea "f" da Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa e prévia do PARANACIDADE.

Parágrafo único

Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Único

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor



histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Coronel Vivida, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Coronel Vivida, 11 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE
Frank Ariel Schiavini

CONTRATADA
Moisés de Gasperin

Assinatura do Responsável
CREA/CAU nº 18.913 D/PR

Testemunhas:


RG 3.934.748-0

RG



RECAPES EM CBUQ – PMF – TRATAMENTOS (TST

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Revestimento em CBUQ / PMF

- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – ensaio Marshall) – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos

Programa

SAM

Lote

Medição nº

SIT nº

Empresa Contratada

CNPJ

Nº Contrato Empreitada

Valor do Contrato

Valor Medido Acumulado

Percentual Executado

Serviços:

(%) executado

Terraplanagem:

Reforço do Subleito:

Regularização e compactação do subleito:

Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do contrato de empreitada, conforme normas técnicas vigentes, atestando que as espessuras médias das camadas estão de acordo com o projeto, bem como, atestando a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informação prestada.

Local

data.

Nome

Formação - CREA/CAU

Responsável pela Fiscalização da Obra



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera dispositivos da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Presidente, promulgo e seguintes Resoluções:

Art. 1º A Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º Havendo interesse público, o recinto de reuniões da Câmara, poderá ser utilizado para outras fins, observados os critérios e condições estabelecidos em resolução.” (NR)

“Art. 21 ” (NR)

§ 2º Na ausência de todos os membros da Mesa, conforme parágrafo anterior assumirá a Presidência o Vereador mais votado no último pleito eleitoral, até nova eleição, que se realizará dentro de 5 (cinco) dias.” (NR)

“Art. 22 ” (NR)

Parágrafo Único. No caso de vacância de todos os cargos da Mesa, assumirá a Presidência o Vereador mais votado no último pleito eleitoral, até nova eleição, que se realizará dentro de 5 (cinco) dias.” (NR)

“Art. 27 ” (NR)

§ 2º Se o candidato não obtiver maioria absoluta proceder-se-á, imediatamente, a nova eleição, para os cargos não preenchidos, considerando-se eleito o mais votado ou em permanência empate, o mais votado no último pleito eleitoral.” (NR)

“Art. 28. A eleição para a renovação da Mesa, por um ano seguinte, será realizada às 13h30min (treze horas e trinta minutos) do primeiro dia útil, após o término de cada sessão legislativa ordinária, independente de convocação, sendo a sessão realizada pela Mesa em exercício.” (NR)

“Art. 30 ” (NR)

IV – propor projetos de resolução que criem, transformem ou extingam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal, bem como, mediante projeto de lei, sejam as correspondentes remunerações fixadas;

VI – suprir resoluções concessivas de licença de afastamento de Prefeito ou Vereadores;

“Art. 31 ” (NR)

“dirigir, executar e disciplinar os trabalhos administrativos e legislativos, determinando as matérias que compoem o Ordem do Dia das Sessões;

“Art. 51 ” (NR)

II – prazo de 72 (setenta e duas) horas para que o presidente da comissão encaminhe ao relator a matéria submetida a seu exame, observando critérios de distribuição definidos em regulamento próprio;

IV – das reuniões de Comissões Permanentes serão lavradas atas pela assessoria parlamentar, as quais serão assinadas por todos os membros.” (NR)

“Art. 53 ” (NR)

§ 4º Durante o prazo em que a proposição esteja sob análise da comissão permanente, o vereador que dela não faça parte, poderá solicitar informações ou diligências ao relator a respeito da matéria, cabendo a este o deferimento ou não do pedido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.”

“Art. 58 ” (NR)

§ 1º Cada comissão emitirá o seu parecer sob o seu próprio fundamento, sendo verdade e simples adesão ao parecer de outra comissão, cabendo obrigatoriamente aos vereadores relações promotoras e defesas do seu posicionamento em plenário, quando da primeira discussão e votação da matéria, transferindo-se essa incumbência ao vereador indicado pela maioria dos membros da comissão no caso de parecer contrário às conclusões do relator.

“Art. 71. As comissões de representação têm por finalidade a representação da Câmara em atos externos de caráter cívico ou cultural, dentro ou fora do Município de Pato Branco.” (NR)

“Art. 72 ” (NR)

§ 4º A comissão representativa será presidida por vereador escolhido dentre os seus membros.” (NR)

“Art. 73 ” (NR)

§ 2º Sessões Ordinárias são as realizadas em datas e horários previstos neste Regimento Interno, independente de convocação, podendo ser realizadas em outro local, por motivo de força maior devidamente caracterizado, mediante deliberação do Plenário.

“Art. 74. Para assegurar a publicidade das Sessões da Câmara, a Ordem do Dia e a Ata dos trabalhos serão publicadas em meio eletrônico.”

“Art. 78. Com exceção das solenes, as sessões terão duração máxima de 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogadas por tempo a ser definido conforme deliberação plenária.”

“Art. 82. Precedendo a instalação da Legislatura, os diplomados irão se reunir em sessão preparatória, no dia previsto no § 6º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, sob a presidência do vereador mais votado no último pleito eleitoral, ou em havendo empate, o mais idoso, em local e horário previamente definido, a fim de utilizarem as providências a serem seguidas na sessão de instalação da Legislatura.”

“Art. 84 ” (NR)

§ 6º Na impossibilidade de gravação das sessões em mídias digitais por motivo de força maior, o Presidente suspenderá a sessão pelo prazo de até 60 (sessenta) minutos, e permanecendo a situação a sessão será transferida para o próximo dia útil.” (NR)

“Art. 74. Para assegurar a publicidade das Sessões da Câmara, a Ordem do Dia e a Ata dos trabalhos serão publicadas em meio eletrônico.”

“Art. 78. Com exceção das solenes, as sessões terão duração máxima de 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogadas por tempo a ser definido conforme deliberação plenária.”

“Art. 82. Precedendo a instalação da Legislatura, os diplomados irão se reunir em sessão preparatória, no dia previsto no § 6º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, sob a presidência do vereador mais votado no último pleito eleitoral, ou em havendo empate, o mais idoso, em local e horário previamente definido, a fim de utilizarem as providências a serem seguidas na sessão de instalação da Legislatura.”

“Art. 84 ” (NR)

§ 2º Sessões Ordinárias são as realizadas em datas e horários previstos neste Regimento Interno, independente de convocação, podendo ser realizadas em outro local, por motivo de força maior devidamente caracterizado, mediante deliberação do Plenário.

“Art. 74. Para assegurar a publicidade das Sessões da Câmara, a Ordem do Dia e a Ata dos trabalhos serão publicadas em meio eletrônico.”

“Art. 78. Com exceção das solenes, as sessões terão duração máxima de 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogadas por tempo a ser definido conforme deliberação plenária.”

“Art. 82. Precedendo a instalação da Legislatura, os diplomados irão se reunir em sessão preparatória, no dia previsto no § 6º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, sob a presidência do vereador mais votado no último pleito eleitoral, ou em havendo empate, o mais idoso, em local e horário previamente definido, a fim de utilizarem as providências a serem seguidas na sessão de instalação da Legislatura.”

“Art. 84 ” (NR)

§ 2º Sessões Ordinárias são as realizadas em datas e horários previstos neste Regimento Interno, independente de convocação, podendo ser realizadas em outro local, por motivo de força maior devidamente caracterizado, mediante deliberação do Plenário.

“Art. 74. Para assegurar a publicidade das Sessões da Câmara, a Ordem do Dia e a Ata dos trabalhos serão publicadas em meio eletrônico.”

“Art. 78. Com exceção das solenes, as sessões terão duração máxima de 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogadas por tempo a ser definido conforme deliberação plenária.”

“Art. 82. Precedendo a instalação da Legislatura, os diplomados irão se reunir em sessão preparatória, no dia previsto no § 6º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, sob a presidência do vereador mais votado no último pleito eleitoral, ou em havendo empate, o mais idoso, em local e horário previamente definido, a fim de utilizarem as providências a serem seguidas na sessão de instalação da Legislatura.”

“Art. 84 ” (NR)

§ 3º As matérias a que se refere o artigo 4º, do inciso III, deste artigo, que não sofrer impugnação e não for objeto de deliberação do Plenário, serão deferidas pelo Presidente, que as encaminhará a quem de direito.

“Art. 87. O grande expediente terá início após o término da ordem do dia e terá duração máxima de 1h30min (uma hora e trinta minutos).”

§ 1º Mediante inscrição efetuada por meio eletrônico, contendo o assunto específico a ser abordado, até às 11 (onze) horas do dia de realização da Sessão, poderão usar a palavra uma única vez, até dois vereadores, pelo prazo improrrogável de até 10 (dez) minutos, sendo permitidos apenas que serão breves.

“Art. 88. Findo o pequeno expediente passar-se-á imediatamente a ordem do dia.”

“Art. 94 ” (NR)

§ 2º As inscrições de oradores para a tribuna livre serão feitas na secretária da Câmara mediante preenchimento do cadastro, indicando o assunto a ser abordado, observando a ordem de inscrição e disponibilidade de data, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início das sessões ordinárias.

“Art. 102. A sessão de instalação da legislatura será realizada no dia previsto no § 6º do art. 26 da Lei Orgânica Municipal, em ato contínuo à sessão preparatória prevista no art. 82 deste Regimento, independentemente do número de vereadores presentes.” (NR)

“Art. 104. Cumpridas as formalidades previstas nos artigos 25 e 82 deste Regimento, em ato contínuo, o Presidente designará uma comissão composta por 3 (três) Vereadores, e qual conduzirá o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos até o plenário para as respectivas passas.”

“Art. 107 ” (NR)

II - o orador poderá falar da tribuna e, quando da bexada sentado;

“Art. 115 ” (NR)

§ 2º As questões de ordem claramente formuladas serão decididas pelo Presidente.

“Art. 124 ” (NR)

§ 2º Considera-se autor da proposição o signatário de mesma, cujo nome e assinatura deverá figurar com destaque.

“Art. 131. Ao encerrar-se a Legislatura, as proposições de autoria do chefe do Poder Executivo e de vereadores que não foram regimentalmente deliberadas, serão arquivadas.” (NR)

“Art. 132 ” (NR)

§ 5º Não é permitido mais de um substitutivo ao mesmo projeto.” (NR)

“Art. 133. As proposições de iniciativa de vereador antes de serem protocoladas junto à secretaria serão encaminhadas ao Departamento Legislativo para exame preliminar.”

“Art. 134 ” (NR)

§ 2º O Departamento Legislativo, se for o caso, sugerirá ao autor as modificações que entender necessárias ao projeto.

“Art. 138. As emendas deverão ser apresentadas à comissão durante o prazo que a mesa estiver analisando a matéria para exame de sua admissibilidade.”

§ 1º As emendas poderão ser apresentadas por vereador no primeiro turno de discussão e votação e, pela maioria dos vereadores no segundo turno de discussão e votação.

§ 2º No segundo turno de votação não caberá emenda à emenda aprovada em primeiro turno de discussão e votação.

§ 3º Sendo rejeitada a emenda, prevalecerá a redação do projeto original.

§ 4º Na redação final somente caberá emenda de conteúdo lingüístico e técnico.

§ 5º O Prefeito poderá apresentar modificações em projetos de sua autoria através de mensagem ativa.” (NR)

“Art. 144 ” (NR)

VI - destaque de matéria para votação, de que trata o § 4º do art. 159;

“Art. 145 ” (NR)

XIX - destaque de matéria para votação, de que trata o § 4º do art. 156.

“Art. 146 ” (NR)

“Art. 148 ” (NR)

Parágrafo Único. Os requerimentos a que se refere o “caput” deste artigo deverão ser protocolizados no Departamento Legislativo até às 11h30min (onze horas e trinta minutos) do dia de sessão ordinária, para dar seguimento a sua regimental tramitação.” (NR)

“Art. 150. Fica facultado ao homenageado o uso da Tribuna, para as suas considerações, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos.”

Parágrafo Único. O autor ou um dos signatários da proposição poderá usar da palavra pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos para suas considerações.” (NR)

“Art. 164. O voto de desempate do Presidente só é exercitável nas votações simbólicas.” (NR)

“Art. 169. Deliberadas as emendas o Presidente declarará aprovada a redação final do projeto.” (NR)

“Art. 179. Na discussão de primeiro turno, o autor da proposta de emenda à Lei Orgânica terá primazia no uso da palavra por 30 (trinta) minutos, prorrogável por mais até 15 (quinze) minutos.”

Parágrafo Único. Tratando-se de proposta de autoria do Prefeito, usará da palavra o Vereador a que se refere o § 2º do art. 14.” (NR)

“Art. 180. Recebida a proposta oramentária, dentro do prazo e forma legal, será feita a leitura em plenário e encaminhada ao departamento Contábil da Câmara para emissão de parecer prévio, e após remessa por meio eletrônico aos Vereadores e à Comissão de Oramento e Finanças.”

“Art. 182. As emendas regimentalmente deliberadas e aprovadas pelo Plenário serão encaminhadas juntamente com a proposta oramentária, para que o Executivo Municipal as incorpore ao texto.” (NR)

“Art. 200. O projeto de resolução para fixar os subsídios dos Vereadores, para vigência da legislatura subsequente, será apresentado pela Mesa até o final do primeiro período da Sessão Sessão Legislativa, nos termos do inciso XXVIII do art. 14 da Lei Orgânica Municipal.” (NR)

“Art. 216. No dia, horário e local estabelecidos, a Câmara se reunirá, com fim específico de voto o convocado.”

“Art. 218. Sempre que o Prefeito se recusar a prestar informações à Câmara, quando devidamente solicitado, o autor da proposição poderá apresentar denúncia, para fins de abertura de processo por infração penal administrativa.” (NR)

Art. 2º A Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014, passa a vigorar acrescida das seguintes artigos:

“Art. 87-A. O requerimento que solicite a constituição de Comissão Especial de Inquérito, deverá ser submetido à análise jurídica de admissibilidade, mediante verificação do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais pertinentes à espécie.” (NR)

“Art. 132-A. Os projetos deverão ser protocolizados no Secretariado até às 17h30min (sete horas e trinta minutos) do dia anterior à realização da Sessão Ordinária, para leitura em plenário.” (NR)

“Art. 133-A. A Secretaria encaminhará o projeto, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua leitura em plenário, ao Presidente do respectivo Conselho Permanente.”

§ 1º As Comissões Permanentes solicitarão a manifestação da Procuradoria Jurídica, conforme o caso, cujo parecer deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa fundamentada.

§ 2º O prazo para emissão de parecer, pelo relator, inicia-se a partir do efetivo recebimento da matéria, mediante assinatura do protocolo, interrompendo-se o prazo no caso de solicitação de parecer jurídico, pertinente à matéria objeto de análise.

§ 3º Tratando-se de matérias orçamentárias e financeiras haverá manifestação prévia do Departamento Contábil.” (NR)

“Art. 200-A. O projeto de lei para fixar o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais será de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pato Branco, observado o disposto no inciso VI do art. 14 da Lei Orgânica Municipal.” (NR)

“Art. 221-A. Atendendo o encerramento da Legislatura, os Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito, na forma da Lei, deverão apresentar a respectiva declaração de bens, na Secretaria da Câmara Municipal.”

Parágrafo Único. Caberá à Legislatura seguir a efetuar o comparativo das declarações de bens apresentadas no início e final da Legislatura anterior, adotando as medidas cabíveis, no caso de constatação de enriquecimento sem causa.” (NR)

Art. 3º A Subseção III, de Seção III, do Capítulo III, do Título III da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014, passa a designar-se “Comissão Representativa.” Prevista no § 4º do art. 24 da Lei Orgânica Municipal.”

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições nos artigos 4º, 28, parágrafo único do art. 41, inciso XI do art. 83, inciso IV do § 4º do art. 73, arts. 95, 96, 97, 100, § 6º do art. 133, inciso II do art. 143, inciso II do art. 149, parágrafo único do art. 147 e § 2º do art. 179.

Esta Resolução é de autoria dos vereadores Carlinho Antonio Polezzo – PROB, Fabrício Prata de Melo – PSD, Joacir Bernardi – SD, Rodrigo José Correia – PSC, Marco Antonio Augusto Pozza – PSD e Ronaldo Moacir Ditzelheim – PP.

Gabinete de Presidência da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017.

Carlinho Antonio Polezzo
Presidente

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
REPUBLICAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão, Edital nº 117/2017. Form: Presencial. Data de Licitação: 03 de janeiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS PARA SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E CONTÁBIL DO RPPSPREVCHOPIM. Valor Máximo da Licitação: R\$ 51.420,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procopio Kuehl, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzhinopar.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8600(S).

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão, Edital nº 133/2017. Form: Presencial. Data de Licitação: 03 de janeiro de 2018, às 15:00 (quinze) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. Valor máximo do Edital: R\$ 30.435,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procopio Kuehl, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, ou no Site www.chopinzhinopar.gov.br. Informações pelo fone: (46) 3242-8600(S).

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 376/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Prato & Prato Ltda – Epp. CNPJ: 23.153.983/0001-80. Objeto: Suprimento quantitativo e qualitativo do objeto do contrato, acrescido o valor do Contrato em R\$ 55.890,71 (cinquenta e cinco mil, oitocentas e noventa reais e sete centavos), e um centavo, para o valor total do Contrato para R\$ 514.362,58 (quinhentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato e área de pavimentação na Rua Rio de Janeiro em 1.500,00 m², totalizando a área pavimentada de 13.310,00 m², conforme Solicitação do Município de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Convocatória nº 22/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Jendri Rodrigues do Prado, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor total do Contrato para R\$ 303.218,93 (trezentos e trinta mil, duzentos reais e noventa e três centavos), em função de acréscimos de serviços não previstos no contrato, conforme Plano Diretor 28/2017 da Divisão de Planejamento e Projetos, Lei nº 8.866/93, artigo 85. Origem: Tomada de Preços nº 01/2017. Fundamento Legal: Lei 8.866/93. Data de assinatura: 05/12/2017. Assinam: Álvaro Dâniel Scatena, pelo Município e Diego Bandeira Bulgarelli, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - PR
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 173/2017. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me. CNPJ: 10.517.748/0001-10. Objeto: acrescer o valor do Contrato em R\$ 1.186,58 (um mil, cento

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2017-PMCV

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, com sede à Rua Praça Angelo Mezzomo, s/n–Centro, inscrito no CGC/MF nº 76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Frank Ariel Schiavini, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.767.644-2 e do CPF/MF nº 938.311.109-72, e

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41.

OBJETO: Execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações, técnicas e demais peças e documentos da Concorrência Pública nº 04/2017.

VALOR: R\$ 3.071.208,59 (três milhões e setenta e um mil e duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta Cód. Reduzido: 3306 e Cód. Reduzido: 951..

PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 (trezentos e trinta) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 660 (seiscentos e sessenta) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de dezembro de 2017.

FORO: Comarca de Coronel Vivida, Estado do Paraná.

Coronel Vivida, 11 de dezembro de 2017.

Cod255493

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MEC/FNDE	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	13.12.17	54.865,91
MS/FNS	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVISA (PARCELA)	13.12.17	228,28
MS/FNS	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	13.12.17	3.281,39
MS/FNS	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.12.17	40.800,00

Coronel Vivida, 13 de Dezembro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI-Prefeito Municipal

Cod255399

Solicitação de Garantia

Código da requisição: 1.283.816

Data: 12/12/2017

Horário: 08:34

Página: 1 / 1

Finalidade: Contrato

Coberturas:

Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

Sim

O contrato exige cobertura para cláusula trabalhista?

Sim

Destinada a Adiantamento de Recursos: N

Data prevista para assinatura do instrumento contratual objeto desta garantia: 12/12/2017

Data prevista para início dos serviços: 18/12/2017

Valor do contrato: R\$ 3.071.208,59

Valor do empenho disponibilizado para o ano: R\$ 3.071.208,59

Já se tem ordem de início de serviços autorizada?.....

☒

SIM

☐

NÃO

Há previsão deste instrumento contratual ser alterado?.....

☐

SIM

☒

NÃO

Há previsão de se alterar quantitativos?.....

☐

SIM

☒

NÃO

Há previsão de se alterar qualitativos?.....

☐

SIM

☒

NÃO

Há previsão de se alterar o valor do contrato?.....

☐

SIM

☒

NÃO

Há previsão de se alterar o prazo do contrato?.....

☐

SIM

☒

NÃO

O licenciamento ambiental foi concedido?.....

☐

SIM

☒

NÃO

Tomador: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Email para confirmação: hebersil@gmail.com

CPF / CNPJ do Beneficiário: 76995455000156

Beneficiário: CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL

Estado onde a licitação/contrato será realizada: PR

Foro: PR

Modalidade: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

Tipo: Contrato

Número do Documento: 135/2017

Garantia Destinada a Adiantamento de Recursos: Não

Obrigação a ser Garantida:

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações Execução de 34.160,41 m2 de recapeamento asfáltico em vias urbanas conforme descritos no objeto referente ao Contrato número 135/2017/Edital número 04/2017.

Nome do Solicitante: HEBER SILVESTRI

Telefone do Solicitante: (46) 3242-1002

Observações:

Finalidade:	Valor da Garantia:	Valor do Contrato:	Válida a Partir:	Prazo (dias):	Data de Vcto:
Contrato	R\$ 153.560,43	R\$ 3.071.208,59	12/12/2017	360,00	07/12/2018

Estaremos analisando sua solicitação na maior brevidade possível.



Controle Interno: 00A84A0F7F6D

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, devem ser verificados no endereço <https://empresas.banconeon.com.br>

Belo Horizonte, 13 de Dezembro de 2017

A
CORONEL VIVIDA PREFEITURA MUNICIPAL


Ref.: CARTA DE FIANÇA N.º: 1015661 - R\$153.560,43

Pela presente, o **BANCO NEON S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º: 00.253.448/0001-17 com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabaglia, 1143 - 17º. andar, por seus representantes legais, declara que, responsabiliza-se como **FIADOR** da empresa **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**, CNPJ n.º. 77.744.134/0001-41, com sede em CHOPINZINHO/PR, à RUA 13 DE MAIO, S/Nº, até o limite de **R\$153.560,43 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos)**, destinado à garantia do Contrato número 135/2017/Edital número 04/2017, para execução de 34.160,41 m2 de recapeamento asfáltico em vias urbanas, não abrangendo multas, questões trabalhistas e previdenciárias.


A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e válida por **360 (trezentos e sessenta) dias** contados a partir de 12/12/2017, vencendo-se no dia **07/12/2018**, ficando certo que V.sas. deverão no prazo de 03 (três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do **BANCO NEON S.A.**, por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente **FIANÇA**, de modo que, se assim não ocorrer, ficará o **FIADOR** desonerado da obrigação assumida por força deste documento.

O **FIADOR**, recebendo a comunicação para honrar a fiança, com a documentação comprobatória da inadimplência do afiançado, efetuará o pagamento do valor devido dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens do afiançado.

BANCO NEON S.A.



Douglas Martins Godinho
Diretor



Marcus Vinicius Coelho de Carvalho
Diretor



Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art. 2º.

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
 Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20175491900
 Obra ou Serviço Técnico
 ART Principal



O valor de R\$ 214,82 referente a esta ART foi pago em 12/12/2017 com a guia nº 100020175491900

Profissional Contratado: MARCELO SILVESTRI (CPF:025.056.959-03)

Nº Carteira: PR-68498/D - Nº Visto Crea:

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

Nº Registro: 38533

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CPF/CNPJ: 76.995.455/0001-56

Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO S/N CENTRO

CEP: 85550000 CORONEL VIVIDA PR Fone:

Contrato: 135/2017

Local da Obra/Serviço: DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS S/N

Quadra: N/A

Lote: N/A

CENTRO - CORONEL VIVIDA PR

CEP: 85550000

Tipo de Contrato	2	EMPREITADA
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.	1102	OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS
Tipo Obra/Serv	045	ARRUAMENTO
Serviços	050	EXECUÇÃO
contratados	083	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
	130	OUTROS

Dimensão 34160,41 M2

Dados Compl. 0

Data Início 11/12/2017

Data Conclusão 16/11/2018

Vlr Taxa R\$ 214,82


Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPE EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES) EM
 DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 135/2017;

OS PRINCIPAIS SERVIÇOS SÃO:

- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA;
- PINTURA DE LIGAÇÃO;
- REPERFILAGEM E CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ;
- REALINHAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS EM CONCRETO;
- EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER;
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL E HORIZONTAL.

Insp.: 4610
 13/12/2017
 CreaWeb 1.08


 Assinatura do Contratante


 Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 23 de setembro de 1996 e 13.129 de 26 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos."

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 135/2017** decorrente da Concorrência Pública nº 04/2017, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 13 de Maio, s/n – São Miguel, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41, representada neste ato pelo Sr. **Moisés de Gasperin**, portador do CPF nº 518.634.809-00 e RG nº 3.519.935-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA do Contrato nº 135/2017 que tem como objeto a execução de 34.160,41 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: destocamento de árvores, limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, meio fio, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra, nos termos da sua Cláusula Vigésima Quarta, Parágrafo Único.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:

Prorroga-se a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, **de 02 de outubro de 2019 a 01 de outubro de 2020**, com fundamento no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 135/2017 de 11 de dezembro de 2017.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 01 de outubro de 2019.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Moisés de Gasperin
Pedreira Santiago Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

MUNICÍPIO DE MARIPÓLIS
ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 16/2019.
PROCESSO Nº 577/2019. Em conformidade ao resultado de classificação, apresentado pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria Nº 90/2019 de 04 de Abril de 2019, estando o procedimento licitatório de acordo com a Lei nº 8.666/93, especialmente em seu artigo 43, e com fôro no Decreto Municipal Nº 43, de 28 de agosto de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, ADJUDICO e HOMOLOGO o Edital e/ou edital, que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para eventual aquisição de peças para linha mecânica pesada, que serão utilizadas nos diversos veículos da frota municipal, as empresas: LUBRIFICANTES Comércio de Lubrificantes e peças Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado. CNPJ/ME Nº 20.777.739/0001-23, inscrição estadual nº 50971136-21, com o valor total de R\$ 1.159.530,20 (um milhão cento e cinquenta e nove mil quinhentos e noventa reais e doze centavos). Vile Carlos Teixeira Machado e ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME nº 14.830.001-01, inscrição estadual nº 9042384-37, com o valor total de R\$ 721.618,68 (setenta mil duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos), Rodrício Ferreira de Maripolis Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/ME nº 04.325.195/0001-09, inscrição estadual nº 90420737-30, com o valor total de R\$ 480.293,45 (quarenta e oito mil e duzentos e noventa e três reais e quatrocentos e cinquenta centavos). E determino que sejam elaboradas as documentações necessárias de acordo com os termos legais. Maripolis, 16 de novembro de 2019. Neir Rorou Rossetti Ghisleni - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE ITAPERAJÁ DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 170/2019
DATA: 19.11.2019
SÚMULA: Altera Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. A Inteira deste Decreto se encontra no Site: www.djca.com.br
DECRETO Nº 164/2019
DATA: 19.11.2019
SÚMULA: Altera Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. A Inteira deste Decreto se encontra no Site: www.djca.com.br
DECRETO Nº 161/2019
DATA: 19.11.2019
SÚMULA: Altera Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. A Inteira deste Decreto se encontra no Site: www.djca.com.br
DECRETO Nº 162/2019
DATA: 19.11.2019
SÚMULA: Altera Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. A Inteira deste Decreto se encontra no Site: www.djca.com.br
DECRETO Nº 163/2019
DATA: 19.11.2019
SÚMULA: Altera Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. A Inteira deste Decreto se encontra no Site: www.djca.com.br
LEI Nº 1684/2019
DATA: 19.11.2019
SÚMULA: Altera o Art. 1º da Lei 1579/2019, que estabelece o valor mínimo para ajustamento de Emissão Fiscal observando a cobertura de Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal. A Inteira desta lei se encontra no Site: www.djca.com.br
LEI Nº 1687/2019
DATA: 19.11.2019
SÚMULA: Altera a redação do Art. 2º da Lei Municipal nº 1790/2011, de 04 de abril de 2011, que dispõe sobre a distribuição sobre despesa e dá outras providências. A Inteira desta lei se encontra no Site: www.djca.com.br

MA
S
Itapejara D'Oeste

Conselho Municipal de Assistência Social
Lei Municipal nº 539/95 e Lei Municipal nº 1.204/2011
Avenida Manoel Mello, nº 343 - CEP 96.500-000
Fone (41) 3630-1659 - Itapejara D'Oeste - Pr.

RESOLUÇÃO Nº 011/2019
Data: 19.11.2019

Súmula: Dispõe sobre a Prestação de Contas dos Recursos Federais do ano de 2018 e Da Aprovação do Preenchimento do Censo Suas 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMA5 do Município de Rapaçara D'Oeste – PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 539/95 e a Lei Municipal nº 1.204/2010, de 17 de novembro de 2010,

- Considerando a deliberação da Plenária realizada em 19.11.2019, Ata nº 010/2019,

RESOLUÇÃO

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas dos Recursos Federais no ano de 2018 da Média Complexidade, PAIF, SCFV, BPC na Escola e IOD SUs.

Art.2º - Aprovar o Censo Suss 2019 do Centro de Convivência, Centro Dia e Similares, CMAS, CRAS, Fundo Municipal, Família Acolhedora e Gestão Municipal.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itapejara D'Oeste, 19 de Novembro de 2019.

Solange de Souza Azeredo
Presidente do CMAS

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PR
 CONTRATO nº 141/2019 – Pregão Presencial nº 98/2019 – Contratante: Município de Coronel Vídua, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: BUCCOFALIA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 28.220.478/0001-10. Objeto: contratação de empresa para atendimentos odontológicos para a função de cirurgião dentista especialista em endodontia para atender o CED I - Centro de Especialidades Odontológicas. Valor total R\$ 55.200,00. Prazo de prestação de serviços: 12 meses, de 16.11.2019 a 17.11.2020. Coronel Vídua, 12 de novembro de 2019. Frank Arlei Schiavini, Prefeito.

CORRIGIDA: FLESC SUPREMENTOS LTDA - ME, CNPJ Nº 22.973.018-00/01-76, contratante e construtora de empresas para locação de impressoras multifuncionais, para atendimento de todos os usuários do município, administrativas, além de escolas, creches, unidades de saúde e outros setores da administração pública municipal. Valor total estimado R\$ 170.640,00. Prazos de locação 12 meses, de 19.11.2019 à 18.11.2020.

CONTRATO N° 015 de novembro de 2019. Frank Altel Schavio, Prefeito.

ADITIVO nº 01 ao Contrato n° 1155/2017 – Concorrência Pública nº 04/2017 – Contratante: Município de Corral Verde; Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 17.744.134/0001-41. Este Termo Aditivo tem por objeto a PRorrogação do prazo de vigência, nos termos das leis Cakutá Vila Velha, Lei Municipal nº 2.019/2016, Proposta-a-vigência por mais 12 meses, de 30.10.2019 a 31.10.2020, com fundamento no art. 1º, inciso I, Lei Federal nº 8.666/1993 em sua redação atualizada às demais cláusulas. Contrato Vigente até outubro de 2019. Frank Avelino dos Santos, Presidente;

ADITIVO Nº 03 ao Contrato nº 120/2017 – Tomada de Preços nº 14/2017 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA - ME. CNPJ nº: 23.148.943/0001-22. Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA, nos termos da sua Cláusula Quinta. Prorroga-se a execução por mais 90 dias, de 12.11.2018 a 09.02.2020. Prorroga-se o prazo de vigência, por mais 90 dias, de 16.11.2019 a 13.02.2020, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação da equipe técnica municipal do processo de revisão do plano diretor. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 05 de novembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
PARCELO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019
DATA: 26/10/2019 **ABERTURA: 09:11H** **HORÁRIO: 09:00H**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SEDE DO SABOR E ALMOÇO PARA AS FAMÍLIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSAS FAMÍLIAS, conforme discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 02/11/2019 **ABERTURA: 09:11H** **HORÁRIO: 09:00H**
DATA: 26/10/2019 **ABERTURA: 09:11H** **HORÁRIO: 09:00H**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SEDE DO SABOR E ALMOÇO PARA AS FAMÍLIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSAS FAMÍLIAS, conforme discriminado no objeto do presente edital.
A publicação na íntegra dos atos acima está disponível no seguinte endereço eletrônico:
<http://www.diariooficial.munic.gov.br/portal/verbo.asp?verbo=1> na edição de 26 de novembro de 2019 - conforme

Extrato das Atas de Reunião de Prêços do Pregão Presencial nº 108/2010. OBJETO: Registro de Preços para Contratação Fatura de Serviços Especializados em Presença de Comissão Permanente para Avaliação dos Desempenhos dos Serviços Especializados em Presença de Comissão Permanente para Avaliação dos Desempenhos Administrativos Quantitativos das Secretarias e Divisões e Locais de Execução dos Serviços. Chópinhos: VIGÊNCIA: 12 meses. DOS PRAZOS, LOTES E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: Conforme Tabela Cálculo de taxa. ALI. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da execução dos serviços, desde que os mesmos estejam em acordo com o solicitado pela Administração. Dotações Orçamentárias, Elementos de despesas (007/504), por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no dia 04/05/2014, mediante a abertura de Secretaria de Planejamento - GESTOR, Francisco de Assis, Rua: APR nº 412/2019, Faltas: Partições de Chópinhos de 2013, 2014, 2015 e 2016. Valor Total Estimado R\$ 17.100,00. Chópinhos/RP, 08 de novembro de 2013. Alvaro Pádua Costa - Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO
REF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREÇO Nº 108/2019

Tendo em vista o Parecer do Conselho de Administração, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Preço, por Item, a Preça Item n.º - Serviço nº 1082019-1, para Realização de Preça e após apuração o preço regular, eu, Alvaro Dênis Cerni Scalora, Prefeito, tomo público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de HOMOLOGAÇÃO no objeto das atas ementas:

Empresa(s)	Valor Total Estimado de Contratação – R\$
RAZAR INTELIGÊNCIA EIRELI - EPP	17.190,00
TOTAL HOMOLOGADO	17.190,00

Que apremendo o Menor Preço, por Item para Registro;

Após apresentação a regularidade dos atos processuais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preço.

E A DECISÃO

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINÓPOLIS, RP, 08/11/19.

Alvaro Dênis Cerni Scalora
Prefeito

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 06/2019

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR, torna pública que realizará, às 09h01min, do dia **06/12/2019**, na sede da Pref. Municipal, licitação na modalidade de **Tomada de Preços 06/2019**, do tipo Menor Preço, visando à Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à ampliação de barracão pré-moldado com área total de 221,00 m² a serem edificados junto ao pólo de máquinas do município de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao Edital, do Município de Bom Sucesso do Sul, de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo. Edital disponível no site www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo ainda ser solicitado pelos e-mails: projeitos_bss@hotmail.com ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Informações pelo fone (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 19 de novembro de 2019.

Josiane Felle
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A EQUIPE que trabalha em ação comunitária com o projeto “**INSTITUTO EM BUSCA DO SER**”, pelo presente edital vem convocar todos as pessoas interessadas no projeto para um encontro, Assamblea Geral, no dia 05 de dezembro de 2019, com convocação para as 19h00min, com qualquer número de participantes. No seguinte endereço: Rua Tocantins, nº 2352, Edifício Itália- 1ª andar, sala 13 e 14, Bairro Centro, CEP: 85501-010.

Para tratar dos seguintes assuntos:

PAUTA DO DIA:

1. CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – ONG
2. APROVAÇÃO DO ESTATUTO
3. ELEIÇÃO DE DIRETORIA

PATO BRANCO, PR, 18 de Novembro de 2019.

CLAITON KARAM FRANCA
CPF: 017.201.399-20

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 396, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação deu-se da seguinte forma:

➤ Em razão de ausência de proposta foi atestada a vital e prefeita de acordo com a PRECATORIA a presente licitação.

Bomazinho, 16 de novembro de 2019

LESSIR CANAN BORTOLU
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015 - PME
ATA DE HOMOLOGAÇÃO

Termo público de homologação do Pregão ELETRÔNICO Nº 007/2015 - PME, objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de antena de câmeras de segurança, em favor das seguintes empresas:

1	Telê Dts Engenharia e Telecomunicações Ltda., no valor total de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais);
2	M. F. de Aguiar Seguranças Eletrônicas, no valor total de R\$ 832,75 (oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos);
3	Virtual Fios Telecomunicações e Consultoria, no valor total de R\$ 14.357,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 162/2019
(Anulação por Erro de 12/2019)

CONTRATANTE: Município de Rumenos
CONTRATADA: Rumen Invest & Cia Ltda
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOMENTO DE KITS FOTOFOTOPÉDICO DO ESTÍMULO À PRECOCE LOCOMOÇÃO POR TUBAGEM Nº 1.520/2017 DO MONITÓRIO DA SAÚDE (ETI NIAF)
VALOR TOTAL: R\$ 10.000 (dez mil reais)
PRazo de VIGÊNCIA: 1 (um) ano
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de novembro de 2019
FÓRUM: Câmara de Municipais, Estado de Pernambuco

Rumenos, 19 de novembro de 2019
LEONAR CANAS BORTOLINI
Prelito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 189/2019
(Prestação de Serviços por Licitação)



CONTRATANTE: Município de Remanso
CONTRATADA: Papeteria Icarê Bortolotto Ltda
OBJETO: CONTRATO DE EMPREITA PARA FORNECIMENTO DE KITS FOTOGRÁFICOS DE IDENTIFICAÇÃO PRECISO
(CONFORME PORTARIA Nº 2.342/2017 DA DIRETORIA DA SAÚDE DO NASP)
VALOR TOTAL: R\$ 1.106.200,00 (um milhão e oitocentos e seis mil e duzentos reais)
PRazo DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VISTA DE ANUENCIAMENTO DO CONTRATO: 10 de novembro de 2019.
FUND: Conselho de Administração, Estado do Paraná.

Remanso, 15 de setembro de 2019.
FELIPE CANO BORTOLLO
Prestador Municipal

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS

PORTARIA Nº 189/2019 - Data: 19/11/2019 Súmula: "Designa Lelloiro para bens Móveis Inservíveis ao Município." A petição na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: anppd.cicm.com.br, edição do dia 29/11/2019, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 06/2012 de 28.01.2013.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEL SOUZA MACHADO
 LTDA torna público que irá requerer do IAP, renovação de licença de operação para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, a ser implantada na Rua Souza Neves, nº125, no município de Mangueirinha - PR.

			DIÁRIO DO SUDOESTE 20 de novembro de 2019	
 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO Secretaria de Administração e Finanças Divisão de Fiscalização e Tributação				
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NOTIFICAMOS os contribuintes abaixo relacionados, de lançamento da multa prevista no artigo 6º, § 1º das Ordens Intituições da Lei Complementar nº 001/08 - Código Tributário Municipal (CTM) por atraso de pagamento no prazo fixado por este Edital, devida de principal, de multa e de juros conforme:				
Nome / Razão Social		CADASTRO MUNICIPAL	CNPJ do Contribuinte	
ARQUIVO VIEIRA RAMAIA		2182390	000.411.239-24	
ARQUIVO RIGELLO		2681668	11.884.560.000-04	
ARROZARIA PR. COOPERADO DE PRODUTOS LTDA ME		8002118	20.773.0789001-28	
ALEXANDRE MENEZES GUZMÁN R72		2662520	20.198.8870000-79	
ALEXANDRE NUNES DOBRZYNSKI		2552773	078.321.649-24	
ALL KETI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2514243	08.088.2170001-77	
ANIL CARILA DOMES CABECO		1189875	841.351.200-80	
ANNELORE COSTA BOCHNET PEREIRAS00078		2667670	18.269.7790001-18	
ANIELMA MARIA PORTILLA		2604522	097.817.240-20	
ANTONIO FELIPE A DA LTA ME		2126244	04.784.3760001-41	
A.P. VESTIMENTAS E PIZZARIA LTDA ME		0504945	24.883.2630001-71	
A.R. ACCIO A DA LTA ME		0462964	24.864.4950001-18	
ASSOCIACAO MEDICA DO PAVAO REGIONAL DE PATO BRANCO		2153940	78.243.7750001-00	
AUTO ELÉTRICA DA LATA VEICULA LTDA		1898900	77.488.8990001-84	
B. L. MARTINELLI MATHIAS DE CONSTRUTORA LTDA ME		3115000	13.857.4990001-28	
BENEFICIA A INTELIGENTIA LTDA ME		3131100	27.830.0110001-29	
BENEFICIA REGINA CARVALHO BANDEIRA007		3776770	048.424.104-84	
BIRÃO TROMBETA		2609075	547.481.726-28	
SUA DECORADORA LTDA		1600000	77.736.1790001-49	
SUA NOVA PIZZARIA LTDA		7841451	10.740.6140001-02	
SUAZEMARIA CANTARELLA DA LTA ME		2780730	10.368.5500001-05	
CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA SUZETTE DO PAMPA LTDA		2788800	06.217.4190001-41	
SLAIR ANTONIO DOS SANTOS ME		3874760	29.208.8790001-24	
SOLUDES LUCAS RODRIGUES EIRELLA00191		3874760	29.208.8790001-24	
SUELI MARGARITE DUAL		3131400	033.355.060-41	
CINEMA PEQUENO ANJO SOCIEDADE SIMPLES - EPP		2146512	18.041.6500001-30	
COMERCIAL PARANAGUENSE DE ELETRICIDADE LTDA		8900078	79.888.1390001-79	
DARIO AGUIAR A DA LTA ME		3137500	054.269.370-19	
DOBRZYNSKI FERNANDA		2158800	04.016.8410001-34	
DOUGLAS E RAFAELIA LTDA		2221050	18.185.1640001-06	
EDSON ZONCALVES DA RUCHA - EPP		3807840	21.714.6720001-46	
ENANILDA DE OLIVEIRA DE LTA ME		7711710	043.229.586-84	
ENANILDA APARECIDA DOS SANTOS ORDO		2000420	73.670.0500001-23	
FERNANDES PAULINETE LTDA		2000420	73.670.0500001-23	
FERNANDO ANTONIO DE MATTO 077898900		1783000	78.874.1640001-27	
FERREZ COOPERATIVA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE BELLEGA LTDA ME		2000420	08.813.0660001-24	
FIALTO COMERCIO DE MOTOCICLETA		4001280	08.814.0600001-41	
FISIO - DR. HOMER GONÇALVES DE INFORMATICA LTDA ME		4001280	08.814.0600001-41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACARETUBA, ESTADO DO PARANÁ					
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1402/19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº GA-02/19 – PROCESSO Nº 003/2019 REPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS A SERVIDORES PÚBLICOS – PRODUTOS HOSPITALARES LÍQUIDS – EPP; OBJETO: Registro de preços para eventos e futuros fornecimento dos materiais e equipamentos hospitalares necessários, visando o atendimento das Unidades Básicas de Saúde e Posto Atendimento Municipal.					
Lote/Item	Cant.	Unid.	Descrição	Marcas	Valor Unit./Valor Total
01	10	10.000 Rota	Axônia de capron, 100% algodão, 18 cm de largura, 180 cm de comprimento em rolo, quantidade fixa de 13 unidades, embalagem individual contendo dados de identificação, fabricação, lote e prazo de validade. Regras na Arcia.	Ermac	0,48 / 4.800,30
01	40	1.000 Unidade	Espalco polietileno, vaginal, pernas com articulação elástica, tamanho médio, embalagem individual lacrada, trazendo esmaramento as datas de identificação, fabricação nº do lote e prazo de validade. Regras na Arcia.	Cristalpl	1,05 / 4.200,30
01	500	1.000 Unidade	Espalco polietileno, vaginal, médio, com articulação elástica, tamanho médio, embalagem individual lacrada, trazendo esmaramento as datas de identificação, fabricação nº do lote e prazo de validade. Regras na Arcia.	Cristalpl	0,92 / 5.200,30
02	200	1.000 Unidade	Espalco polietileno, vaginal, pequena, com articulação elástica, tamanho pequeno, embalagem individual lacrada, trazendo esmaramento as datas de identificação, fabricação nº do lote e prazo de validade. Regras na Arcia.	Cristalpl	0,87 / 1.740,30
110	51	Roto	Fável grise úngrega para esterização em autoclave, com 100% algodão, 18 cm de largura, 180 cm de comprimento, 10 unidades, íntima de saletagem e indicador de processo, largura 30 cm e 300 mm, comprimento 150, material em póster com fitra de polipropileno, 100% (peso), 90g/m² (limpe) 3mm, Embaixo individualmente contendo dados de identificação, nº de lote e prazo de validade. Regras na Arcia.	Duoelap	99,50 / 5.000,30

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 29.280,00 até o mês mil, dezesseis e sessante reais;

PRazo DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 20/11/2019 e término no dia 19/12/2020. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do contrato.

PRZ. Civilizada, 18 de novembro de 2019 ADENIR JOSE GHELLER Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01/2016
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2016
CONTRATADA: ENELLE SOUZA PEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - ME
CNPJ: 34.541.878/0001-00
Cidade/Prática - Vigência
 Tendo em vista a necessidade de serviços a serem prestados de forma contínua, após constituição propiciará condições de prestação variadas ao município, fica prorrogado o prazo de vigência contratual de 12 de novembro de 2015 até 31 de dezembro de 2017.

Cidade/Prática - Disponíveis Gêneros
 Disponibilizar em plena capacidade de atendimento os demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul, 11 de novembro de 2015
Nelson Antonio Feresman - Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quarta-Feira, 20 de Novembro de 2019

Ano II – Edição Nº 0338

Página 2 / 025

CONTRATOS

CONTRATO nº 141/2019 – Pregão Presencial nº 98/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: BUCOFACIAL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 26.220.478/0001-10. Objeto: contratação de empresa para atendimentos odontológicos para a função de cirurgião dentista especialista em endodontia para atender o CEO I – Centro de Especialidades Odontológicas. Valor total R\$ 55.200,00. Prazo de prestação de serviços: 12 meses, de 18.11.2019 a 17.11.2020. Coronel Vivida, 12 de novembro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod316651

CONTRATO nº 142/2019 – Pregão Presencial nº 104/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 22.371.010/0001-76. Objeto: contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais, para atendimento de todas as unidades administrativas, além de escolas, creches, unidades de saúde e outros setores da administração pública municipal. Valor total estimado R\$ 170.640,00. Prazo de locação: 12 meses, de 19.11.2019 a 18.11.2020. Coronel Vivida, 18 de novembro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod316652

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 120/2017 – Tomada de Preços nº 14/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA-ME, CNPJ nº 23.146.943/0001-22. Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA, nos termos da sua cláusula Quinta. Prorroga-se a execução por mais 90 dias, de 12.11.2019 a 09.02.2020. Prorroga-se o prazo de vigência, por mais 90 dias, de 16.11.2019 a 13.02.2020, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação da equipe técnica municipal do processo de revisão do plano diretor. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 08 de novembro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod316656

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 135/2017 – Concorrência Pública nº 04/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA, nos termos da sua cláusula Vigésima Quarta, Parágrafo Único. Prorroga-se a vigência por mais 12 meses, de 02.10.2019 a 01.10.2020, com fundamento no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 01 de outubro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod316658

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 31/2019 – Tomada de Preços nº 04/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 18.260.537/0001-56. Este Termo Aditivo tem por objeto a SUPRESSÃO do Contrato, nos termos da sua cláusula Sétima, no Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação da Divisão de Estudos e Projetos. Considerando o pedido e planilha reprogramada, fica suprimido o item nº 4 da planilha orçamentária, reduzindo assim, a meta física financeira em R\$ 11.332,93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 21 de outubro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod316736

CONCURSOS

EDITAL Nº 050/2019 de 19/11/2019-CONCURSO PÚBLICO-Convocação

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) especialmente em seus arts. 13 a 16; na Lei nº. 1847 de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais); no Edital de Concurso Público aberto sob N.º 118/2016 Publicação nº 001/2016 de 09/06/2016 c/c Publicação 002/2016 de 13/06/2016 (abertura do certame) combinado com os Editais nº. 118/2016 Publicação nº. 014/2016 de 22/09/2016 e Publicação nº. 015/2016 de 07/10/2016 (aprovados/homologação) e, Considerando a necessidade constante no ofício nº. 760/2019 da Coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas e, TORNAR PÚBLICO

I. A convocação de candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público aberto através do Edital nº. 118 Publicação nº 001 de 09/06/2016, para o provimento de vaga no cargo de Técnico de Enfermagem, conforme Anexo I, parte integrante do presente Edital.

II. Que o(a) Candidato(a) convocado(a) tem prazo de 24h00min(vinte e quatro horas), a contar de 20 (vinte) de Novembro de 2019, para comparecer na Unidade de Recursos Humanos, sita a Praça Ângelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida-PR, para declarar se aceita ou não o cargo público que se habilitou em concurso.

2.1. Que o Candidato não comparecendo ou não se pronunciando no prazo estabelecido neste item será automaticamente eliminado do Concurso Público, aberto através do Edital nº. 118 Publicação nº. 001 de 09/06/2016.

III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 30(trinta) dias contados da publicação do ato de nomeação e dependerá do resultado da inspeção médica (art.14 Estatuto) e no atendimento aos requisitos estabelecidos no item 11 do Edital de Abertura do Concurso Público sob nº. 118 Publicação nº. 001, Anexo II deste.

3.1. Será considerado apto se não apresentar restrições médicas que o contraindique ao exercício do cargo descrito no Manual do Cargo Público, parte integrante do Decreto nº. 3209 de 07/08/2006.

3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura estabelecida no Edital de Concurso Público nº. 118/2016 eliminará o candidato do concurso.

3.3. É de quinze dias o prazo para o candidato empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), na Lei nº. 1847 de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais) e no Edital de Concurso Público N.º 118 Publicação nº. 001 de 09/06/2016 e demais disposições legais vigentes.

V. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR, do endereço eletrônico: <http://www.diariooficialmunicipiocoronelvivida.pr.gov.br> - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº 2.852/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2019, 13º da República e 64º do Município.

FRANK SCHIAVINI-Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

ANEXO I

EDITAL Nº 050/2019 de 19/11/2019

CONCURSO PÚBLICO – Convocação

Candidatos CONVOCADOS para assumir Cargo de Provimento Efetivo decorrente de habilitação no Concurso Público, aberto através do

Edital N.º 118, Publicação nº. 001, de 09/06/2016:

Cargo Público: Técnico de Enfermagem

Ordem Nº.	Classificação	Nome do Candidato	N. Inscrição	Lotação Funcional
1	14º	JULIANA LOPES DE QUADROS RIBEIRO	45800466	Secretaria Municipal de Saúde-Departamento de Saúde-SEMS

Coronel Vivida, Estado do Paraná.

ANEXO II

EDITAL Nº 050/2019 de 19/11/2019-CONCURSO PÚBLICO – Convocação

Requisitos para Nomeação

Documentos Iniciais

a) ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988;

b) estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentando Título de Eleitor e Comprovante de ter votado na última eleição;;

c) estar em dia com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino, apresentando o Certificado de Reservista;

d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da nomeação;

e) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade de demissão;

f) não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.

g) Submeter-se a exame de aptidão física e mental compatíveis às suas funções, por meio de verificação pelo serviço médico do Município;

h) Não haver contra si condenação criminal transitada em julgado, apresentado folha de antecedentes criminais do Cartório Criminal do lugar onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis meses;

i) Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge;

j) Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e de compatibilidade de horário para o exercício de mais um cargo quando acumulável;

k) Apresentar declaração sobre percepção ou não de proventos de aposentadoria, por conta do regime geral de previdência ou de qualquer outro regime próprio de previdência em âmbito federal, estadual ou municipal, decorrentes de cargos, emprego ou função pública, conforme artigo 40 da Constituição Federal e de serviço militar, conforme artigos 42 e 142 da Constituição Federal;

l) Comprovar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo público, mediante apresentação, no caso de nível fundamental ou médio (antigo 2º grau) de certificado de conclusão; no caso do nível superior, por meio de diploma acompanhado do histórico escolar.

m) Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação MEC.

n) Os diplomas e certificados obtidos em instituições estrangeiras deverão estar devidamente convalidados.

o) Comprovar inscrição/registro nos respectivos conselhos de fiscalização do exercício profissional em atendimento ao disposto nas exigências solicitadas no subitem 3.1 deste;

p) Apresentar cédula de identidade (RG), de cadastro de pessoa física (CPF), carteira de motorista nos casos indicados no edital de concurso, Cartão do PIS/PASEP e outros documentos que se fizerem necessários à época da posse.

q) 01(uma) foto 3x4;

r) Certidão de Casamento ou de Nascimento

s) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;

t) Comprovante de Residência;

u) Nº inscrição PIS/PASEP/ Cartão do PIS/PASEP;

v) Outros documentos poderão ser solicitados na ocasião do aceite da vaga.
